



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa
PROCOLO GERAL
CNPJ: 12.207.551/0001-00



PROCOLO

Protocolo: 04150008 Ano: 2020 Emissão: 15/04/2020 Hora: 13:39:27

REQUERENTE / PROCURADOR:

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO

TITULAR / ORGÃO:

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO

TIPO PROCESSO:

ADMINISTRATIVO

ASSUNTO:

PEDIDO DE PAGAMENTO DE MEDIÇÃO

Outras Informações:

medição de nº 04 da recuperação do ginásio do Dida - TP 013/2019

MOVIMENTAÇÃO

Data	Orgão Destino	Dt. Recebimento	Assinatura



Arapiraca, 15 de abril de 2020.

À
Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa


Assunto: **Solicitação de Medição e Pagamento**

Construtora Escada LTDA-EPP, inscrita no C.N.P.J. Nº 10.531.423/0001-91, situada na Rua Possidônio Nunes, 703, Capiatã Arapiraca –AL, CEP: 57.310-100, vem com o presente solicitar de V.S.^a a **4ª MEDIÇÃO E PAGAMENTO RECUPERAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO NELSON DE JESUS DA SILVA “DIDA” LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA - AL** – conforme Licitação Modalidade TP Nº 013/2019, Contrato Nº 001.

Sem mais para o momento, aguardamos deferimento.

Atenciosamente,

Lutz André Portela da S. Filho
Engenheiro Civil
CREA AL/02118578-40



THIAGO LEITE DA SILVA
CPF: 078.253.754-59
Sócio Administrador



Ofício SMVO/SE/ n.º 43/2020.

Lagoa da Canoa – AL, 16 de abril de 2020.

Ilma. Senhora,

Joana Darque Bezerra Lima Rosendo

MD. Secretária Municipal de Educação

Nesta.

ASSUNTO: RELATÓRIO DE VISTORIA DE MEDIÇÃO

OBRA: Recuperação do ginásio poliesportivo Nelson de Jesus da Silva “Dida”

EMPRESA CONTRATADA: Construtora Escada LTDA - EPP

Nº MEDIÇÃO: 04

Após vistoriar in loco, comparando os serviços apresentados no último boletim de medição e relatório fotográfico, atesto que os itens medidos no boletim 04 apresentado está em conformidade com a execução física. Deste modo segue processo da oitava e última medição com nota fiscal atestada e devidas certidões.


 Eng. Civil Luiz André Portela da Silva Filho
 Crea: 0211857840
 Fiscal de Obra / Gestor de Contrato

Conforme o despacho de fiscal de obra do município, autorizo o pagamento da medição

AUTORIZO PAGAMENTO
 DATA: 16, 04, 20
 TÂNIA VEIGA PREFEITA


ciente, encaminho ao gabinete da refeita para autorização de pagamento da medição

36/04/20

 Joana Darque B. Lima Rosendo
 Secretária Municipal de Educação
 Portaria 0016



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA
Secretaria Municipal da Fazenda



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://www.e-nfs.com.br/arapiraca , informando o código de verificação.	Código de verificação CFA2.2A9A.0058	Data/Hora da emissão 16/04/2020 - 14:17:20
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 24

Prestador de Serviços

	CONSTRUTORA ESCADA LTDA POSSIDONIO NUNES, 703, CAPIATA, Telefone: . CEP 57310100 - ARAPIRACA - AL - BRASIL CPF/CNPJ 10.531.423/0001-91 Email fiscal@rrccontabilidade.com.br			Inscrição Municipal 132114
				Inscrição Estadual

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço	PREFEITURA MUNICIPAL LAGOA DA CANOA			
CPF/CNPJ	12.207.551/0001-00			
Endereço	PRAÇA VEREADOR BENÍCIO ALVES DE OLIVEIR, SN,			
Bairro	CENTRO, Telefone: .			
Cep	57330-000			
Cidade	LAGOA DA CANOA - AL - BRASIL			Inscrição Municipal
Email	sec.transporte.canoa@gmail.com			Inscrição Estadual

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

NOTA FISCAL REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DA RECUPERAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO NELSON DE JESUS DA SILVA "DIDA" LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA - AL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE TP Nº 013/2019, CONTRATO Nº 001.

DADOS BANCÁRIOS
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AG: 3209

OP: 003

CONTA: 635-0

CONSTRUTORA ESCADA LTDA -EPP

Lutz Andre Portela da S. Filho
Engenheiro Civil
CREA AL 02118578-40

Serviço: 7.02-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO E POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS)

Valor do Serviço (R\$)	Qtz.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
45.432,25	1,00	0,00	22.716,13	22.716,12	5,00	1.135,81	45.432,25

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 45.432,25

Retenções

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ISSQN(R\$)	Outras Retenções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)
1.135,81	0,00	1.135,81	44.296,44

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço- Tomador de serviço sem cadastro no NFSE, responsável pelo recolhimento do ISSQN acesse o Portal da Fazenda para emitir a guia.- ISSQN devido pelo Tomador em LAGOA DA CANOA - AL- NFSE é emitida com respaldo da Lei Municipal nº 2.342/2013, alterada por Lei Municipal nº 2.995/2014 e Decreto Municipal 2.217/2010. - Data do vencimento do ISS desta NFSE: 05/05/20- Retenções ISSQN (Retido): 1135,81.



**ESTADO DE ALAGOAS****FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA**

Praça Vereador Benício Alves de Oliveira, 15 - CENTRO

Lagoa da Canoa - AL

C.N.P.J.: 31.651.645/0001-18

Nota de Empenho

ABRIL/2020

Nota de Empenho 0416001

FORNECEDOR


Nome: CONSTRUTORA ESCADA LTDA - EPP CNPJ/CPF: 10531423000191
 Endereço: R POSSIDONIO NUNES, 703 Compl:
 Bairro: CAPIATA Cidade: Arapiraca UF: AL
 E-mail: construtoraescada@hotmail.com Telefone: (82)3521-8288
 PIS/PASEP: RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0881 FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
 Função: 12 Educação
 SubFunção: 361 Ensino Fundamental
 Programa: 0002 EDUCAÇÃO IDEAL BUSCANDO DIVERSIDADE E INCLUSÃO
 Ação: 2023 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%
 Natureza Despesa: 339039000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Subelemento: 339039160000 Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis
 Fonte: 025100000 FUNDEF/PRECATÓRIOS
 Centro Custo:



Licitação: Nº 013/2019 - Tomada Preços, Art.22 Inciso II Lei 8.666/93

Processo: Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Ordinário	45.432,25	45.432,25	0,00

HISTÓRICO

4ª MEDIÇÃO DA RECUPERAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO NELSON DE JESUS DA SILVA "DIDA" LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA - AL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE TP Nº 013/2019, CONTRATO Nº 001.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	1 - Outras Despesas Gerais	UND	1,000	45.432,2500	45.432,2500

QUARENTA E CINCO MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS

45.432,25

Data: 16/04/2020

 Autorizo o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

JOANA DARQUE BEZERRA LIMA ROSENDO
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO Mat.500

PUSKIN VEIGA LAVINAS CORREA DE SA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.3683



Nota de Liquidação: 0416001

Fonte: 025100000 - FUNDEF/PRECATÓRIOS

FORNECEDOR

Nome: CONSTRUTORA ESCADA LTDA - EPP CNPJ/CPF: 10531423000191
 Endereço: R POSSIDONIO NUNES Compl:
 Bairro: CAPIATA Cidade: Arapiraca UF: AL
 E-mail: construtoraescada@hotmail.com Telefone: (82)3521-8288 RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0881 FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
 Função: 12 Educação
 SubFunção: 361 Ensino Fundamental
 Programa: 0002 EDUCAÇÃO IDEAL BUSCANDO DIVERSIDADE E INCLUSÃO
 Ação: 2023 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%
 Natureza Despesa: 339039000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Suplemento: 339039160000 Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis
 Fonte: 025100000 FUNDEF/PRECATÓRIOS
 Centro Custo:

PMLC

Fls. 06

A

EMPENHO	EMISSION	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0416001	16/04/2020	45.432,25	45.432,25	0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

4ª MEDIÇÃO DA RECUPERAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO NELSON DE JESUS DA SILVA "DIDA" LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA - AL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE TP Nº 013/2019, CONTRATO Nº 001.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

4ª MEDIÇÃO DA RECUPERAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO NELSON DE JESUS DA SILVA "DIDA" LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA - AL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE TP Nº 013/2019, CONTRATO Nº 001.

Documento	Valor
Nota Fiscal (24 / Série: 0 / UF: AL / Emissão: 16/04/2020)	45.432,25

SUBEVENTO

35 - SERVIÇOS DIVERSOS - PJ

Conta Débito	Conta Crédito	Valor
33231060200000000 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	21311010000000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	45.432,25
Retenção	Valor	
21881010900000001-ISS - EDUCAÇÃO	1.135,81	

QUARENTA E CINCO MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS

Total Retido:	1.135,81
Total Liquido:	44.296,44

Data: 16/04/2020

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento de acordo com o Artigo 64 da Lei 4.320/64.

JOANA DARQUE BEZERRA LIMA ROSENDO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO Mat.500

PUSKIN VEIGA LAVINAS CORREA DE SA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.3683

CONSTRUTORA ESCADA		OBRA: RECUPERAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO NELSON DE JESUS DA SILVA "DIDA"	
CONSTRUTORA ESCADA		LOCAL: CONJUNTO NOSSA SENHORA APARECIDA - LAGOA DA CANOAIAL	
CONSTRUTORA ESCADA		EMPRESA: CONSTRUTORA ESCADA LTDA EPP	
CONSTRUTORA ESCADA		DATA ORDEM DE SERVIÇO: 19/11/2019	
CONSTRUTORA ESCADA		NÚMERO DA MEDIÇÃO: 04	
CONSTRUTORA ESCADA		DATA EMISSÃO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO: 15/04/2020	
CONSTRUTORA ESCADA		PERÍODO DA MEDIÇÃO:	
CONSTRUTORA ESCADA		18/03/2020 À 14/04/2020	
CONSTRUTORA ESCADA		VALOR DA MEDIÇÃO	
CONSTRUTORA ESCADA		R\$ 45.432,25	
CONSTRUTORA ESCADA		PRAZO: 90 DIAS	
CONSTRUTORA ESCADA		BDI 27,93%	

BOLETIM DE MEDIÇÃO 04

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO COM BDI	VALOR TOTAL	QUANTIDADES			FINANCEIRO			
						MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ATUAL	SALDO	MEDIDO NO PERÍODO (R\$)	ACUMULADO ANTERIOR R\$	ACUMULADO ATUAL (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 44.397,75					R\$ 37.291,39	R\$ 37.291,39	R\$ 7.106,36
1.1	DEMOLIÇÃO DE FORROS PVC	m²	86,17	R\$ 6,10	R\$ 525,63		86,17	86,17	0,00	R\$ 525,63	R\$ 525,63	R\$ 0,00
1.2	LIMPEZA GERAL PÓS DEMOLIÇÃO	m²	86,17	R\$ 1,90	R\$ 163,72		86,17	86,17	0,00	R\$ 163,72	R\$ 163,72	R\$ 0,00
1.3	REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA, COM OU SEM BATENTE	m²	7,00	R\$ 12,21	R\$ 85,47		7,00	7,00	0,00	R\$ 85,47	R\$ 85,47	R\$ 0,00
1.4	REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E VIDRO	m²	3,20	R\$ 11,42	R\$ 36,54		3,20	3,20	0,00	R\$ 36,54	R\$ 36,54	R\$ 0,00
1.5	LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM VEGETAÇÃO RASTEIRA, INCLUINDO ROÇAGEM E QUEIMA	m²	724,00	R\$ 3,37	R\$ 2.439,88		724,00	724,00	0,00	R\$ 2.439,88	R\$ 2.439,88	R\$ 0,00
1.6	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	3,00	R\$ 387,01	R\$ 1.161,03		3,00	3,00	0,00	R\$ 1.161,03	R\$ 1.161,03	R\$ 0,00
1.7	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M²	129,98	R\$ 17,19	R\$ 2.234,36		129,98	129,98	0,00	R\$ 2.234,36	R\$ 2.234,36	R\$ 0,00
1.8	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M²	309,00	R\$ 40,57	R\$ 12.536,13		309,00	309,00	0,00	R\$ 12.536,13	R\$ 12.536,13	R\$ 0,00
1.9	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS	M³	45,60	R\$ 34,19	R\$ 1.559,06		45,60	45,60	0,00	R\$ 1.559,06	R\$ 1.559,06	R\$ 0,00
1.10	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	M²	880,00	R\$ 17,59	R\$ 15.479,20		476,00	476,00	404,00	R\$ 8.372,84	R\$ 8.372,84	R\$ 7.106,36
1.11	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M³	18,49	R\$ 421,94	R\$ 7.801,67		18,49	18,49	0,00	R\$ 7.801,67	R\$ 7.801,67	R\$ 0,00
1.12	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL	M²	141,00	R\$ 2,66	R\$ 375,06		141,00	141,00	0,00	R\$ 375,06	R\$ 375,06	R\$ 0,00
2	CONSTRUÇÃO				R\$ 88.550,98					R\$ 38.521,45	R\$ 46.743,27	R\$ 41.807,71
2.1	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF 12/2014	m²	409,40	R\$ 65,88	R\$ 26.971,27		369,40	369,40	40,00	R\$ 24.336,07	R\$ 24.336,07	R\$ 2.696,20
2.2	PISO ALTA RESISTÊNCIA 12 MM, COR CINZA, COM JUNTAS PLÁSTICAS, POLIMENTO ATÉ O ESMERIL 400 E ENCRAMENTO, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO	m²	880,00	R\$ 41,59	R\$ 36.599,20		0,00	0,00	880,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.599,20
2.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM - COR PADRÃO	m²	141,01	R\$ 53,79	R\$ 7.584,92		22,00	141,01	0,00	R\$ 1.183,38	R\$ 7.584,92	R\$ 0,00

PMLC
F.S.
R\$ 36.599,20
R\$ 0,00
R\$ 7.106,36
R\$ 0,00

Luiz André Partela da S. Filho
Engenheiro Civil
CREA AL 02118578-40

Laelya Laranjeira Santos
Engenheira Civil
CREA-AL 0217216595


2.4	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO)	m²	160,55	R\$ 108,35	R\$ 17.395,59	16,80	120,00	136,80	23,75	R\$ 1.820,28	R\$ 13.002,00	R\$ 14.822,28	R\$ 2.573,31
3	ESTRUTURA				R\$ 57.228,02					R\$ 0,00	R\$ 57.228,02	R\$ 57.228,02	R\$ 0,00
3.1	CONCRETO ARMADO FCK=20MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS)	m³	5,09	R\$ 1.608,00	R\$ 8.184,72		5,09	5,09	0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.184,72	R\$ 8.184,72	R\$ 0,00
3.2	INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES	M³	8,00	R\$ 110,76	R\$ 886,08		0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA	M³	0,80	R\$ 485,48	R\$ 388,38		0,80	0,80	0,00	R\$ 0,00	R\$ 886,08	R\$ 886,08	R\$ 0,00
3.2.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS	M³	7,20	R\$ 2.436,88	R\$ 17.545,54		7,20	7,20	0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.545,54	R\$ 17.545,54	R\$ 0,00
3.2.3	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA, AF 01/2017	M³	6,24	R\$ 223,56	R\$ 1.395,01		6,24	6,24	0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.395,01	R\$ 1.395,01	R\$ 0,00
3.2.4	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME	M³	6,24	R\$ 2.436,88	R\$ 15.206,13		6,24	6,24	0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.206,13	R\$ 15.206,13	R\$ 0,00
3.2.5	PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA, AF 01/2017	M³	5,59	R\$ 2.436,88	R\$ 13.622,16		5,59	5,59	0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.622,16	R\$ 13.622,16	R\$ 0,00
3.3	SUPERESTRUTURA												
3.3.1	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA, AF 01/2017	M³	5,59	R\$ 2.436,88	R\$ 13.622,16		5,59	5,59	0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.622,16	R\$ 13.622,16	R\$ 0,00
4	ESQUADRIAS				R\$ 13.548,98					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.548,98
4.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATEANTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2015	UN	7,00	R\$ 803,31	R\$ 5.623,17		0,00	0,00	7,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.623,17
4.2	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-OCA, (0,60 A 0,90) X (1,50 A 1,80 M), INCLUSIVE BATEANTES E FERRAGENS	un	11,00	R\$ 601,41	R\$ 6.615,51		0,00	0,00	11,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.615,51
4.3	JANELA BASCULANTE, MOLDURA EM BARRA CHATA DE FERRO 1X1/4, E CANTONEIRA 1X1X1/4 - EXCLUSIVE VIDRO	m²	3,20	R\$ 409,47	R\$ 1.310,30		0,00	0,00	3,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.310,30
5	INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS				R\$ 12.034,59					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.034,59
5.1	CHUVEIRO PLÁSTICO SEM REGISTRO	un	6,00	R\$ 18,19	R\$ 109,14		0,00	0,00	6,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 109,14
5.2	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2013	UN	11,00	R\$ 57,18	R\$ 628,98		0,00	0,00	11,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 628,98
5.3	SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM AÇO INOXIDÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	R\$ 41,96	R\$ 251,76		0,00	0,00	6,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 251,76
5.4	VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL, LINHA RAVENA P9, DECA OU SIMILAR, INCL. VLVULA DE DESCARGA CROMADA HYDRA OU SIMILAR, ASSENTO ASTRA TPK OU SIMILAR, CONJ. DE FIXAO DECA SPI3 OU SIMILAR, ANEL DE VEDAÇÃO, TUBO DE LIGAO ACAB. CROMADO E ENGATE PLÁSTICO	un	10,00	R\$ 517,32	R\$ 5.173,20		0,00	0,00	10,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.173,20
5.5	REGISTRO GAVETA 1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	11,00	R\$ 42,94	R\$ 472,34		0,00	0,00	11,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 472,34
5.6	CUBA DE APOIO, OVAL, REF. BELLA PALLA, DA ETERNIT OU SIMILAR, EXCLUSIVE TORNEIRA, SIFÃO E ENGATE.	un	11,00	R\$ 484,01	R\$ 5.324,11		0,00	0,00	11,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.324,11
5.7	RALO SECO PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 12/2014	UN	9,00	R\$ 8,34	R\$ 75,06		0,00	0,00	9,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 75,06
6	REVESTIMENTO				R\$ 12.337,72					R\$ 3.688,06	R\$ 8.649,66	R\$ 12.337,72	R\$ 0,00

R\$ 472,34
R\$ 5.324,11
R\$ 75,06

Laelya Laranjeira Santos
Engenheira Civil
CREA-AL 0217216595

Luiz André Portela da S. Filho
Engenheiro Civil
CREA-AL 02118578-40

6.1	RECUPERAÇÃO DE REBOCO	m²	123,00	R\$ 29,42	R\$ 3.618,66		123,00	123,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.618,66	R\$ 3.618,66	R\$ 0,00
6.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAINOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS	M²	129,98	R\$ 67,08	R\$ 8.719,06	54,98	75,00	129,98	0,00	R\$ 3.688,06	R\$ 5.031,00	R\$ 8.719,06	R\$ 0,00
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			R\$ 26.061,78			0,00		0,00	R\$ 5.952,49	R\$ 0,00	R\$ 5.952,49	R\$ 20.109,29
7.1	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	R\$ 38,36	R\$ 76,72		0,00	0,00	2,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 76,72
7.2	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00	R\$ 21,59	R\$ 172,72		0,00	0,00	8,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 172,72
7.3	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	R\$ 34,10	R\$ 68,20		0,00	0,00	2,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 68,20
7.4	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00	R\$ 25,88	R\$ 155,28		0,00	0,00	6,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 155,28
7.5	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	R\$ 42,65	R\$ 127,95		0,00	0,00	3,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 127,95
7.6	TOMADA PARA AR CONDICIONADO, COM CAIXA PVC E DISJUNTOR BIPOLAR 30 A, EMBUTIDA	un	1,00	R\$ 90,66	R\$ 90,66		0,00	0,00	1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 90,66
7.7	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, APARENTE SEM ELETRODUTO	pl	9,00	R\$ 51,35	R\$ 462,15		0,00	0,00	9,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 462,15
7.8	LUMINÁRIA TUBULAR COM LAMPADA LED DE 1 X 9/10 W / BIVOLT	un	35,00	R\$ 81,88	R\$ 2.865,80		0,00	0,00	35,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.865,80
7.9	LUMINÁRIA TUBULAR COM LAMPADA LED DE 2 X 9/10 W / BIVOLT	un	4,00	R\$ 185,37	R\$ 741,48		0,00	0,00	4,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 741,48
7.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00	R\$ 10,08	R\$ 10,08	1,00	0,00	1,00	0,00	R\$ 10,08	R\$ 0,00	R\$ 10,08	R\$ 0,00
7.11	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	5,00	R\$ 11,53	R\$ 57,65	5,00	0,00	5,00	0,00	R\$ 57,65	R\$ 0,00	R\$ 57,65	R\$ 0,00
7.12	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00	R\$ 18,57	R\$ 37,14		0,00	0,00	2,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37,14
7.13	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00	R\$ 83,99	R\$ 83,99		0,00	0,00	1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 83,99
7.14	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.187,32	R\$ 2,64	R\$ 3.134,52	490,00	0,00	490,00	697,32	R\$ 1.293,60	R\$ 0,00	R\$ 1.293,60	R\$ 1.840,92
7.15	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.427,95	R\$ 5,09	R\$ 7.268,26	520,00	0,00	520,00	907,95	R\$ 2.646,80	R\$ 0,00	R\$ 2.646,80	R\$ 4.621,46
7.16	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	260,00	R\$ 6,95	R\$ 1.807,00		0,00	0,00	260,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.807,00
7.17	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	181,29	R\$ 8,20	R\$ 1.486,57	102,00	0,00	102,00	79,29	R\$ 836,40	R\$ 0,00	R\$ 836,40	R\$ 600,75
7.18	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	141,89	R\$ 10,56	R\$ 1.498,35	85,00	0,00	85,00	56,89	R\$ 897,60	R\$ 0,00	R\$ 897,60	R\$ 0,00
7.19	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 210,36	R\$ 210,36	1,00	0,00	1,00	0,00	R\$ 210,36	R\$ 0,00	R\$ 210,36	R\$ 0,00
7.20	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METÁLICO 400 W	UN	15,00	R\$ 380,46	R\$ 5.706,90		0,00	0,00	15,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.706,90




Laetya Larameira Santos
Engenheira Civil
CREA-AL 021721696

Luiz André Portela da S. Filho
Engenheiro Civil
CREA-AL 02119578-90

11.6	ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURA CVIGAS-TRELIÇA PRATT UDC150 E TERÇAS EM UDC 127, 2 ÁGUAS, SEM LANTERNIN, VÃOS 20,01 A 30,0M, PINTADO 1 D OXIDO FERRO + 2 D ESMALTE EPÓXI BRANCO, EXCETO FORN. TELHAS - EXECUTADA	m²	495,00	R\$	153,00	R\$	75.735,00	87,00	408,00	495,00	0,00	R\$ 13.311,00	R\$ 62.424,00	R\$ 75.735,00	R\$ 0,00
Total Geral												R\$ 45.432,25	R\$ 227.281,19	R\$ 272.713,44	R\$ 204.066,59


 Luiz André Porteira da S. Filho
 Engenheiro Civil
 CREA AL 02118578-40



Leelya Larangeira Santos
 Engenheira Civil
 CREA AL 0217216585


CONSTRUTORA ESCADA


MEMÓRIA DE CÁLCULO 04

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
2.0	PAREDES E PAINÉIS		
2.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM - COR PADRÃO	M ²	119,01
	WC 1	(3,8 + 4,8)*2*1,50	25,80
	WC 2	(4,80 + 6,75 + 2,25 + 5,74 + 1,80*3)*1,5	37,41
	VESTIÁRIO FEMININO	(5,2+4,1)*2*1,5	27,90
	VESTIÁRIO MASCULINO	(5,2+4,1)*2*1,5	27,90
	TOTAL		119,01
2.4	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M ²	16,80
		1,4*12	16,80
	TOTAL		16,80
6.0	REVESTIMENTO		
6.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS	M ²	54,98
	TOTAL		54,98
7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
7.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00
	TOTAL		1,00
7.11	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	5,00
	TOTAL		5,00
7.14	PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	490,00
	TOTAL		490,00
7.15	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	520,00
	TOTAL		520,00
7.17	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	102,00
	TOTAL		102,00
7.18	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	85,00
	TOTAL		85,00
7.19	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
	TOTAL		1,00

Luiz André Portela da S. Filho
Engenheiro Civil
CREA AL 02118578 40

Laelya Lafanleira Santos
Engenheira Civil
CREA-AL 0217216595

8.0 PINTURA		Fis.	
8.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M ²	16,00
		4*4	16,00
		TOTAL	16,00
8.5	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M ²	124,00
		TOTAL	124,00
9.0 DIVERSOS			
9.10	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	M ²	28,00
		20*1,4	28,00
		TOTAL	28,00
11.0 COBERTA			
11.2	REVISÃO DE COBERTURA COM SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS METÁLICAS EXISTENTES.	M ²	46,00
		10*4,6	46,00
		TOTAL	46,00
11.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	33,00
			33,00
		TOTAL	33,00
11.6	ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURA C/VIGAS-TRELIÇA PRATT UDC150 E TERÇAS EM UDC 127, 2 ÁGUAS, SEM LANTERNIN, VÃOS 20,01 A 30,0M, PINTADO 1 D OXIDO FERRO + 2 D ESMALTE EPÓXI BRANCO, EXCETO	M ²	87,00
			87,00
		TOTAL	87,00


 Luiz Andre Portela da S Filho
 Engenheiro Civil
 CREA AL 02118578 40


 Laelya Laranjeira Santos
 Engenheira Civil
 CREA-AL 0217216595

4º RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA RECUPERAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO NELSON DE JESUS DA SILVA "DIDA" EM LAGOA DA CANOA - AL



Figura 1 – Revestimento Cerâmico



Figura 2 – Revestimento Cerâmico

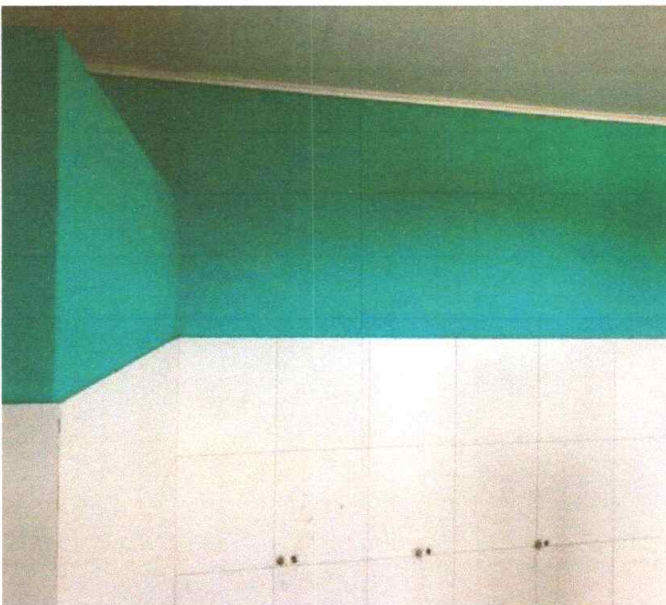


Figura 3 – Revestimento Cerâmico

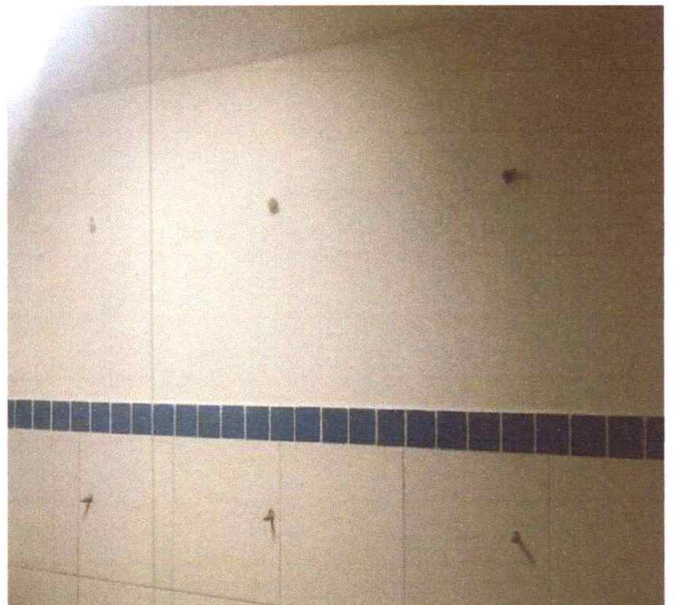


Figura 4 – Revestimento Cerâmico

Lutz André Portela da S. Filho
Engenheiro Civil
CREA AL 02118578 40

Laelya Lapa Moreira Santos
Engenheira Civil
CREA-AL 0217216595

4º RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA RECUPERAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO NELSON DE JESUS DA SILVA "DIDA" EM LAGOA DA CANOA - AL



Figura 5 – Instalação da Caixa D'água



Figura 6 – Instalação da Caixa D'água



Figura 7 – Instalações Elétricas

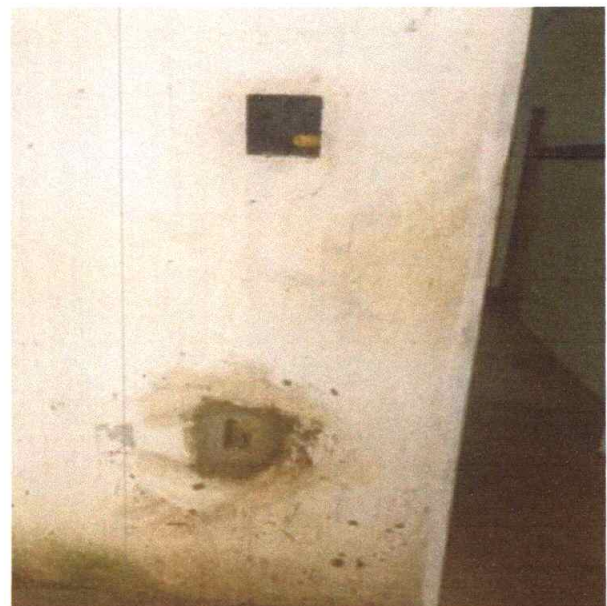


Figura 8 – Instalações Elétricas

Luiz Andre Portela da S. Filho
Engenheiro Civil
CREA AL 02118578 40

Laelya Laranjeira Santos
Engenheira Civil
CREA-AL 0217216595

4º RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA RECUPERAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO NELSON DE JESUS DA SILVA "DIDA" EM LAGOA DA CANOA - AL



Figura 9 – Quadro de Distribuição

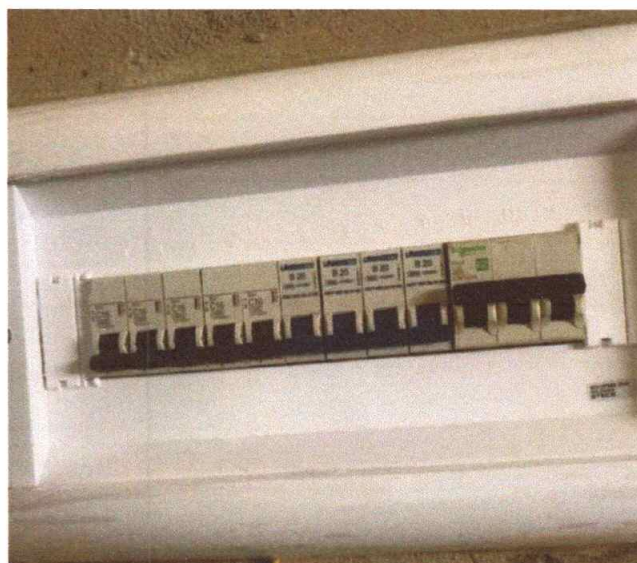


Figura 10 – Quadro de Distribuição e Disjuntores



Figura 11 – Pintura de Teto



Figura 12 – Pintura de Teto

Luiz André Portela da S. Filho
 Engenheiro Civil
 CREA AL 02118578 40

Laelya Laranjeira Santos
 Engenheira Civil
 CREA-AL 0217216595

4º RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA RECUPERAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO NELSON DE JESUS DA SILVA "DIDA" EM LAGOA DA CANOA - AL



Figura 13 – Pintura de Estruturas Metálicas



Figura 14 – Pintura de Estruturas Metálicas



Figura 15 – Alambrado



Figura 16 – Alambrado

Luiz André Portela da S. Filho
Engenheiro Civil
CRFA AL 02118578 40

Laelya Laraineira Santos
Engenheira Civil
CREA-AL 0217216595

CONSTRUTORA ESCADA LTDA	RELATÓRIO DIÁRIO DE OCORRÊNCIA (RDO)	Nº: <u>97</u>
------------------------------------	---------------------------------------------	---------------

Data: 18/03/2020 Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sab

Obra: **Recuperação do Ginásio Poliesportivo Nelson de Jesus da Silva "Dida"**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA**

Contrato Nº **001 - TP 013/2019**

PMLC
 Fls. 18

	Função	Efetivo	Faltas		INÍCIO DO CONTRATO: 11/11/2019	
P E S S O A L	Engenheiro Civil	1		T E M P O	FIM DO CONTRATO:	
	Encarregado	1			Dias Transcorridos:	
	Eletricista				Dias Faltantes:	
	Aj. Prático Eletricista				manha:	<input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuvoso <input type="checkbox"/> Impraticável
	Pedreiro	2			tarde:	<input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuvoso <input type="checkbox"/> Impraticável
	Aj. Prático de Pedreiro				Temperatura:	Umidade:
	Servente	3			OCORRÊNCIAS:	
	Pintor					
	Encanador	1				
	Carpinteiro					
	Armador					
		Totais				

COMENTÁRIOS

*Pintura de estrutura metálica
 Revisão de Coberta
 Instalações Hidráulicas*

Comentários da Fiscalização

<p style="text-align: center;"> Laely Laranjeira Santos CONSTRUTORA ESCADA LTDA Engenheira Civil CREA-AL 0217216595 </p>	<p style="text-align: center;"> Luiz André Portela da S. Filho Engenheiro Civil FISCALIZAÇÃO CREA AL 02118578-40 </p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


CONSTRUTORA ESCADA LTDA	RELATÓRIO DIÁRIO DE OCORRÊNCIA (RDO)	Nº: <u>99</u>
------------------------------------	---------------------------------------------	---------------

Data: 20 03/2020 Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sab

Obra: **Recuperação do Ginásio Poliesportivo Nelson de Jesus da Silva "Dida"**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA**

Contrato Nº **001 - TP 013/2019**



P E S S O A L	Função	Efetivo	Faltas	T E M P O	INÍCIO DO CONTRATO:	11/11/2019	
	Engenheiro Civil	1			FIM DO CONTRATO:		
	Encarregado				Dias Transcorridos:		
	Eletricista				Dias Faltantes:		
	Aj. Prático Eletricista				manha:	<input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuvoso <input type="checkbox"/> Impraticável	
	Pedreiro	2			tarde:	<input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuvoso <input type="checkbox"/> Impraticável	
	Aj. Prático de Pedreiro				Temperatura:	Umidade:	
	Servente	3			OCORRÊNCIAS:		
	Pintor	1					
	Encanador						
	Carpinteiro						
	Armador						
<i>Serralheiro</i>	<i>3</i>						
Totais							

COMENTÁRIOS

*Pintura de estrutura metálica
Revisão de coberta
Instalações hidráulicas*

Comentários da Fiscalização

Empty space for fiscalization comments.

CONSTRUTORA ESCADA LTDA
Engenheira Civil
CREA-AL 0217216595

Luiz André Portela da S. Filho
Engenheiro Civil
FISCALIZAÇÃO
CREA AL 02118578-00

CONSTRUTORA
ESCADA LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OCORRÊNCIA (RDO)

Nº: 100

Data: 21/03/2020

Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sab

PMLC

Obra: Recuperação do Ginásio Poliesportivo Nelson de Jesus da Silva "Dida"

Fis. 23

Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

Contrato Nº 001 - TP 013/2019

P E S S O A L	Função	Efetivo	Faltas	T E M P O
	Engenheiro Civil			
	Encarregado			
	Eletricista			
	Aj. Prático Eletricista			
	Pedreiro			
	Aj. Prático de Pedreiro			
	Servente			
	Pintor			
	Encanador			
	Carpinteiro			
Armador				
Serralheiro				
Totais				

INÍCIO DO CONTRATO: 11/11/2019
FIM DO CONTRATO:
 Dias Transcorridos:
 Dias Faltantes:

manha: Bom Chuvoso Impraticável
 tarde: Bom Chuvoso Impraticável

Temperatura: _____ Umidade: _____

OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS

Sábado

Comentários da Fiscalização

Laelya Laraújo Santos
CONSTRUTORA ESCADA LTDA
Engenheira Civil
CREA AL 0217218595

Luiz André Portela da S. Filho
Engenheiro Civil
FISCALIZAÇÃO
CREA AL 02118576-40


CONSTRUTORA ESCADA LTDA	RELATÓRIO DIÁRIO DE OCORRÊNCIA (RDO)	Nº: <u>101</u>
------------------------------------	---------------------------------------------	----------------

Data: 22/03/2020 Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sab

Obra: **Recuperação do Ginásio Poliesportivo Nelson de Jesus da Silva "Dida"**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA**

Contrato Nº **001 - TP 013/2019**



P E S S O A L	Função	Efetivo	Faltas	T E M P O
	Engenheiro Civil			
	Encarregado			
	Eletricista			
	Aj. Prático Eletricista			
	Pedreiro			
	Aj. Prático de Pedreiro			
	Servente			
	Pintor			
	Encanador			
Carpinteiro				
Armador				
Totais				

INÍCIO DO CONTRATO: **11/11/2019**
 FIM DO CONTRATO:
 Dias Transcorridos:
 Dias Faltantes:

manha: Bom Chuvoso Impraticável

tarde: Bom Chuvoso Impraticável

Temperatura: Umidade:

OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS

Domingo

Comentários da Fiscalização

CONSTRUTORA ESCADA LTDA
 Engenheiro Civil
 CREA-AL 0217218595

[Handwritten Signature]
 Luiz André Portela da S. Filho
 Engenheiro Civil
 CREA AL 0217218595


CONSTRUTORA ESCADA LTDA	RELATÓRIO DIÁRIO DE OCORRÊNCIA (RDO)	Nº: <u>102</u>
------------------------------------	---------------------------------------------	----------------

Data: 23/10/2020 Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sab

Obra: **Recuperação do Ginásio Poliesportivo Nelson de Jesus da Silva "Dida"**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA**

Contrato Nº **001 - TP 013/2019**



P E S S O A L	Função	Efetivo	Faltas	T E M P O	
	Engenheiro Civil				INÍCIO DO CONTRATO: 11/11/2019
	Encarregado	1			FIM DO CONTRATO:
	Eletricista				Dias Transcorridos:
	Aj. Prático Eletricista				Dias Faltantes:
	Pedreiro	2			manha: <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuvoso <input type="checkbox"/> Impraticável
	Aj. Prático de Pedreiro				tarde: <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuvoso <input type="checkbox"/> Impraticável
	Servente	3			Temperatura: _____ Umidade: _____
	Pintor				OCORRÊNCIAS:
	Encanador	1			
Carpinteiro					
Armador	1				
Totais					

COMENTÁRIOS

*Instalações hidráulicas
Produção de ferragens
Colocação de blocos*

Comentários da Fiscalização

Laely Leandrinha Santos
CONSTRUTORA ESCADA LTDA
Engenheira Civil
CREA AL 0217218605

Luiz André Portela da S. Filho
FISCALIZAÇÃO
Engenheiro Civil
CREA AL 02118578 40


CONSTRUTORA ESCADA LTDA	RELATÓRIO DIÁRIO DE OCORRÊNCIA (RDO)	Nº: <u>103</u>
------------------------------------	---------------------------------------------	----------------

Data: 24/03/2020 Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sab

Obra: **Recuperação do Ginásio Poliesportivo Nelson de Jesus da Silva "Dida"**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA**

Contrato Nº **001 - TP 013/2019**



P E S S O A L	Função	Efetivo	Faltas	T E M P O
	Engenheiro Civil	1		
	Encarregado	1		
	Eletricista			
	Aj. Prático Eletricista			
	Pedreiro	2		
	Aj. Prático de Pedreiro			
	Servente	3		
	Pintor			
	Encanador	1		
	Carpinteiro			
Armador	1			
Totais				

INÍCIO DO CONTRATO: 11/11/2019
FIM DO CONTRATO:
 Dias Transcorridos:
 Dias Faltantes:

manha: Bom Chuvoso Impraticável

tarde: Bom Chuvoso Impraticável

Temperatura: Umidade:

OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS

*Instalações Hidráulicas
 Produção de ferragens
 colocação de blocos*

Comentários da Fiscalização

<p>Lucia Laranjeira Santos CONSTRUTORA ESCADA LTDA Engenheira Civil CREA-AL 0217216595</p>	<p>Luiz André Portela da S. Filho Engenheiro Civil CREA AL 02118578-40</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------


CONSTRUTORA ESCADA LTDA	RELATÓRIO DIÁRIO DE OCORRÊNCIA (RDO)	Nº: <u>104</u>
------------------------------------	---------------------------------------------	----------------

Data: 25/03/2020 Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sab

Obra: Recuperação do Ginásio Poliesportivo Nelson de Jesus da Silva "Dida"

Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

Contrato Nº 001 - TP 013/2019



P E S O A L	Função	Efetivo	Faltas	T E M P O	INÍCIO DO CONTRATO: 11/11/2019 FIM DO CONTRATO: Dias Transcorridos: Dias Faltantes:
	Engenheiro Civil	1			manha: <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuvoso <input type="checkbox"/> Impraticável
	Encarregado				tarde: <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuvoso <input type="checkbox"/> Impraticável
	Eletricista				Temperatura: Umidade:
	Aj. Prático Eletricista				OCORRÊNCIAS:
	Pedreiro	2			
	Aj. Prático de Pedreiro				
	Servente	3			
	Pintor				
	Encanador	1			
	Carpinteiro	1			
	Armador				
	Totais				

COMENTÁRIOS

*Instalações Hidráulicas
Produção de formas
Enchimento de pilar*

Comentários da Fiscalização

Laelya Laranjeira Santos
Engenheira Civil
CONSTRUTORA ESCADA LTDA
CREA-AL 0217216695


Luiz André Portela da S. Filho
Engenheiro Civil
FISCALIZAÇÃO
CREA/AL 02118578-10

Data: 26/03/2020 Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sab

Obra: **Recuperação do Ginásio Poliesportivo Nelson de Jesus da Silva "Dida"**

Contratante : **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA**

Contrato Nº **001 - TP 013/2019**



P E S S O A L	Função	Efetivo	Faltas	T E M P O	INÍCIO DO CONTRATO:	11/11/2019	
	Engenheiro Civil	1				FIM DO CONTRATO:	
	Encarregado	1				Dias Transcorridos:	
	Eletricista					Dias Faltantes:	
	Aj. Prático Eletricista					manha:	<input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuvoso <input type="checkbox"/> Impraticável
	Pedreiro	2				tarde:	<input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuvoso <input type="checkbox"/> Impraticável
	Aj. Prático de Pedreiro					Temperatura:	Umidade:
	Servente	3				OCORRÊNCIAS:	
	Pintor						
	Encanador	1					
Carpinteiro							
Armador							
Totais							

COMENTÁRIOS


Instalações Hidráulicas
Emboço
Reboço

Comentários da Fiscalização

CONSTRUTORA ESCADA LTDA	RELATÓRIO DIÁRIO DE OCORRÊNCIA (RDO)	Nº: <u>106</u>
------------------------------------	---------------------------------------------	----------------

Data: 27/03/2020 Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sab

Obra: **Recuperação do Ginásio Poliesportivo Nelson de Jesus da Silva "Dida"**



Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA**

Contrato Nº **001 - TP 013/2019**

P E S S O A L	Função	Efetivo	Faltas	T E M P O	INÍCIO DO CONTRATO: 11/11/2019 FIM DO CONTRATO: Dias Transcorridos: Dias Faltantes: manha: <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuvoso <input type="checkbox"/> Impraticável tarde: <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuvoso <input type="checkbox"/> Impraticável Temperatura: _____ Umidade: _____ OCORRÊNCIAS:
	Engenheiro Civil	1			
	Encarregado	1			
	Eletricista				
	Aj. Prático Eletricista				
	Pedreiro	2			
	Aj. Prático de Pedreiro				
	Servente	3			
	Pintor				
	Encanador	1			
	Carpinteiro				
	Armador				
	Totais				

COMENTÁRIOS

*Instalações Hidráulicas
Emboco
Reboco*

Comentários da Fiscalização

Laelys Laranjeira Santos
 CONSTRUTORA ESCADA LTDA
 Engenheira Civil
 CREA-AL 0217216595

Luiz André Portela da S. Filho
 Engenheiro Civil
 CREA AL 19578 40

**CONSTRUTORA
ESCADA LTDA**

RELATÓRIO DIÁRIO DE OCORRÊNCIA (RDO)

Nº: 107

Data: 28/03/2020 Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sab

PMLC

Obra: **Recuperação do Ginásio Poliesportivo Nelson de Jesus da Silva "Dida"**

Fls. 28

Contratante : **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA**

Contrato Nº 001 - TP 013/2019

P E S S O A L	Função	Efetivo	Faltas	T E M P O	
	Engenheiro Civil				INÍCIO DO CONTRATO: 11/11/2019
	Encarregado				FIM DO CONTRATO:
	Eletricista				Dias Transcorridos:
	Aj. Prático Eletricista				Dias Faltantes:
	Pedreiro				manha: <input type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuvoso <input type="checkbox"/> Impraticável
	Aj. Prático de Pedreiro				tarde: <input type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuvoso <input type="checkbox"/> Impraticável
	Servente				Temperatura: Umidade:
	Pintor				OCORRÊNCIAS:
	Encanador				
	Carpinteiro				
	Armador				
	Totais				

COMENTÁRIOS

Sábado

Comentários da Fiscalização

Luiz Carlos Santos
CONSTRUTORA ESCADA LTDA
CREA-AL 0217216595

Luiz André Portela da S. Filho
Engenheiro de Fiscalização
CREA AL 02118578 40

Data: 29/03/2020 Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sab

Obra: Recuperação do Ginásio Poliesportivo Nelson de Jesus da Silva "Dida"

Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

Contrato Nº 001 - TP 013/2019

PMLC
Fls. 29

P E S S O A L	Funcão			T E M P O	INÍCIO DO CONTRATO: 11/11/2019	
	Efetivo	Faltas			FIM DO CONTRATO:	
	Engenheiro Civil				Dias Transcorridos:	
	Encarregado				Dias Faltantes:	
	Eletricista				manha:	<input type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuvoso <input type="checkbox"/> Impraticável
	Aj. Prático Eletricista				tarde:	<input type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuvoso <input type="checkbox"/> Impraticável
	Pedreiro				Temperatura:	Umidade:
	Aj. Prático de Pedreiro				OCORRÊNCIAS:	
	Servente					
	Pintor					
	Encanador					
	Carpinteiro					
	Armador					
	Totais					

COMENTÁRIOS

Domingo

Comentários da Fiscalização

Laely Lareyana Santos
CONSTRUTORA ESCADA LTDA
Engenheira Civil
CREA AL 0217216505

Lutz André Portela da S. Filho
Engenheiro Civil
FISCALIZAÇÃO
CREA AL 02116578-40

CONSTRUTORA ESCADA LTDA	RELATÓRIO DIÁRIO DE OCORRÊNCIA (RDO)	Nº: <u>109</u>
------------------------------------	---------------------------------------------	----------------

Data: 30/03/2020 Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sab

Obra: **Recuperação do Ginásio Poliesportivo Nelson de Jesus da Silva "Dida"**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA**

Contrato Nº **001 - TP 013/2019**



P E S S O A L	Função	Efetivo	Faltas	T E M P O
	Engenheiro Civil	1		
	Encarregado	1		
	Eletricista			
	Aj. Prático Eletricista			
	Pedreiro	2		
	Aj. Prático de Pedreiro			
	Servente	3		
	Pintor			
	Encanador			
	Carpinteiro			
	Armador			
	Servilheiros	3		
	Totais			

INÍCIO DO CONTRATO: **11/11/2019**
 FIM DO CONTRATO:
 Dias Transcorridos:
 Dias Faltantes:
 manhã: Bom Chuvoso Impraticável
 tarde: Bom Chuvoso Impraticável
 Temperatura: _____ Umidade: _____

OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS

Revisão de cobertura
 Revestimento Cerâmico
 colocação de cobogós

Comentários da Fiscalização

CONSTRUTORA ESCADA LTDA
 Engenheira Civil

Luiz André Portela da S. Filho
 Engenheiro Civil
 CREA AL 02118578-40

CONSTRUTORA ESCADA LTDA	RELATÓRIO DIÁRIO DE OCORRÊNCIA (RDO)	Nº: <u>330</u>
------------------------------------	---------------------------------------------	----------------

Data: 31/03/2020 Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sab

Obra: **Recuperação do Ginásio Poliesportivo Nelson de Jesus da Silva "Dida"**

Contratante : **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA**

Contrato Nº **001 - TP 013/2019**

PMLC
Fls. 31
[Handwritten Signature]

P E S S O A L	Função	Efetivo	Faltas	T E M P O	
	Engenheiro Civil	1			INÍCIO DO CONTRATO: 11/11/2019
	Encarregado	1			FIM DO CONTRATO:
	Eletricista				Dias Transcorridos:
	Aj. Prático Eletricista				Dias Faltantes:
	Pedreiro	2			manha: <input type="checkbox"/> Bom <input checked="" type="checkbox"/> Chuvoso <input type="checkbox"/> Impraticável
	Aj. Prático de Pedreiro				tarde: <input type="checkbox"/> Bom <input checked="" type="checkbox"/> Chuvoso <input type="checkbox"/> Impraticável
	Servente	3			Temperatura: _____ Umidade: _____
	Pintor				OCORRÊNCIAS:
	Encanador				
Carpinteiro					
Armador					
<i>Serralheiro</i>	1				
Totais					

COMENTÁRIOS

*Revisão de Coberta
Revestimento Cerâmico
Colocação de Cobogós*

Comentários da Fiscalização

<p><i>Laelya Laranjeira Santos</i> CONSTRUTORA ESCADA LTDA Engenheira Civil CREA-AL 0217218595</p>	<p><i>[Handwritten Signature]</i> Luiz André Portela da S. Filho Engenheiro Civil FISCALIZAÇÃO CREA AL 0211857640</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


CONSTRUTORA ESCADA LTDA	RELATÓRIO DIÁRIO DE OCORRÊNCIA (RDO)	Nº: <u>111</u>
------------------------------------	---------------------------------------------	----------------

Data: 01/10/2020 Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sab

Obra: **Recuperação do Ginásio Poliesportivo Nelson de Jesus da Silva "Dida"**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA**

Contrato Nº **001 - TP 013/2019**



	Função	Efetivo	Faltas		
P E S S O A L	Engenheiro Civil	1		T E M P O	INÍCIO DO CONTRATO: 11/11/2019
	Encarregado	1			FIM DO CONTRATO:
	Eletricista				Dias Transcorridos:
	Aj. Prático Eletricista				Dias Faltantes:
	Pedreiro	2			manha: <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuvoso <input type="checkbox"/> Impraticável
	Aj. Prático de Pedreiro				tarde: <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuvoso <input type="checkbox"/> Impraticável
	Servente	3			Temperatura: _____ Umidade: _____
	Pintor				OCORRÊNCIAS:
	Encanador				
	Carpinteiro				
Armador					
Serralheiro	1				
Totais					

COMENTÁRIOS

Revisão de Coberto
Revestimento Cerâmico
Colocação de Cobogós

Comentários da Fiscalização

Laela Laranjeira Santos CONSTRUTORA ESCADA LTDA Engenheira Civil CREA AL 0217218595	 Luiz André Portela da S. Filho FISCALIZAÇÃO CREA AL 02118578 40
----------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONSTRUTORA ESCADA LTDA	RELATÓRIO DIÁRIO DE OCORRÊNCIA (RDO)	Nº: <u>112</u>
------------------------------------	---------------------------------------------	----------------

Data: 02/04/2020 Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sab

Obra: Recuperação do Ginásio Poliesportivo Nelson de Jesus da Silva "Dida"

Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

Contrato N° 001 - TP 013/2019

PMLC

Fls. 33
[Handwritten Signature]

		Função	Efetivo	Faltas			
P E S S O A L		Engenheiro Civil	1		T E M P O	INÍCIO DO CONTRATO: 11/11/2019	
		Encarregado	1			FIM DO CONTRATO:	
		Eletricista				Dias Transcorridos:	
		Aj. Prático Eletricista				Dias Faltantes:	
		Pedreiro	2			manha:	<input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuvoso <input type="checkbox"/> Impraticável
		Aj. Prático de Pedreiro				tarde:	<input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuvoso <input type="checkbox"/> Impraticável
		Servente	3			Temperatura:	Umidade:
		Pintor				OCORRÊNCIAS:	
		Encanador					
		Carpinteiro					
		Armador					
	Serralheiro	1					
	Totais						

COMENTÁRIOS

*Revisão de Coberto
Colocação de cobogós
Colocação de blocos*

Comentários da Fiscalização

<p><i>[Handwritten Signature]</i> CONSTRUTORA ESCADA LTDA Engenheira Civil CREA-AL 0217218595</p>	<p><i>[Handwritten Signature]</i> Lutz André Fortes da S. Filho Engenheiro Civil FISCALIZAÇÃO CREA-AL 02118578-40</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data: 03/10/2020 Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sab

PMLC

Fis. JA

Obra: **Recuperação do Ginásio Poliesportivo Nelson de Jesus da Silva "Dida"**

Contratante : **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA**


Contrato Nº **001 - TP 013/2019**

P E S O A L	Função	Efetivo	Faltas	T E M P O	INÍCIO DO CONTRATO: 11/11/2019
	Engenheiro Civil	1			FIM DO CONTRATO:
	Encarregado	1			Dias Transcorridos:
	Eletricista				Dias Faltantes:
	Aj. Prático Eletricista				manha: <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuvoso <input type="checkbox"/> Impraticável
	Pedreiro	2			tarde: <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuvoso <input type="checkbox"/> Impraticável
	Aj. Prático de Pedreiro				Temperatura: _____ Umidade: _____
	Servente	3			OCORRÊNCIAS:
	Pintor				
	Encanador				
	Carpinteiro				
	Armador				
	<u>Serralheiro</u>	1			
	Totais				

COMENTÁRIOS

*Revisão de cobertura
Colocação de blocos
Embocadura*

Comentários da Fiscalização



Data: 04/04/2020 Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sab

Obra: **Recuperação do Ginásio Poliesportivo Nelson de Jesus da Silva "Dida"**

Contratante : **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA**

Contrato Nº **001 - TP 013/2019**

PMLC


Fls. 35

P E S S O A L	Função	Efetivo	Faltas	T E M P O	INÍCIO DO CONTRATO:	11/11/2019	
	Engenheiro Civil					FIM DO CONTRATO:	
	Encarregado					Dias Transcorridos:	
	Eletricista					Dias Faltantes:	
	Aj. Prático Eletricista					manha:	<input type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuvoso <input type="checkbox"/> Impraticável
	Pedreiro					tarde:	<input type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuvoso <input type="checkbox"/> Impraticável
	Aj. Prático de Pedreiro					Temperatura:	Umidade:
	Servente					OCORRÊNCIAS:	
	Pintor						
	Encanador						
Carpinteiro							
Armador							
Serralheiro							
Totais							

COMENTÁRIOS

Sabado

Comentários da Fiscalização



Data: 06/04/2020 Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sab

Obra: **Recuperação do Ginásio Poliesportivo Nelson de Jesus da Silva "Dida"**

Contratante : **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA**

Contrato Nº **001 - TP 013/2019**

PMLC
 Fis. 37

	Função	Efetivo	Faltas		INÍCIO DO CONTRATO: 11/11/2019	
P E S S O A L	Engenheiro Civil	1		T E M P O	FIM DO CONTRATO:	
	Encarregado	1			Dias Transcorridos:	
	Eletricista				Dias Faltantes:	
	Aj. Prático Eletricista				manha:	<input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuvoso <input type="checkbox"/> Impraticável
	Pedreiro	2			tarde:	<input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuvoso <input type="checkbox"/> Impraticável
	Aj. Prático de Pedreiro				Temperatura:	Umidade:
	Servente	3			OCORRÊNCIAS:	
	Pintor					
	Encanador					
	Carpinteiro	1				
	Armador					
Serralheiro	1					
	Totais					

COMENTÁRIOS

Revestimento cerâmico
Revisão de Coberto
Enchimento de pilar

Comentários da Fiscalização


CONSTRUTORA ESCADA LTDA	RELATÓRIO DIÁRIO DE OCORRÊNCIA (RDO)	Nº: <u>117</u>
------------------------------------	---------------------------------------------	----------------

Data: 07/10/2020 Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sab

Obra: **Recuperação do Ginásio Poliesportivo Nelson de Jesus da Silva "Dida"**

Contratante : **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA**

Contrato Nº **001 - TP 013/2019**



P E S S O A L	Função	Efetivo	Faltas	T E M P O	INÍCIO DO CONTRATO: 11/11/2019
	Engenheiro Civil	1			FIM DO CONTRATO:
	Encarregado	1			Dias Transcorridos:
	Eletricista				Dias Faltantes:
	Aj. Prático Eletricista				manha: <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuvoso <input type="checkbox"/> Impraticável
	Pedreiro	2			tarde: <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuvoso <input type="checkbox"/> Impraticável
	Aj. Prático de Pedreiro				Temperatura: _____ Umidade: _____
	Servente	3			OCORRÊNCIAS:
	Pintor				
	Encanador				
	Carpinteiro	1			
	Armador				
	Serralheiro	1			
	Totais				

COMENTÁRIOS

*Revestimento cerâmico
Revisão de cobertura
Enchimento de pilas
Instalações elétricas*


Comentários da Fiscalização

Luiz André Portela da S. Filho
Engenheiro Civil
CREA AL 0217216595

Escada Ltda
Engenheira Civil
CREA-AL 0217216595

CONSTRUTORA ESCADA LTDA	RELATÓRIO DIÁRIO DE OCORRÊNCIA (RDO)	Nº: <u>118</u>
------------------------------------	---------------------------------------------	----------------

Data: 08/10/2020 Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sab



Obra: **Recuperação do Ginásio Poliesportivo Nelson de Jesus da Silva "Dida"**

Contratante : **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA**

Contrato Nº **001 - TP 013/2019**

P E S S O A L	Função	Efetivo	Faltas	T E M P O	INÍCIO DO CONTRATO: 11/11/2019
	Engenheiro Civil	1			
Encarregado	1			Dias Transcorridos:	
Eletricista	1			Dias Faltantes:	
Aj. Prático Eletricista				manha:	
Pedreiro	2			<input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuvoso <input type="checkbox"/> Impraticável	
Aj. Prático de Pedreiro				tarde:	
Servente	3			<input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuvoso <input type="checkbox"/> Impraticável	
Pintor				Temperatura: _____ Umidade: _____	
Encanador				OCORRÊNCIAS:	
Carpinteiro					
Armador					
Serralheiro	1				
Totais					

COMENTÁRIOS

*Revisão de Coberta
Revestimento cerâmico
Instalações elétricas*

Comentários da Fiscalização

<p><i>Leelya</i> CONSTRUTORA ESCADA LTDA Engenheira Civil CREA AL 0217216895</p>	<p><i>Lutz Andre Portela da S. Filho</i> FISCALIZAÇÃO Engenheiro Civil CREA AL 02118578 40</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONSTRUTORA ESCADA LTDA	RELATÓRIO DIÁRIO DE OCORRÊNCIA (RDO)	Nº: <u>119</u>
------------------------------------	---------------------------------------------	----------------

Data: <u>09/04/2020</u>			<input type="checkbox"/> Dom	<input type="checkbox"/> Seg	<input type="checkbox"/> Ter	<input type="checkbox"/> Qua	<input checked="" type="checkbox"/> Qui	<input type="checkbox"/> Sex	<input type="checkbox"/> Sab
-------------------------	--	--	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------------------------------	------------------------------	------------------------------

Obra: Recuperação do Ginásio Poliesportivo Nelson de Jesus da Silva "Dida"	PMLC
-----------------------------------------------------------------------------------	------


Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA	Fls. <u>40</u>
------------------------------------------------------------	----------------

Contrato N° 001 - TP 013/2019			INÍCIO DO CONTRATO: 11/11/2019		
P E S S O A L	Função	Efetivo	Faltas	T E M P O	FIM DO CONTRATO:
	Engenheiro Civil	1			Dias Transcorridos:
	Encarregado				Dias Faltantes:
	Eletricista	1			manha: <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuvoso <input type="checkbox"/> Impraticável
	Aj. Prático Eletricista				tarde: <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuvoso <input type="checkbox"/> Impraticável
	Pedreiro	2			Temperatura: _____ Umidade: _____
	Aj. Prático de Pedreiro				OCORRÊNCIAS:
	Servente	3			
	Pintor				
	Encanador				
Carpinteiro					
Armador					
Serralheiro	1				
Totais					

COMENTÁRIOS

*Revisão de Coberto
Instalações elétricas
Revestimento Cerâmico*

Comentários da Fiscalização


 Luiz André Porteira da S. Filho
 Engenheiro Civil
 CREA-AL 02118578-40


 Leila Lessa de Santa
 Engenheira Civil
 CREA-AL 0217216595


CONSTRUTORA ESCADA LTDA	RELATÓRIO DIÁRIO DE OCORRÊNCIA (RDO)	Nº: <u>123</u>
------------------------------------	---------------------------------------------	----------------

Data: 13/04/2020 Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sab

Obra: **Recuperação do Ginásio Poliesportivo Nelson de Jesus da Silva "Dida"**

Contratante : **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA**

Contrato Nº **001 - TP 013/2019**



P E S S O A L	Função	Efetivo	Faltas	T E M P O	
	Engenheiro Civil	1			INÍCIO DO CONTRATO: 11/11/2019 FIM DO CONTRATO: Dias Transcorridos: Dias Faltantes:
	Encarregado	1			
	Eletricista	1			manha: <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuvoso <input type="checkbox"/> Impraticável
	Aj. Prático Eletricista				tarde: <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuvoso <input type="checkbox"/> Impraticável
	Pedreiro	2			Temperatura: _____ Umidade: _____
	Aj. Prático de Pedreiro	3			OCORRÊNCIAS:
	Servente				
	Pintor	1			
	Encanador				
Carpinteiro					
Armador					
Serralheiro	1				
Totais					

COMENTÁRIOS

Instalações elétricas
Alambreado
Pintura de teto dos vestiários
Bobagem

Comentários da Fiscalização


Laelya Laranjeira Santos CONSTRUTORA ESCADA LTDA CREA-AL 0217216695	Luiz André Portela da S. Filho FISCALIZAÇÃO CREA AL 02118578 40
----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------

Data: 19/10/2020 Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sab

Obra: **Recuperação do Ginásio Poliesportivo Nelson de Jesus da Silva "Dida"**

Contratante : **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA**

Contrato Nº **001 - TP 013/2019**



P E S S O A L	Função	Efetivo	Faltas	T E M P O	
	Engenheiro Civil	1			INÍCIO DO CONTRATO: 11/11/2019 FIM DO CONTRATO: Dias Transcorridos: Dias Faltantes:
	Encarregado	1			
	Eletricista	1			manha: <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuvoso <input type="checkbox"/> Impraticável
	Aj. Prático Eletricista				tarde: <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuvoso <input type="checkbox"/> Impraticável
	Pedreiro	2			Temperatura: _____ Umidade: _____
	Aj. Prático de Pedreiro				OCORRÊNCIAS:
	Servente	3			
	Pintor	1			
	Encanador				
Carpinteiro					
Armador					
Serralheiro	1				
Totais					

COMENTÁRIOS

*Instalações elétricas
Alambriado
Pintura do teto dos vestiários
Caboões*

Comentários da Fiscalização

CONSTRUTORA ESCADA LTDA
Engenheira Civil
CREA-AL 0217218556

Luiz André Porteira da S. Filho
Engenheiro de Fiscalização
CREA AL 02118578 40



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **CONSTRUTORA ESCADA LTDA**
CNPJ: **10.531.423/0001-91**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.


Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:10:57 do dia 06/01/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/07/2020.

Código de controle da certidão: **76C6.D574.9F80.2573**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS COM EFEITOS DE NEGATIVA

Certidão fornecida para o CNPJ: 10.531.423/0001-91

Nome/Contribuinte CONSTRUTORA ESCADA LTDA - ME EPP

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos existir, na presente data, pendências cadastradas em nome do contribuinte acima identificado, as quais estão com a exigibilidade suspensa nos termos dos incisos II, III e/ou IV, do art. 151, do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966).

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos do contribuinte e refere-se a débitos de natureza tributária e descumprimento de obrigações acessórias.

Certidão emitida gratuitamente com base na Instrução Normativa SEF nº. 27 de 15 de maio de 2017.

Certidão emitida nos termos do art. 79 da Lei nº 6.771/06 e do art. 258 do Decreto nº 25.370/13.


Válida até 08/05/2020

Emitida às 09:50:31 do dia 09/03/2020

Código de controle da certidão: 9E59-EE35-F84A-46AF



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA



FAZENDA MUNICIPAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS N.º 6253 / 2020

Identificação do Contribuinte

Contribuinte: CONSTRUTORA ESCADA LTDA**CNPJ/CPF:** 10.531.423/0001-91

Tipo do Contribuinte

Contribuinte Econômico **Situação Cadastral:** Ativo**Inscrição Municipal:** 132114**Identificação:** 4126**Endereço:** RUA - POSSIDONIO NUNES, Nº: 703,
57.310-100,**Bairro:** CAPIATA**Cidade:** ARAPIRACA**Complemento do Loteamento:**

Certificamos, com fundamento nas informações constantes em nosso Sistema de Cadastro e Controle de Arrecadação, e ressalvado o direito da Fazenda Municipal de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, conforme art. 332 do CTM, com referência ao presente instrumento, que em relação ao contribuinte/imóvel acima identificado **INEXISTE DÉBITO** impeditivo a expedição desta certidão.

De Autenticidade: A87.632.9D1.5EC

A autenticidade desta certidão DEVE ser confirmada na pagina da Secretaria de fazenda, no endereço:
<https://arapiraca.abaco.com.br/eagata/portal/>

Certidão emitida as 10:21:39 hs, do dia 01/04/2020 **Validade:31/05/2020**

Observação:

Voltar

Imprimir

PMLC

Fls.

49

A

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 10.531.423/0001-91**Razão Social:** CONSTRUTORA ESCADA LTDA EPP**Endereço:** RUA POSSIDONIO NUNES 703 / CAPIATA / ARAPIRACA / AL / 57310-100

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 15/03/2020 a 12/07/2020**Certificação Número:** 2020031504421150216805

Informação obtida em 13/04/2020 08:09:39

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: CONSTRUTORA ESCADA LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 10.531.423/0001-91

Certidão nº: 188974087/2019

Expedição: 12/11/2019, às 08:25:31

Validade: 09/05/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA ESCADA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.531.423/0001-91**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

CERTIDÃO ESTADUAL**FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL E CONCORDATA****CERTIDÃO Nº: 002743436****FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Certifico que, pesquisando os registros de distribuição de feitos do Estado de Alagoas, no período de 10 anos, verifiquei NÃO CONSTAR distribuições em nome de:

CONSTRUTORA ESCADA LTDA, residente na RUA POSSIDONIO NUNES, CEP: 57310-100, Arapiraca - AL, vinculado ao CNPJ: 10.531.423/0001-91 *****

Certifico ainda que a pesquisa acima refere-se a AÇÕES DE FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL E CONCORDATA em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado de Alagoas, com as ressalvas abaixo:

Observações:

- 1 - A presente certidão foi emitida de acordo com a Resolução nº. 121/2010 do CNJ;
- 2 - A presente certidão não abrange eventuais ações de FALÊNCIA em que a pessoa a respeito da qual é expedida figure no pólo ativo;
- 3 - Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ;
- 4 - Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, que deverão ser objeto de certidões específicas;
- 5 - A exatidão dos dados pessoais fornecidos para pesquisa é de inteira responsabilidade da parte interessada.
- 6 - A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas (www.tjal.jus.br).

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias.

Maceió, segunda-feira, 6 de abril de 2020 às 11h18min.

PEDIDO Nº:

002743436



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

PMLC

Fls. 52

GOVCONTA CAIXA

56600005

0056/006/00071011-8

PM DE LAGOA DA CANOA PREC FUNDEF

de: 01/04/2020 até: 30/04/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2020	-	SALDO ANTERIOR		6.008,18C
01/04/2020	507188	RESGATE	800.000,00C	806.008,18C
01/04/2020	187132	DEVOL TED	159.000,00C	965.008,18C
01/04/2020	010807	ENVIO TEV	60.848,51D	904.159,67C
01/04/2020	104318	ENVIO TED	159.000,00D	745.159,67C
01/04/2020	187132	ENVIO TED	159.000,00D	586.159,67C
01/04/2020	104318	DOC/TED ELETROICO	9,50D	586.150,17C
01/04/2020	187132	DOC/TED ELETROICO	9,50D	586.140,67C
01/04/2020	990001	APL AUTOM	580.132,49D	6.008,18C
01/04/2020	-	SALDO DO DIA		6.008,18C
02/04/2020	-	SALDO DO DIA		6.008,18C
03/04/2020	-	SALDO DO DIA		6.008,18C
06/04/2020	-	SALDO DO DIA		6.008,18C
07/04/2020	142802	ENVIO TED	101.334,72D	95.326,54D
07/04/2020	142802	DOC/TED ELETROICO	9,50D	95.336,04D
07/04/2020	727220	RESG AUTOM	101.344,22C	6.008,18C
07/04/2020	-	SALDO DO DIA		6.008,18C
08/04/2020	-	SALDO DO DIA		6.008,18C
09/04/2020	091202	ENVIO TEV	65.534,22D	59.526,04D
09/04/2020	091210	ENVIO TEV	42.447,73D	101.973,77D
09/04/2020	727220	RESG AUTOM	107.981,95C	6.008,18C
09/04/2020	-	SALDO DO DIA		6.008,18C
13/04/2020	123079	ENVIO TED	2.111,14D	3.897,04C
13/04/2020	123079	DOC/TED ELETROICO	9,50D	3.887,54C
13/04/2020	727220	RESG AUTOM	2.120,64C	6.008,18C
13/04/2020	-	SALDO DO DIA		6.008,18C
14/04/2020	-	SALDO DO DIA		6.008,18C
15/04/2020	-	SALDO DO DIA		6.008,18C
16/04/2020	-	SALDO DO DIA		6.008,18C
17/04/2020	-	SALDO DO DIA		6.008,18C
20/04/2020	-	SALDO DO DIA		6.008,18C
22/04/2020	152952	ENVIO TED	57.898,95D	51.890,77D
22/04/2020	152952	DOC/TED ELETROICO	10,00D	51.900,77D
22/04/2020	727220	RESG AUTOM	57.908,95C	6.008,18C
22/04/2020	-	SALDO DO DIA		6.008,18C
23/04/2020	-	SALDO DO DIA		6.008,18C
24/04/2020	-	SALDO DO DIA		6.008,18C
27/04/2020	270819	ENVIO TEV	44.296,44D	38.288,26D
27/04/2020	270901	ENVIO TEV	94.222,71D	132.510,97D
27/04/2020	000000	MANUT CTA	42,00D	132.552,97D
27/04/2020	727220	RESG AUTOM	138.561,15C	6.008,18C
27/04/2020	-	SALDO DO DIA		6.008,18C
28/04/2020	-	SALDO DO DIA		6.008,18C
29/04/2020	108157	ENVIO TED	1.055,57D	4.952,61C
