





PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS  
SERVIÇO DE ENGENHARIA  
CNPJ:12.207.551/0001-00



Ofício SMVO/SE/ n.º 70/2020.

Lagoa da Canoa – AL, 23 de junho de 2020.

Ilma. Senhora,

Joana Darque Bezerra Lima Rosendo

MD. Secretária Municipal de Educação

Nesta.

ASSUNTO: RELATÓRIO DE VISTORIA DE MEDIÇÃO

OBRA: Recuperação do ginásio poliesportivo Nelson de Jesus da Silva “Dida”

EMPRESA CONTRATADA: Construtora Escada LTDA - EPP

Nº MEDIÇÃO: 06

Após vistoriar in loco, comparando os serviços apresentados no último boletim de medição e relatório fotográfico, atesto que os itens medidos no boletim 06 apresentado está em conformidade com a execução física. Deste modo segue processo da oitava e última medição com nota fiscal atestada e devidas certidões.

ciente, encaminho ao gabinete da Prefeita para autorização de pagamento da medição.

23/06/20

*Joana Darque B. Lima Rosendo*

Joana Darque B. Lima Rosendo  
Secretaria Municipal de Educação  
Portaria 0016

*Luiz André Portela da Silva Filho*  
Eng. Civil Luiz André Portela da Silva Filho  
Crea: 0211857840  
Fiscal de Obra / Gestor de Contrato

Conforme o despacho do fiscal de obra do município, autorizo o pagamento da referida medição.

AUTORIZO PAGAMENTO

DATA: 23/06/20

TAINÁ VEIGA  
PREFEITA

imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA  
Secretaria Municipal da Fazenda



<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b> A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: <a href="https://www.e-nfs.com.br/arapiraca">https://www.e-nfs.com.br/arapiraca</a> , informando o código de verificação.	Código de verificação <b>83D9,626E,CF41</b>	Data/Hora da emissão <b>23/06/2020 - 16:34:27</b>
	Natureza da operação <b>Retenção do ISSQN</b>	Número da Nota <b>35</b>

Prestador de Serviços	
	<b>CONSTRUTORA ESCADA LTDA</b> POSSIDONIO NUNES, 703, CAPIATA, Telefone: . CEP 57310100 - ARAPIRACA - AL - BRASIL CPF/CNPJ 10.531.423/0001-91 <b>Inscrição Municipal</b> 132114 Email <a href="mailto:fiscal@rrccontabilidade.com.br">fiscal@rrccontabilidade.com.br</a> <b>Inscrição Estadual</b>

Tomador de Serviço	
Nome do tomador do serviço	PREFEITURA MUNICIPAL LAGOA DA CANOA
CPF/CNPJ	12.207.551/0001-00
Endereço	PRAÇA VEREADOR BENÍCIO ALVES DE OLIVEIR, SN, CENTRO, Telefone: .
Bairro	57330-000
Cep	LAGOA DA CANOA - AL - BRASIL
Cidade	<b>Inscrição Municipal</b>
Email	<a href="mailto:sec.transporte.canoa@gmail.com">sec.transporte.canoa@gmail.com</a> <b>Inscrição Estadual</b>

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais	
NOTA FISCAL REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DA RECUPERAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO NELSON DE JESUS DA SILVA "DIDA" LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA - AL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE TP Nº 013/2019, CONTRATO Nº 001. DADOS BANCÁRIOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 3209 OP: 003 CONTA: 635-0 CONSTRUTORA ESCADA LTDA -EPP	
<i>Luiz André Portela da S. Filho</i> <i>Engenheiro Civil</i> <i>CREA AL 02118578 40</i> <i>Atestado que os</i> <i>Serviços foram</i> <i>executados em</i> <i>25/06/2020</i>	

Serviço:	7.02-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO E POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS)						
----------	--	--	--	--	--	--	--

Valor do Serviço (R\$)	Qt.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
91.388,75	1,00	0,00	45.694,38	45.694,37	5,00	2.284,72	91.388,75

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 91.388,75**

Retenções				
INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ISSQN(R\$)	Outras Retenções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)
2.284,72	0,00	2.284,72	89.104,03

Outras Informações	
- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço- Tomador de serviço sem cadastro no NFSE, responsável pelo recolhimento do ISSQN acesse o Portal da Fazenda para emitir a guia.- ISSQN devido pelo Tomador em LAGOA DA CANOA - AL- NFSE é emitida com respaldo da Lei Municipal nº 2.342/2013, alterada por Lei Municipal nº 2.995/2014 e Decreto Municipal 2.217/2010. - Data do vencimento do ISS desta NFSE: 05/07/20- Retenções ISSQN (Retido): 2284,72.	



ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

Praça Vereador Benício Alves de Oliveira, 15 - CENTRO

Lagoa da Canoa - AL

C.N.P.J.: 12.207.551/0000-29

Nota de Empenho

JUNHO/2020

Nota de Empenho 0619002

FORNECEDOR

Nome: CONSTRUTORA ESCADA LTDA - EPP  
 CNPJ/CPF: 10531423000191  
 Endereço: R POSSIDONIO NUNES, 703  
 Bairro: CAPIATA  
 E-mail: construtoraescada@hotmail.com  
 PIS/PASEP:

Compl:  
 Cidade: Arapiraca  
 Telefone: (82)3521-8288  
 RG:


UF: AL

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0881 FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB  
 Função: 12 Educação  
 SubFunção: 361 Ensino Fundamental  
 Programa: 0002 EDUCAÇÃO IDEAL BUSCANDO DIVERSIDADE E INCLUSÃO  
 Ação: 2023 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%  
 Natureza Despesa: 339039000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
 SubElemento: 339039160000 Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis  
 F.: 025100000 FUNDEF/PRECATÓRIOS  
 Centro Custo:



Licitação: Nº 013/2019 - Tomada Preços, Art.22 Inciso II Lei 8.666/93

Processo: Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Ordinário	123.610,97	91.388,75	32.222,22

HISTÓRICO

REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DA RECUPERAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO NELSON DE JESUS DA SILVA "DIDA" LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA - AL.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	1 - Outras Despesas Gerais	UND	1,0000	91.388,7500	91.388,7500


NOVENTA E UM MIL E TREZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

91.388,75

Data: 19/06/2020

Autorizo o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

  
 JOANA DARQUE BEZERRA LIMA ROSENDO  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO Mat.500

  
 PUSKIN VEIGA LAVINIAS CORREA DE SA  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.3683



ESTADO DE ALAGOAS  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA**  
 Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento

JUNHO/2020

Nota de Liquidação: 0623002

Fonte: 025100000 - FUNDEF/PRECATÓRIOS

**FORNECEDOR**

Nome: CONSTRUTORA ESCADA LTDA - EPP CNPJ/CPF: 10531423000191  
 Endereço: R POSSIDONIO NUNES Compl:  
 Bairro: CAPIATA Cidade: Arapiraca UF: AL  
 E-mail: construtoraescada@hotmail.com Telefone: (82)3521-8288 RG:

**DADOS BANCÁRIOS**

Banco: Agência: Operação: Conta:

**CLASSIFICAÇÃO**

Unidade Orçamentária: 0881 FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB  
 Função: 12 Educação  
 SubFunção: 361 Ensino Fundamental  
 Programa: 0002 EDUCAÇÃO IDEAL BUSCANDO DIVERSIDADE E INCLUSÃO  
 Ação: 2023 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%  
 Natureza Despesa: 339039000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
 SubElemento: 339039160000 Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis  
 Fonte: 025100000 FUNDEF/PRECATÓRIOS  
 Centro Custo:



EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0619002	19/06/2020	91.388,75	91.388,75	0,00

**HISTÓRICO DO EMPENHO**

REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DA RECUPERAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO NELSON DE JESUS DA SILVA "DIDA" LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA - AL.

**HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO**

REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DA RECUPERAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO NELSON DE JESUS DA SILVA "DIDA" LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA - AL.

Documento	Valor
Nota Fiscal ( 35 / Série: 0 / UF: AL / Emissão: 23/06/2020 )	91.388,75

**SUBEVENTO**

35 - SERVIÇOS DIVERSOS - PJ

Conta Débito	Conta Crédito	Valor
33231060200000000 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	21311010000000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	91.388,75
Recebimento		Valor
21881010900000001-ISS - EDUCAÇÃO		2.284,72

NOVENTA E UM MIL E TREZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

Total Retido:	2.284,72
Total Liquido:	89.104,03


Data: 23/06/2020

**DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO**


Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64.

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

Autorizo o pagamento de acordo com o Artigo 64 da Lei 4.320/64.

  
 JOANA DARQUE BEZERRA LIMA ROSENDO  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO Mat.500

  
 PUSKIN VEIGA LAVINAS CORREA DE SA  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.3683



OBRA: RECUPERAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO NELSON DE JESUS DA SILVA "DIDA"

PRAZO: 90 DIAS  
BDI 27,93%  
PERÍODO DA MEDIÇÃO:  
14/05/2020 A 14/06/2020  
VALOR DA MEDIÇÃO  
R\$ 91.388,75

LOCAL: CONJUNTO NOSSA SENHORA APARECIDA - LAGOA DA CANOA/AL

EMPRESA: CONSTRUTORA ESCADA LTDA EPP

DATA ORDEM DE SERVIÇO: 19/11/2019

NÚMERO DA MEDIÇÃO: 06

DATA EMISSÃO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO: 15/06/2020

**BOLETIM DE MEDIÇÃO 06**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO COM BDI	VALOR TOTAL	QUANTIDADES			FINANCEIRO			
						MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ATUAL	SALDO	MEDIDO NO PERÍODO (R\$)	ACUMULADO ANTERIOR R\$	ACUMULADO ATUAL (R\$)
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>R\$ 44.397,75</b>					<b>R\$ 44.397,75</b>	<b>R\$ 44.397,75</b>	<b>R\$ 0,00</b>
1.1	DEMOLIÇÃO DE FORROS PVC	m²	86,17	R\$ 6,10	R\$ 525,63		86,17	86,17	0,00	R\$ 525,63	R\$ 525,63	R\$ 0,00
1.2	LIMPEZA GERAL PÓS DEMOLIÇÃO	m²	86,17	R\$ 1,90	R\$ 163,72		86,17	86,17	0,00	R\$ 163,72	R\$ 163,72	R\$ 0,00
1.3	REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA, COM OU SEM BATENTE	m²	7,00	R\$ 12,21	R\$ 85,47		7,00	7,00	0,00	R\$ 85,47	R\$ 85,47	R\$ 0,00
1.4	REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E VIDRO	m²	3,20	R\$ 11,42	R\$ 36,54		3,20	3,20	0,00	R\$ 36,54	R\$ 36,54	R\$ 0,00
1.5	LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM VEGETAÇÃO RASTEIRA, INCLUINDO ROCAGEM E QUEIMA	m²	724,00	R\$ 3,37	R\$ 2.439,88		724,00	724,00	0,00	R\$ 2.439,88	R\$ 2.439,88	R\$ 0,00
1.6	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	3,00	R\$ 387,01	R\$ 1.161,03		3,00	3,00	0,00	R\$ 1.161,03	R\$ 1.161,03	R\$ 0,00
1.7	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M²	129,98	R\$ 17,19	R\$ 2.234,36		129,98	129,98	0,00	R\$ 2.234,36	R\$ 2.234,36	R\$ 0,00
1.8	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M²	309,00	R\$ 40,57	R\$ 12.536,13		309,00	309,00	0,00	R\$ 12.536,13	R\$ 12.536,13	R\$ 0,00
1.9	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS	M³	45,60	R\$ 34,19	R\$ 1.559,06		45,60	45,60	0,00	R\$ 1.559,06	R\$ 1.559,06	R\$ 0,00
1.10	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	M²	880,00	R\$ 17,59	R\$ 15.479,20		880,00	880,00	0,00	R\$ 15.479,20	R\$ 15.479,20	R\$ 0,00
1.11	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M³	18,49	R\$ 421,94	R\$ 7.801,67		18,49	18,49	0,00	R\$ 7.801,67	R\$ 7.801,67	R\$ 0,00
1.12	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL	M²	141,00	R\$ 2,66	R\$ 375,06		141,00	141,00	0,00	R\$ 375,06	R\$ 375,06	R\$ 0,00
<b>2</b>	<b>CONSTRUÇÃO</b>				<b>R\$ 88.550,98</b>					<b>R\$ 51.951,78</b>	<b>R\$ 77.321,68</b>	<b>R\$ 11.229,30</b>
2.1	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO, AF. 12/2014	m²	409,40	R\$ 65,88	R\$ 26.971,27		409,40	409,40	0,00	R\$ 26.971,27	R\$ 26.971,27	R\$ 0,00
2.2	PISO ALTA RESISTÊNCIA 12 MM, COR CINZA, COM JUNTAS PLÁSTICAS, POLIMENTO ATÉ O ESMERIL 400 E ENCERAMENTO EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO	m²	880,00	R\$ 41,59	R\$ 36.599,20		0,00	610,00	270,00	R\$ 0,00	R\$ 25.369,90	R\$ 11.429,30
2.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM - COR PADRÃO	m²	141,01	R\$ 53,79	R\$ 7.584,92		141,01	141,01	0,00	R\$ 7.584,92	R\$ 7.584,92	R\$ 0,00

PMLC

R\$ 0,00  
R\$ 0,00  
R\$ 11.429,30

Laelya Laranjeira Santos  
Engenheira Civil  
CREA-AL 0217216595

Luiz André Portela da S. Filho  
Engenheiro Civil  
CREA AL 02118578 40

		m²	160,55	R\$	108,35	R\$	17.395,59		160,55	160,55	0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.395,59	R\$ 57.228,02	R\$ 17.395,59	R\$ 57.228,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.4	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO)																	
<b>3</b>	<b>ESTRUTURA</b>																	
3.1	CONCRETO ARMADO FCK=20MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 JIGOS)	m³	5,09	R\$ 1.608,00	R\$	8.184,72		5,09	5,09	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.184,72	R\$ 8.184,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.2	INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES	M³	8,00	R\$ 110,76	R\$	886,08		8,00	8,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 886,08	R\$ 886,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA	M³	0,80	R\$ 485,48	R\$	388,38		0,80	0,80	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 388,38	R\$ 388,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.2.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS	M³	7,20	R\$ 2.436,88	R\$	17.545,54		7,20	7,20	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.545,54	R\$ 17.545,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.2.3	PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. AF. 01/2017	M³	6,24	R\$ 223,56	R\$	1.395,01		6,24	6,24	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.395,01	R\$ 1.395,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.2.4	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME	M³	6,24	R\$ 2.436,88	R\$	15.206,13		6,24	6,24	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.206,13	R\$ 15.206,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.2.5	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. AF. 01/2017	M³	5,59	R\$ 2.436,88	R\$	13.622,16		5,59	5,59	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.622,16	R\$ 13.622,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.3	SUPERESTRUTURA																	
3.3.1	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. AF. 01/2017	M³	5,59	R\$ 2.436,88	R\$	13.622,16		5,59	5,59	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.622,16	R\$ 13.622,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>4</b>	<b>ESQUADRIAS</b>																	
4.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2015	UN	7,00	R\$ 803,31	R\$	5.623,17		7,00	7,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.623,17	R\$ 5.623,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.2	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÓCA, (0,80 A 0,90) X (1,50 A 1,80 M), INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	un	11,00	R\$ 601,41	R\$	6.615,51		0,00	0,00	11,00	11,00	R\$ 0,00	R\$ 6.615,51	R\$ 6.615,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.3	JANELA BASCULANTE, MOLDURA EM BARRA CHATA DE FERRO 1X1/4, E CANTONEIRA 1X1X1/4 - EXCLUSIVE VIDRO	m²	3,20	R\$ 409,47	R\$	1.310,30		3,20	3,20	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.310,30	R\$ 1.310,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>5</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS</b>																	
5.1	CHUVEIRO PLÁSTICO SEM REGISTRO	un	6,00	R\$ 18,19	R\$	109,14		6,00	6,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 109,14	R\$ 109,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.2	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	UN	11,00	R\$ 57,18	R\$	628,98		11,00	11,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 628,98	R\$ 628,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.3	SABONEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM AÇO INOXIDÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	R\$ 41,96	R\$	251,76		6,00	6,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 251,76	R\$ 251,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.4	VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL, LINHA RAVENA P9, DECA OU SIMILAR, INCL. VLVULA DE DESCARGA CROMADA HYDRA OU SIMILAR, ASSENTO ASTRA TPK OU SIMILAR, CONJ. DE FIXAO DECA SPI3 OU SIMILAR, ANEL DE VEDAÇÃO, TUBO DE LIGAO ACAB. CROMADO E ENGATE PLÁSTICO	un	10,00	R\$ 517,32	R\$	5.173,20		10,00	10,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.173,20	R\$ 5.173,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.5	REGISTRO GAVETA 1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,00	R\$ 42,94	R\$	472,34		11,00	11,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 472,34	R\$ 472,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.6	CUBA DE APOIO, OVAL, REF. BELLA PALLA, DA ETERNIT OU SIMILAR, EXCLUSIVE TORNEIRA, SIFÃO E ENGATE.	un	11,00	R\$ 484,01	R\$	5.324,11		11,00	11,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.324,11	R\$ 5.324,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.7	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	9,00	R\$ 8,34	R\$	75,06		9,00	9,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 75,06	R\$ 75,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00


PMLC

Fls 05

Laelys Laranjeira Santos  
Engenheira Civil  
CREA-AL 0217216595

Luiz Andre Pereira da S. Filho  
Engenheiro Civil  
CREA AL 02118578 40

6	REVESTIMENTO						R\$	12.337,72					R\$ 0,00	R\$ 12.337,72	R\$ 12.337,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.1	RECUPERAÇÃO DE REBOCO	m²	123,00	R\$	29,42	R\$	3.618,66		123,00		123,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.618,66	R\$ 3.618,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS	M²	129,98	R\$	67,08	R\$	8.719,06		129,98		129,98	0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.719,06	R\$ 8.719,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					<b>R\$</b>	<b>26.061,78</b>						<b>R\$ 3.607,28</b>	<b>R\$ 21.762,97</b>	<b>R\$ 25.370,25</b>	<b>R\$ 691,53</b>	
7.1	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	2,00	R\$	38,36	R\$	76,72		0,00		0,00	2,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 76,72	
7.2	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	8,00	R\$	21,59	R\$	172,72		0,00		0,00	8,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 172,72	
7.3	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	2,00	R\$	34,10	R\$	68,20		0,00		0,00	2,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 68,20	
7.4	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	6,00	R\$	25,88	R\$	155,28		0,00		0,00	6,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 155,28	
7.5	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	3,00	R\$	42,65	R\$	127,95		0,00		0,00	3,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 127,95	
7.6	TOMADA PARA AR CONDICIONADO, COM CAIXA PVC E DISJUNTOR BI-POLAR 30 A, EMBUTIDA	un	1,00	R\$	90,66	R\$	90,66		0,00		0,00	1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 90,66	
7.7	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, APARENTE SEM ELETRODUTO	pt	9,00	R\$	51,35	R\$	462,15		9,00		9,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 462,15	R\$ 462,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.8	LUMINARIA TUBULAR COM LAMPADA LED DE 1 X 9/10 W / BIVOLT	un	35,00	R\$	81,88	R\$	2.865,80	35,00	0,00		0,00	0,00	R\$ 2.865,80	R\$ 0,00	R\$ 2.865,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.9	LUMINARIA TUBULAR COM LAMPADA LED DE 2 X 9/10 W / BIVOLT	un	4,00	R\$	185,37	R\$	741,48	4,00	0,00		0,00	0,00	R\$ 741,48	R\$ 0,00	R\$ 741,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2016	UN	1,00	R\$	10,08	R\$	10,08		1,00		1,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,08	R\$ 10,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.11	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2016	UN	5,00	R\$	11,53	R\$	57,65		5,00		5,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 57,65	R\$ 57,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.12	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2016	UN	2,00	R\$	18,57	R\$	37,14		2,00		2,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 37,14	R\$ 37,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.13	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2016	UN	1,00	R\$	83,99	R\$	83,99		1,00		1,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 83,99	R\$ 83,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.14	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	1.187,32	R\$	2,64	R\$	3.134,52		1.187,32		1.187,32	0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.134,52	R\$ 3.134,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.15	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	1.427,95	R\$	5,09	R\$	7.268,26		1.427,95		1.427,95	0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.268,26	R\$ 7.268,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.16	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	260,00	R\$	6,95	R\$	1.807,00		260,00		260,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.807,00	R\$ 1.807,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.17	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	181,29	R\$	8,20	R\$	1.486,57		181,29		181,29	0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.486,57	R\$ 1.486,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.18	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	141,89	R\$	10,56	R\$	1.498,35		141,89		141,89	0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.498,35	R\$ 1.498,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.19	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	1,00	R\$	210,36	R\$	210,36		1,00		1,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 210,36	R\$ 210,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.20	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METÁLICO 400 W	UN	15,00	R\$	380,46	R\$	5.706,90		15,00		15,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.706,90	R\$ 5.706,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Luiz Andre Portela da S. Filho  
Engenheiro Civil  
CREA AL 02118578 40

Laelys Laranjeira Santos  
Engenheira Civil  
CREA AL 0237216595








11.6	ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURA CV/IGAS-TRELIÇA PRATT UDC150 E TERÇAS EM UDC 127, 2 ÁGUAS, SEM LANTERNIN, VÃOS 20,01 A 30,0M, PINTADO 1 D OXIDO FERRO + 2 D ESMALTE EPÓXI BRANCO, EXCETO FORN. TELHAS - EXECUTADA	m²	495,00	R\$	153,00	R\$	75.735,00		495,00	495,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 75.735,00	R\$ 75.735,00	R\$ 0,00
------	---	----	--------	-----	--------	-----	-----------	--	--------	--------	------	----------	---------------	---------------	----------

**Total Geral R\$ 476.780,03**

**R\$ 91.388,75 R\$ 335.401,22 R\$ 426.789,97 R\$ 49.990,06**

  
 Luiz André Portela da S. Filho  
 Engenheiro Civil  
 CREA AL 02118578 40





**MEMÓRIA DE CÁLCULO 06**

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
<b>2.0</b>	<b>PAREDES E PAINÉIS</b>		
2.2	PISO ALTA RESISTÊNCIA 12 MM, COR CINZA, COM JUNTAS PLÁSTICAS, POLIMENTO ATÉ O ESMERIL 400 E ENCERAMENTO, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO	m <sup>2</sup>	610,00
	PISO DA PARTE CENTRAL DO GINÁSIO	<b>TOTAL</b>	<b>610,00</b>
<b>5.0</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS</b>		
5.1	CHUVEIRO PLÁSTICO SEM REGISTRO	un	6,00
		6,00	6,00
		<b>TOTAL</b>	<b>6,00</b>
5.2	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	11,00
		11,00	11,00
		<b>TOTAL</b>	<b>11,00</b>
5.4	DESCARGA CROMADA HYDRA OU SIMILAR, ASSENTO ASTRA TPK OU SIMILAR, CONJ. DE FIXAO DECA SP13 OU SIMILAR, ANEL DE VEDAO, TUBO DE LIGAO ACAB. CROMADO E ENGATE PLSTICO	un	10,00
		10,00	10,00
		<b>TOTAL</b>	<b>10,00</b>
5.5	REGISTRO GAVETA 1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	11,00
		11,00	11,00
		<b>TOTAL</b>	<b>11,00</b>
5.6	CUBA DE APOIO, OVAL, REF. BELLA PALLA, DA ETERNIT OU SIMILAR, EXCLUIVE TORNEIRA, SIFÃO E ENGATE.	un	11,00
		11,00	11,00
		<b>TOTAL</b>	<b>11,00</b>
5.7	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	9,00
		9,00	9,00
		<b>TOTAL</b>	<b>9,00</b>
<b>7.0</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
7.9	LUMINARIA TUBULAR COM LMPADA LED DE 2 X 9/10 W / BIVOLT	un	35,00
		<b>TOTAL</b>	<b>35,00</b>
7.9	LUMINARIA TUBULAR COM LMPADA LED DE 2 X 9/10 W / BIVOLT	un	4,00
		<b>TOTAL</b>	<b>4,00</b>
<b>8.0</b>	<b>PINTURA</b>		
8.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES - INTERNO	m <sup>2</sup>	750,00
		Pilares e Vigas	165,00
		Cobogós	275,00
		Parede de Blocos	310,00
		<b>TOTAL</b>	<b>750,00</b>
8.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES - EXTERNO	m <sup>2</sup>	460,00
		Pilares e Vigas	245,00
		Cobogós	215,00
		<b>TOTAL</b>	<b>460,00</b>

  
 Luiz Andre Portela da S. Filho  
 Engenheiro Civil  
 CREA AL 02118578 40

  
 Laelya Lapaqueira Santos  
 Engenheira Civil  
 CREA-AL 0217216595

8.5	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m <sup>2</sup>	65,00
		Tela do Alambrado	65,00
		<b>TOTAL</b>	<b>65,00</b>
8.6	CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM DUAS DEMAOS	m <sup>2</sup>	1090,00
		Muro	80,00
		Paredes Laterais	650,00
		Paredes Frente e Fundos	360,00
		<b>TOTAL</b>	<b>1090,00</b>
<b>9.0 DIVERSOS</b>			
9.1	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=90CM, D=1 1/2", JACKWAL OU SIMILAR	M <sup>2</sup>	4,00
		<b>TOTAL</b>	<b>4,00</b>
9.6	DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA MICTRIOS, POLIDO, E=2CM, INCLUSIVE FIXAO - REV 02	un	42,19
		100% concluído	42,19
		<b>TOTAL</b>	<b>42,19</b>
9.7	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM	M <sup>2</sup>	4,44
		100% concluído	4,44
		<b>TOTAL</b>	<b>4,44</b>
9.15	GRADE DE FERRO - RECUPERAÇÃO DE 15%	M	16,20
		Grade de ferro Frontal do muro	16,20
		<b>TOTAL</b>	<b>16,20</b>

  
 Luiz André Portela da S. Filho  
 Engenheiro Civil  
 CREA AL 02118578 40



Laelya Laranjeira Santos  
 Engenheira Civil  
 CREA-AL/0217216595

**6º RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA RECUPERAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO NELSON DE JESUS DA SILVA "DIDA" EM LAGOA DA CANOA - AL**

PMLC  
Fis. 33  
*[Handwritten Signature]*



*Figura 1 – Bancada de Granito*



*Figura 2 – Bancada de Granito*



*Figura 3 – Divisória de Granito*



*Figura 4 – Divisória de Granito*

*[Handwritten Signature]*  
Lutz André Portela da S. Filho  
Engenheiro Civil  
CREA AL 02118578 40

*[Handwritten Signature]*  
Laelya Laranjeira Santos  
Engenheira Civil  
CREA-AL 0217216595

**6º RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA RECUPERAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO NELSON DE JESUS DA SILVA "DIDA" EM LAGOA DA CANOA - AL**

PMLC  
Fls. 36  
[Assinatura]



*Figura 5 – Chuveiro*



*Figura 6 – Chuveiro*



*Figura 7 – Vaso Sanitário*



*Figura 8 – Vaso Sanitário*

[Assinatura]  
Luiz André Portela da S. Filho  
Engenheiro Civil  
CREA AL 02118578 40

[Assinatura]  
Laelya Laranjeira Santos  
Engenheira Civil  
CREA-AL 0217216595

**6º RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA RECUPERAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO NELSON DE JESUS DA SILVA "DIDA" EM LAGOA DA CANOA - AL**



*Figura 9 – Execução do Piso Granilite*



*Figura 10 – Execução do Piso Granilite*



*Figura 11 – Pintura Interna*



*Figura 12 – Pintura Interna*

*Luiz André Portela da S. Filho*  
Engenheiro Civil  
CREA AL 02118578 40

*Laeliya Laranjeira Santos*  
Engenheira Civil  
CREA-AL 0217216595


**6º RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA RECUPERAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO NELSON DE JESUS DA SILVA "DIDA" EM LAGOA DA CANOA - AL**



*Figura 13 – Pintura Interna*



*Figura 14 – Pintura Interna*

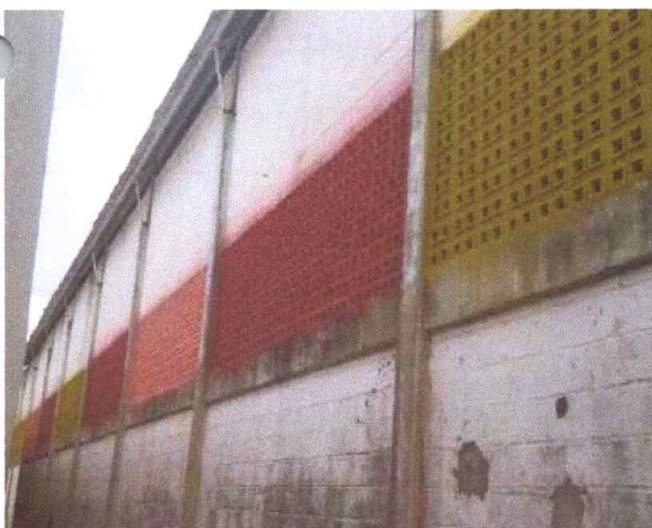

*Figura 15 – Pintura Externa*



*Figura 16 – Pintura Externa*

Luiz André Portela da S. Filho  
Engenheiro Civil  
CREA-AL 02118578-40

Leelya Laraineira Santos  
Engenheira Civil  
CREA-AL 0217216595




**6º RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA RECUPERAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO NELSON DE JESUS DA SILVA "DIDA" EM LAGOA DA CANOA - AL**



*Figura 17 – Gradil Metálico*



*Figura 18 – Gradil Metálico*

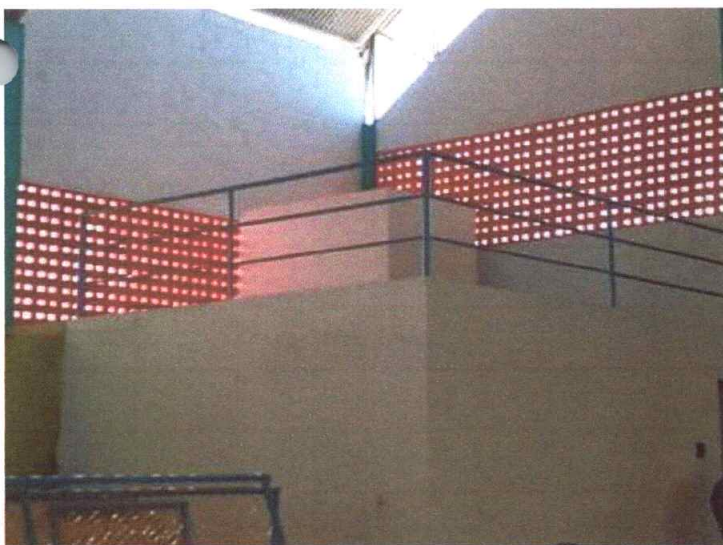

*Figura 19 – Guarda-Corpo*

*Luiz André Portela da S. Filho*  
Engenheiro Civil  
CREA AL/02118578 40



*Figura 20 – Barras de Apoio*

*Laelya Laranja Santos*  
Engenheira Civil  
CREA-AL-0217216595











<b>CONSTRUTORA ESCADA LTDA</b>	<b>RELATÓRIO DIÁRIO DE OCORRÊNCIA (RDO)</b>	Nº: <u>159</u>
------------------------------------	---	----------------

Data: 19/05/2020     Dom     Seg     Ter     Qua     Qui     Sex     Sab

Obra: **Recuperação do Ginásio Poliesportivo Nelson de Jesus da Silva "Dida"**

Contratante : **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA**

Contrato Nº **001 - TP 013/2019**

**PMLC**

Fls. 23

P E S S O A L	Função	Efetivo	Faltas	T E M P O
	Engenheiro Civil	1		
	Encarregado	1		
	Eletricista	1		
	Aj. Prático Eletricista			
	Pedreiro	2		
	Aj. Prático de Pedreiro			
	Servente	2		
	Pintor	3		
	Encanador			
	Carpinteiro			
	Armador			
	Serralheiro			
Totais				

**INÍCIO DO CONTRATO:** 11/11/2019

**FIM DO CONTRATO:**

Dias Transcorridos:

Dias Faltantes:

manha:     Bom     Chuvoso     Impraticável

tarde:     Bom     Chuvoso     Impraticável


Temperatura:    Umidade:

**OCORRÊNCIAS:**

**COMENTÁRIOS**

*Pintura de Paredes*  
*Instalação Elétrica*  
*Instalação de vasos sanitários*

**Comentários da Fiscalização**

  
 Luiz André Portela da S. Filho  
 Engenheiro Civil  
 CREA AL 02118578 40

Laelva Laranjeira Santos  
 CONSTRUTORA ESCADA LTDA  
 Engenheira Civil  
 CREA AL 0217216585

**FISCALIZAÇÃO**

Data: 20/05/2020     Dom     Seg     Ter     Qua     Qui     Sex     Sab

Obra: **Recuperação do Ginásio Poliesportivo Nelson de Jesus da Silva "Dida"**

Contratante : **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA**

Contrato Nº 001 - TP 013/2019

PMLC


Fis. 2h  
H

P E S S O A L	Função	Efetivo	Faltas	T E M P O	INÍCIO DO CONTRATO:	11/11/2019
	Engenheiro Civil	1				FIM DO CONTRATO:
Encarregado	1			Dias Transcorridos:		
Eletricista	1			Dias Faltantes:		
Aj. Prático Eletricista				manha:	<input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuvoso <input type="checkbox"/> Impraticável	
Pedreiro	2			tarde:	<input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuvoso <input type="checkbox"/> Impraticável	
Aj. Prático de Pedreiro				Temperatura:	Umidade:	
Servente	2			OCORRÊNCIAS:		
Pintor	3					
Encanador						
Carpinteiro						
Armador						
Serralheiro						
Totais						

**COMENTÁRIOS**

*Pintura de Paredes  
Instalação Elétrica  
Instalação de bancadas de granito*

**Comentários da Fiscalização**

  
 Luiz Andre Portela da S. Filho  
 Engenheiro Civil  
 CREA AL 02118578-40

Luiz Carlos Santos  
 CONSTRUTORA ESCADA LTDA  
 Engenheiro Civil  
 CREA-AL 0217216595

**FISCALIZAÇÃO**



CONSTRUTORA  
ESCADA LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OCORRÊNCIA (RDO)

Nº: 161

Data: 21/05/2020  Dom  Seg  Ter  Qua  Qui  Sex  Sab

Obra: Recuperação do Ginásio Poliesportivo Nelson de Jesus da Silva "Dida"

Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

Contrato Nº 001 - TP 013/2019

PMLC  
Fls. 25

P E S S O A L	Função	Efetivo	Faltas	T E M P O	INÍCIO DO CONTRATO:	11/11/2019	
	Engenheiro Civil	1			FIM DO CONTRATO:		
	Encarregado				Dias Transcorridos:		
	Eletricista	1			Dias Faltantes:		
	Aj. Prático Eletricista				manha:	<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuvoso <input type="checkbox"/> Impraticável
	Pedreiro	2			tarde:	<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuvoso <input type="checkbox"/> Impraticável
	Aj. Prático de Pedreiro				Temperatura:	Umidade:	
	Servente	2			OCORRÊNCIAS:		
	Pintor	3					
	Encanador						
	Carpinteiro						
Armador							
Serralheiro							
Totais							

COMENTÁRIOS

Pintura de Paredes  
Instalação Elétrica  
locações de divisórias de granito

Comentários da Fiscalização

*[Handwritten Signature]*  
Luiz Andre Portela da S. Filho  
Engenheiro Civil  
CREA-AL 02118578 40

CONSTRUTORA ESCADA LTDA  
Engenheira Civil  
CREA-AL 0217216595

FISCALIZAÇÃO


<b>CONSTRUTORA ESCADA LTDA</b>	<b>RELATÓRIO DIÁRIO DE OCORRÊNCIA (RDO)</b>	Nº: <u>162</u>
------------------------------------	---	----------------

**Data:** 22/05/2020     Dom     Seg     Ter     Qua     Qui     Sex     Sab

**Obra:** Recuperação do Ginásio Poliesportivo Nelson de Jesus da Silva "Dida"

**Contratante :** PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

**Contrato Nº 001 - TP 013/2019**



P E S S O A L	Função	Efetivo	Faltas	T E M P O	INÍCIO DO CONTRATO: 11/11/2019 FIM DO CONTRATO: Dias Transcorridos: Dias Faltantes:
	Engenheiro Civil	1			manha: <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuvoso <input type="checkbox"/> Impraticável
	Encarregado	1			
	Eletricista	1			tarde: <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuvoso <input type="checkbox"/> Impraticável
	Aj. Prático Eletricista				
	Pedreiro	2			Temperatura: _____ Umidade: _____
	Aj. Prático de Pedreiro				OCORRÊNCIAS: _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
	Servente	2			
	Pintor	3			
	Encanador				
	Carpinteiro				
	Armador				
	Serralheiro				
	Totais				

**COMENTÁRIOS**

*Pintura de Paredes  
Instalação elétrica  
Colocação de barras de apoio*

**Comentários da Fiscalização**

Luiz André Portela da S. Filho  
 Engenheiro Civil  
 CREA AL 02118578 40

Construtora Laranjeira Santos <b>CONSTRUTORA ESCADA LTDA</b> Engenheiro Civil CREA-AL 0217216595	<b>FISCALIZAÇÃO</b>
---	---------------------







Data: 26/05/2020     Dom     Seg     Ter     Qua     Qui     Sex     Sab

Obra: **Recuperação do Ginásio Poliesportivo Nelson de Jesus da Silva "Dida"**

Contratante : **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA**



Contrato Nº **001 - TP 013/2019**

P E S S O A L	Função	Efetivo	Faltas	T E M P O	INÍCIO DO CONTRATO: 11/11/2019	Fis. <u>30</u>
	Engenheiro Civil	1			<b>FIM DO CONTRATO:</b>	
	Encarregado				Dias Transcorridos:	
	Eletricista	1			Dias Faltantes:	
	Aj. Prático Eletricista				manha:	<input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuvoso <input type="checkbox"/> Impraticável
	Pedreiro	1			tarde:	<input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuvoso <input type="checkbox"/> Impraticável
	Aj. Prático de Pedreiro				Temperatura:	Umidade:
	Servente	1			<b>OCORRÊNCIAS:</b>	
	Pintor	2				
	Encanador					
	Carpinteiro					
	Armador					
	Serralheiro					
	Totais					

**COMENTÁRIOS**

*Recuperação de grades de ferro  
Instalação de luminárias e refletores  
Pintura de paredes*

**Comentários da Fiscalização**

Luiz Andre Portela da S. Filho  
 Engenheiro Civil  
 CREA AL 02118578 40


<b>CONSTRUTORA ESCADA LTDA</b>	<b>RELATÓRIO DIÁRIO DE OCORRÊNCIA (RDO)</b>	Nº: <u>167</u>
------------------------------------	---	----------------

Data: 27/05/2020     Dom     Seg     Ter     Qua     Qui     Sex     Sab

Obra: **Recuperação do Ginásio Poliesportivo Nelson de Jesus da Silva "Dida"**

Contratante : **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA**

Contrato Nº **001 - TP 013/2019**



P E S S O A L	Função	Efetivo	Faltas	T E M P O	INÍCIO DO CONTRATO:	11/11/2019	
	Engenheiro Civil	1				<b>FIM DO CONTRATO:</b>	
	Encarregado					Dias Transcorridos:	
	Eletricista	1				Dias Faltantes:	
	Aj. Prático Eletricista					manha:	<input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuvoso <input type="checkbox"/> Impraticável
	Pedreiro	1				tarde:	<input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuvoso <input type="checkbox"/> Impraticável
	Aj. Prático de Pedreiro					Temperatura:	Umidade:
	Servente	1				<b>OCORRÊNCIAS:</b>	
	Pintor	1					
	Encanador						
	Carpinteiro						
Armador							
Serralheiro							
Totais							

**COMENTÁRIOS**

Recuperação do gradil de ferro  
 Instalação de luminárias e refletores  
 Pintura de Paredes

**Comentários da Fiscalização**

Luiz Andre Portela da S. Filho  
 Engenheiro Civil  
 CREA AL 02118578 40

Conyza Leoni de Almeida Santos CONSTRUTORA ESCADA LTDA Engenheira Civil CREA AL 0217216595	<b>FISCALIZAÇÃO</b>
---	---------------------


<b>CONSTRUTORA ESCADA LTDA</b>	<b>RELATÓRIO DIÁRIO DE OCORRÊNCIA (RDO)</b>	Nº: <u>168</u>
------------------------------------	---	----------------

Data: 28/05/2020     Dom     Seg     Ter     Qua     Qui     Sex     Sab

Obra: **Recuperação do Ginásio Poliesportivo Nelson de Jesus da Silva "Dida"**

Contratante : **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA**

Contrato Nº **001 - TP 013/2019**



P E S S O A L	Função	Efetivo	Faltas	T E M P O	
	Engenheiro Civil	1			INÍCIO DO CONTRATO: 11/11/2019
	Encarregado	1			FIM DO CONTRATO:
	Eletricista	.			Dias Transcorridos:
	Aj. Prático Eletricista				Dias Faltantes:
	Pedreiro	1			manha: <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuvoso <input type="checkbox"/> Impraticável
	Aj. Prático de Pedreiro				tarde: <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuvoso <input type="checkbox"/> Impraticável
	Servente	1			Temperatura: _____ Umidade: _____
	Pintor	2			OCORRÊNCIAS:
	Encanador				
	Carpinteiro				
Armador					
Serralheiro					
Totais					

**COMENTÁRIOS**

*Pintura esmalte  
Pintura de Paredes*

**Comentários da Fiscalização**

*Luiz Andre Portela da S. Filho  
Engenheiro Civil  
CREA AL 02118578 40*

*Leidy Leanyra Santos  
CONSTRUTORA ESCADA LTDA  
Engenheira Civil  
CREA AL 0217218595*

**FISCALIZAÇÃO**










<b>CONSTRUTORA ESCADA LTDA</b>	<b>RELATÓRIO DIÁRIO DE OCORRÊNCIA (RDO)</b>	Nº: <u>172</u>
------------------------------------	---	----------------

Data: 01/06/2020     Dom     Seg     Ter     Qua     Qui     Sex     Sab

Obra: **Recuperação do Ginásio Poliesportivo Nelson de Jesus da Silva "Dida"**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA**

Contrato Nº **001 - TP 013/2019**



P E S S O A L	Função	Efetivo	Faltas	T E M P O
	Engenheiro Civil	1		
	Encarregado	1		
	Eletricista			
	Aj. Prático Eletricista			
	Pedreiro	2		
	Aj. Prático de Pedreiro			
	Servente	3		
	Pintor			
	Encanador			
	Carpinteiro			
Armador				
Serralheiro				
Totais				

INÍCIO DO CONTRATO: **11/11/2019**  
 FIM DO CONTRATO:  
 Dias Transcorridos:  
 Dias Faltantes:

manha:     Bom     Chuvoso     Impraticável  
 tarde:     Bom     Chuvoso     Impraticável

Temperatura:    Umidade:

OCORRÊNCIAS:

**COMENTÁRIOS**

*Execução do granilite*

**Comentários da Fiscalização**

Luiz Andre Portela da S. Filho  
 Engenheiro Civil  
 CREA AL 02118578-40

Laelya Laranjeira Santos  
 Engenheira Civil  
 CONSTRUTORA ESCADA LTDA  
 CREA-AL 0217216595

FISCALIZAÇÃO

CONSTRUTORA  
ESCADA LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OCORRÊNCIA (RDO)

Nº: 173

Data: 02/06/2020  Dom  Seg  Ter  Qua  Qui  Sex  Sab

Obra: Recuperação do Ginásio Poliesportivo Nelson de Jesus da Silva "Dida"

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

Contrato Nº 001 - TP 013/2019



P E S S O A L	Função	Efetivo	Faltas	T E M P O	INÍCIO DO CONTRATO:	11/11/2019	
	Engenheiro Civil	1			FIM DO CONTRATO:		
	Encarregado				Dias Transcorridos:		
	Eletricista				Dias Faltantes:		
	Aj. Prático Eletricista				manha:	<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuvoso <input type="checkbox"/> Impraticável
	Pedreiro	2			tarde:	<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuvoso <input type="checkbox"/> Impraticável
	Aj. Prático de Pedreiro				Temperatura:	Umidade:	
	Servente	3			OCORRÊNCIAS:		
	Pintor						
	Encanador						
	Carpinteiro						
	Armador						
Serralheiro							
Totais							

COMENTÁRIOS

Execução do Granilite

Comentários da Fiscalização

Luiz Andre Portela da S. Filho  
Engenheiro Civil  
CREA AL 02118578 40

Laelia Larangeira Santos  
CONSTRUTORA ESCADA LTDA  
Engenheira Civil  
CREA AL 0217218595

FISCALIZAÇÃO





CONSTRUTORA  
ESCADA LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OCORRÊNCIA (RDO)

Nº: 176

Data: 05/06/2020  Dom  Seg  Ter  Qua  Qui  Sex  Sab

Obra: Recuperação do Ginásio Poliesportivo Nelson de Jesus da Silva "Dida"

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

Contrato Nº 001 - TP 013/2019

PMLC

Fls. 40

P E S S O A L	Função	Efetivo	Faltas	T E M P O	INÍCIO DO CONTRATO:	11/11/2019	
	Engenheiro Civil	1			FIM DO CONTRATO:		
	Encarregado				Dias Transcorridos:		
	Eletricista				Dias Faltantes:		
	Aj. Prático Eletricista				manha:	<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuvoso <input type="checkbox"/> Impraticável
	Pedreiro	2			tarde:	<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuvoso <input type="checkbox"/> Impraticável
	Aj. Prático de Pedreiro				Temperatura:	Umidade:	
	Servente	3			OCORRÊNCIAS:		
	Pintor						
	Encanador						
	Carpinteiro						
Armador							
Serralheiro							
Totais							

COMENTÁRIOS

Execução do Piso Granilite

Comentários da Fiscalização

Luiz André Portela da S. Filho  
Engenheiro Civil  
CREA-AL 02118578-40

Laeiya Laranjeira Santos  
CONSTRUTORA ESCADA LTDA  
CREA-AL 0217216595

FISCALIZAÇÃO









CONSTRUTORA  
ESCADA LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OCORRÊNCIA (RDO)

Nº: 180

Data: 09/06/2020  Dom  Seg  Ter  Qua  Qui  Sex  Sab

Obra: Recuperação do Ginásio Poliesportivo Nelson de Jesus da Silva "Dida"

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

Contrato Nº 001 - TP 013/2019

PMLC


Fis. 44

P E S S O A L	Função	Efetivo	Faltas	T E M P O	INÍCIO DO CONTRATO:	11/11/2019	
	Engenheiro Civil	1			FIM DO CONTRATO:		
	Encarregado	1			Dias Transcorridos:		
	Eletricista				Dias Faltantes:		
	Aj. Prático Eletricista				manha:	<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuvoso <input type="checkbox"/> Impraticável
	Pedreiro	2			tarde:	<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuvoso <input type="checkbox"/> Impraticável
	Aj. Prático de Pedreiro				Temperatura:	Umidade:	
	Servente	3			OCORRÊNCIAS:		
	Pintor						
	Encanador						
	Carpinteiro						
Armador							
Serralheiro							
Totais							

COMENTÁRIOS

Execução do Piso Granilite  
Polimento do granilite antigo  
Acabamentos diversos

Comentários da Fiscalização

  
Luiz Andre Portela da S. Filho  
Engenheiro Civil  
CREA AL 02118578-40

Luiz Lara de Sousa Santos  
CONSTRUTORA ESCADA LTDA  
Engenheiro Civil  
CREA-AL 0217246595

FISCALIZAÇÃO





Data: 12/06/2020     Dom     Seg     Ter     Qua     Qui     Sex     Sab

Obra: **Recuperação do Ginásio Poliesportivo Nelson de Jesus da Silva "Dida"**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA**

Contrato Nº **001 - TP 013/2019**

**PMLC**  
Fls. 17  
*[Handwritten Signature]*

P E S S O A L	Função	Efetivo	Faltas	T E M P O	INÍCIO DO CONTRATO:	11/11/2019	
	Engenheiro Civil	1				<b>FIM DO CONTRATO:</b>	
	Encarregado	1				Dias Transcorridos:	
	Eletricista					Dias Faltantes:	
	Aj. Prático Eletricista					manha:	<input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuvoso <input type="checkbox"/> Impraticável
	Pedreiro					tarde:	<input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuvoso <input type="checkbox"/> Impraticável
	Aj. Prático de Pedreiro					Temperatura:	Umidade:
	Servente					<b>OCORRÊNCIAS:</b>	
	Pintor						
	Encanador						
Carpinteiro							
Armador							
Serralheiro							
<b>Totais</b>							

**COMENTÁRIOS**

*Polimento do granilite antigo  
Execução de granilite*

**Comentários da Fiscalização**

*[Handwritten Signature]*  
Luz Andre Portela da S. Filho  
Engenheiro Civil  
CREA-AL 02118578 40









**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: CONSTRUTORA ESCADA LTDA**  
**CNPJ: 10.531.423/0001-91**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.


Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:10:57 do dia 06/01/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/07/2020.

Código de controle da certidão: **76C6.D574.9F80.2573**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**Estado de Alagoas**  
**Secretaria de Estado da Fazenda**  
**Superintendência da Receita Estadual**



**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS COM EFEITOS DE NEGATIVA**

Certidão fornecida para o CNPJ: 10.531.423/0001-91

Nome/Contribuinte **CONSTRUTORA ESCADA LTDA - ME** **EPP**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos existir, na presente data, pendências cadastradas em nome do contribuinte acima identificado, as quais estão com a exigibilidade suspensa nos termos dos incisos II, III e/ou IV, do art. 151, do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966).

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos do contribuinte e refere-se a débitos de natureza tributária e descumprimento de obrigações acessórias.

Certidão emitida gratuitamente com base na Instrução Normativa SEF nº. 27 de 15 de maio de 2017.

Certidão emitida nos termos do art. 79 da Lei nº 6.771/06 e do art. 258 do Decreto nº 25.370/13.

Válida até 11/07/2020


Emitida às 09:44:43 do dia 12/05/2020

Código de controle da certidão: 6DEA-8620-E304-4326

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na internet, no endereço: [www.sefaz.al.gov.br](http://www.sefaz.al.gov.br).



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA



FAZENDA MUNICIPAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS N.º 9474 / 2020

Identificação do Contribuinte

**Contribuinte:** CONSTRUTORA ESCADA LTDA  
**CNPJ/CPF:** 10.531.423/0001-91

Tipo do Contribuinte

Contribuinte Econômico **Situação Cadastral:** Ativo

**Inscrição Municipal:** 132114

**Identificação:** 4126

**Endereço:** RUA - POSSIDONIO NUNES, Nº: 703,  
57.310-100,

**Bairro:** CAPIATA

**Cidade:**

**Complemento do Loteamento:**

Certificamos, com fundamento nas informações constantes em nosso Sistema de Cadastro e Controle de Arrecadação, e ressalvado o direito da Fazenda Municipal de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, conforme art. 332 do CTM, com referência ao presente instrumento, que em relação ao contribuinte/imóvel acima identificado **INEXISTE DÉBITO** impeditivo a expedição desta certidão.

**De Autenticidade:** 551.979.39E.799

A autenticidade desta certidão DEVE ser confirmada na pagina da Secretaria de fazenda, no endereço:  
<https://arapiraca.abaco.com.br/eagata/portal/>

Certidão emitida as 09:47:53 hs, do dia 01/06/2020 **Validade:**12/08/2020



Observação:

Voltar

Imprimir

PMLC

Fls. 53**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF****Inscrição:** 10.531.423/0001-91**Razão Social:** CONSTRUTORA ESCADA LTDA EPP**Endereço:** RUA POSSIDONIO NUNES 703 / CAPIATA / ARAPIRACA / AL / 57310-100

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 15/03/2020 a 12/07/2020**Certificação Número:** 2020031504421150216805

Informação obtida em 13/04/2020 08:09:39

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

**CERTIDÃO ESTADUAL**

**FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL E CONCORDATA**

**CERTIDÃO Nº: 002763029**

**FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Certifico que, pesquisando os registros de distribuição de feitos do Estado de Alagoas, no período de 10 anos, verifiquei NÃO CONSTAR distribuições em nome de:

**CONSTRUTORA ESCADA LTDA, residente na RUA POSSIDONIO NUNES, CEP: 57310-100, Arapiraca - AL, vinculado ao CNPJ: 10.531.423/0001-91 \*\*\*\*\***

Certifico ainda que a pesquisa acima refere-se a AÇÕES DE FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL E CONCORDATA em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado de Alagoas, com as ressalvas abaixo:

Observações:

- 1 - A presente certidão foi emitida de acordo com a Resolução nº. 121/2010 do CNJ;
- 2 - A presente certidão não abrange eventuais ações de FALÊNCIA em que a pessoa a respeito da qual é expedida figure no pólo ativo;
- 3 - Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ;
- 4 - Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, que deverão ser objeto de certidões específicas;
- 5 - A exatidão dos dados pessoais fornecidos para pesquisa é de inteira responsabilidade da parte interessada.
- 6 - A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas ([www.tjal.jus.br](http://www.tjal.jus.br)).

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias.

Maceió, quarta-feira, 3 de junho de 2020 às 10h39min.

**PEDIDO Nº:**

**002763029**





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA ESCADA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 10.531.423/0001-91  
Certidão nº: 10356432/2020  
Expedição: 06/05/2020, às 08:50:23  
Validade: 01/11/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA ESCADA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.531.423/0001-91**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
GABINETE DA SECRETÁRIA  
CNPJ: 12.207.551/0001-00



Ofício 262/2020/SEMED/GS

Lagoa da Canoa, 30 de julho 2020.

A Excelentíssima  
Senhora,  
Tainá Correa de Sá Lucio da Silva  
DD. Prefeita do Município de Lagoa da Canoa.  
Nesta

Assunto: **Solicitação de Pagamento referente à medição da obra de recuperação do Ginásio Poliesportivo Nelson de Jesus da Silva "DIDA".**  
Senhora Prefeita,

Após a prestação do serviço requerido e autorizado por Vossa Excelência. Vimos por meio deste, solicitar que seja efetuado o pagamento no valor de R\$ 91.388,75 (Noventa e um mil, trezentos e oitenta e oito reais e setenta e cinco centavos) em favor **Construtora Escada LTDA**, cadastrado no **CNPJ: 10.531.423/0001-91**, conforme Nota Fiscal: **35**.

Destarte, Informamos que o pagamento deverá ser creditado na Conta: **635-0** Agência: **3209** Op:003 Caixa Econômica Federal.

Certa de que ao assunto será dada a atenção merecida, contamos com vossa presteza, em tempo que renovo votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Joana Dargue Bezerra Lima Rosendo  
Secretaria Municipal de Educação de Lagoa da Canoa - AL

**AUTORIZO PAGAMENTO**  
DATA: 30/07/20  
TAINÁ CORREA DE SÁ LUCIO DA SILVA  
PREFEITA



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 56600005  
 Conta Referência: 0056/006/00071011-8  
 Nome: PM DE LAGOA DA CANOA PREC FUNDEF  
 Período: de: 01/08/2020 até: 31/08/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2020	-	SALDO ANTERIOR		6.008,18C
03/08/2020	-	SALDO DO DIA		6.008,18C
04/08/2020	-	SALDO DO DIA		6.008,18C
05/08/2020	-	SALDO DO DIA		6.008,18C
06/08/2020	061836	ENVIO TEV	89.104,03D	83.095,85D
06/08/2020	061519	TEV MESM T	1.105,56D	84.201,41D
06/08/2020	061538	TEV MESM T	392,18D	84.593,59D
06/08/2020	061553	TEV MESM T	652,13D	85.245,72D
06/08/2020	061556	TEV MESM T	556,09D	85.801,81D
06/08/2020	061559	TEV MESM T	278,21D	86.080,02D
06/08/2020	061603	TEV MESM T	229,76D	86.309,78D
06/08/2020	061838	TEV MESM T	2.284,72D	88.594,50D
06/08/2020	727220	RESG AUTOM	94.602,68C	6.008,18C
06/08/2020	-	SALDO DO DIA		6.008,18C
07/08/2020	-	SALDO DO DIA		6.008,18C
10/08/2020	-	SALDO DO DIA		6.008,18C
11/08/2020	860203	RESGATE	200.000,00C	206.008,18C
11/08/2020	111800	ENVIO TEV	121.400,62D	84.607,56C
11/08/2020	111804	TEV MESM T	1.848,74D	82.758,82C
11/08/2020	990001	APL AUTOM	76.750,64D	6.008,18C
11/08/2020	-	SALDO DO DIA		6.008,18C
12/08/2020	-	SALDO DO DIA		6.008,18C
13/08/2020	-	SALDO DO DIA		6.008,18C
14/08/2020	-	SALDO DO DIA		6.008,18C
17/08/2020	-	SALDO DO DIA		6.008,18C
18/08/2020	181559	ENVIO TEV	104.426,43D	98.418,25D
18/08/2020	181559	TEV MESM T	2.677,60D	101.095,85D
18/08/2020	727220	RESG AUTOM	107.104,03C	6.008,18C
18/08/2020	-	SALDO DO DIA		6.008,18C
19/08/2020	-	SALDO DO DIA		6.008,18C
20/08/2020	-	SALDO DO DIA		6.008,18C
21/08/2020	-	SALDO DO DIA		6.008,18C
24/08/2020	-	SALDO DO DIA		6.008,18C
25/08/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	5.959,18C
25/08/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	6.008,18C
25/08/2020	-	SALDO DO DIA		6.008,18C
26/08/2020	261735	TEV MESM T	1.029,99D	4.978,19C
26/08/2020	261740	TEV MESM T	792,18D	4.186,01C
26/08/2020	261745	TEV MESM T	251,57D	3.934,44C
26/08/2020	261757	TEV MESM T	353,72D	3.580,72C
26/08/2020	261804	TEV MESM T	931,16D	2.649,56C
26/08/2020	261807	TEV MESM T	143,76D	2.505,80C
26/08/2020	261808	TEV MESM T	295,14D	2.210,66C
26/08/2020	261816	TEV MESM T	533,85D	1.676,81C
