



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa
PROCOLO GERAL
CNPJ: 12.207.551/0001-00

PROCOLO

Protocolo: 04060021 Ano: 2020 Emiss o: 06/04/2020 Hora: 12:37:28

REQUERENTE / PROCURADOR:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA O

TITULAR / ORG O:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA O

TIPO PROCESSO:

ADMINISTRATIVO

ASSUNTO:

SOLICITA O DE PAGAMENTO

Outras Informa es:

referente a s tima medi o do centro educacional padre jos  theisen

MOVIMENTA O

Data	Org�o Destino	Dt. Recebimento	Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS
SERVIÇO DE ENGENHARIA
CNPJ:12.207.551/0001-00



Ofício SMVO/SE/ n.º 38/2020.

Lagoa da Canoa – AL, 06 de abril de 2020.

Ilma. Senhora,

Joana Darque Bezerra Lima Rosendo

MD. Secretária Municipal de Educação

Nesta.

ASSUNTO: RELATÓRIO DE VISTORIA DE MEDIÇÃO

OBRA: CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL PADRÉ JOSÉ JOSETH THEISEN

EMPRESA CONTRATADA: Construtora Novo Horizonte Eirelli - EPP

Nº MEDIÇÃO: 07

Após vistoriar in loco, comparando os serviços apresentados no último boletim de medição e relatório fotográfico, atesto que os itens medidos no boletim 07 apresentado está em conformidade com a execução física. Deste modo segue processo da oitava e última medição com nota fiscal atestada e devidas certidões.


*ciente, encaminho
ao gabinete da Prefeita
para autorização de
pagamento de medição
06/04/2020*

*Joana Darque B. Lima Rosendo
Secretaria Municipal de Educação
Portaria 0016*

Luiz André Portela da Silva Filho
Eng. Civil Luiz André Portela da Silva Filho
Crea: 0211857840
Fiscal de Obra / Gestor de Contrato

*Conforme o despacho
do fiscal de obra
do município, autorizo
o pagamento da respectiva
medição.*

AUTORIZO PAGAMENTO
DATA: 06/04/20
TAINÁ VEIGA
PREFEITA




Construtora Novo Horizonte
Eireli EPP

Rua Nossa Senhora
do o 682 salas 02 e
03 Bairro Brasília
Arapiraca Alagoas
CEP 57.313-310

82 3522 2615
construtora.n.h@hot
18.286.438/0001-
43

SOLICITAÇÃO



Venho pela presente solicitar a Secretaria Municipal competente do Município de Lagoa da Canoa/AL o pagamento da 7ª (sétima) MEDIÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL PADRE JOSÉ JOSETH THEISEN, NO MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA/AL, CONFORME CONTRATO Nº 01 – TP 007/2019.

Na certeza do pleno atendimento, exponho a minha gratidão.

Atenciosamente,


Luiz André Portela da S. Filho
Engenheiro Civil
CREA AL 02118578 40

Arapiraca/AL, 03 de abril de 2020


CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI EPP
Joel Pereira Silva
CPF: 786.941.244-91
Sócio-administrador



Construtora Novo Horizonte Eireli EPP

Rua Mossa Isenhora de e 682 s/nas 02 e 03 Barro Brasília Aváparca Alagoas CEP 57.313-310

82 3522 2615 construtora.n.h@hotmail.com 18 286-438/0001-43

Nº DO CONTRATO:	R\$	676.682,55
VALOR DA OBRA:		
DATA DE MEDIÇÃO:	13-mar-20	2-abr-20
PERÍODO:		
Nº DE BOLETIM:	07	
VALOR DA MEDIÇÃO:	R\$	67.214,98
DIAS TRABALHADOS:		21
PERCENTUAL EXECUTADO ACUMULADO		

Item	Código Banco	Descrição	Planilha Orçamentária Sintética	B.D.I.	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Encargos Sociais Desonerado:	Total	Peso (%)	Medido no Período	Acumulado Anterior	Acumulado Atual	Saldo de Contrato	Acumulado Anterior	Acumulado Atual	Saldo do Contrato
1		ADMINISTRAÇÃO DE OBRA															
1.1	90777 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240	72,54	93,34	43.802,00	22.401,60	6,44 %	4	232	232	232	4,00	232	4,00	373,36
1.2	00004083 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS	H	1080	15,26	19,63	21.200,40	4.408,82	3,31 %	40	394	394	394	46,92	394	46,92	903,88
2		SERVIÇOS PRELIMINARES															
2.1	41594 SINAPI	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELÉTRICA AEREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MANIFIRA	UN	1	1.260,06	1.821,44	493,60	1.544,91	0,65 %	1	1	1	1	0,00	1	0,00	903,88
2.2	6096 ORSE	Ligação Fiação de Água em Mureta de Concreto. Provisória ou Definitiva, com Fornecedor de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm	UN	1	363,59	493,60	493,60	1.544,91	0,07 %	1	1	1	1	0,00	1	0,00	903,88
2.3	97622 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REPROVITAMENTO AF. 17/2017	m²	38,54	32,86	42,28	748,88	48.212,11	0,23 %	38,54	38,54	38,54	38,54	0,00	38,54	0,00	903,88
2.4	72897 SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	m³	36,54	15,89	20,44	748,88	48.212,11	0,11 %	36,54	36,54	36,54	36,54	0,00	36,54	0,00	903,88
3		INFRAESTRUTURA															
3.1	93359 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 30 CM AF. 03/2016	m³	70,37	49,86	64,18	821,39	4.516,35	0,67 %	70,37	70,37	70,37	70,37	0,00	70,37	0,00	903,88
3.2	96895 SINAPI	REATERRO MANUAL APLIADO COM SOQUETE AF. 10/2017	m³	21,11	30,24	38,91	171,71	16.190,10	0,12 %	21,11	21,11	21,11	21,11	0,00	21,11	0,00	903,88
3.3	95241 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, FRPESURA DE 5 CM AF. 07/2016	m²	7,04	19,96	24,39	383,47	9.040,37	0,03 %	7,04	7,04	7,04	7,04	0,00	7,04	0,00	903,88
3.4	94984 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2:7 (CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF. 07/2016	m³	42,22	298,01	383,47	16.190,10	4.516,35	0,23 %	42,22	42,22	42,22	42,22	0,00	42,22	0,00	903,88
3.5	83516 SINAPI	ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO	m²	28,15	249,58	321,15	15.002,03	2.470,19	6,96 %	28,15	28,15	28,15	28,15	0,00	28,15	0,00	903,88
3.6	83204 SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADE EM LOCO EM CONCRETO AF. 03/2016	M	351,83	33,14	42,84	10.03	47.075,66	6,96 %	351,83	351,83	351,83	351,83	0,00	351,83	0,00	903,88
3.7	74106001 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, TIPO DE MAIOR	m²	246,28	7,80	10,03	65,21	38.107,92	4,63 %	246,28	246,28	246,28	246,28	0,00	246,28	0,00	903,88
4		ALVENARIA															
4.1	87508 SINAPI	ALVENARIA DE VEDACÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 8X14X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÁO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF. 06/2014	m²	721,97	50,68	65,21	47.075,66	31.337,93	0,76 %	721,97	721,97	721,97	721,97	0,00	721,97	0,00	903,88
5		COBERTURA															
5.1	278 ORSE	Revisão em coberturas com telhas tipo canalite 48, com reposição de 20% do material	m²	1070,65	22,75	29,27	5.114,42	1.655,58	0,24 %	1070,65	1070,65	1070,65	1070,65	0,00	1070,65	0,00	903,88
5.2	94228 SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF. 06/2016	M	73,94	53,76	69,17	283.545,54	8.114,89	1,20 %	73,94	73,94	73,94	73,94	0,00	73,94	0,00	903,88
5.3	304 ORSE	Rolo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm	m	56,64	22,72	29,23	1.280,00	47.707,45	7,05 %	56,64	56,64	56,64	56,64	0,00	56,64	0,00	903,88
6		REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS															
6.1	87885 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCIA DE VÁO) E ESPUMA DE CONCRETO BEEFACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF. 06/2014	m²	1443,93	4,37	5,62	23.148,28	3.373,88	0,50 %	1443,93	1443,93	1443,93	1443,93	0,00	1443,93	0,00	903,88
6.2	89173 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE EMBOCOSSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRACO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO AF. 12/2014	m²	474,35	37,93	48,80	101.879,42	51.391,46	4,13 %	474,35	474,35	474,35	474,35	0,00	474,35	0,00	903,88
6.3	87273 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS EXTRA DE DIMENSÕES 40X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES AF. 06/2014	m²	93,98	27,90	35,90	3.373,88	101.879,42	7,58 %	93,98	93,98	93,98	93,98	0,00	93,98	0,00	903,88
6.4	87251 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 40X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES AF. 06/2014	m²	869,13	91,10	117,22	51.391,46	27.800,19	4,13 %	869,13	869,13	869,13	869,13	0,00	869,13	0,00	903,88
6.5	84191 SINAPI	PISO EM GRANULITE, MARMORTE OU GRANITINA ESPESURA 8 MM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	m²	887,59	45,00	57,90	101.879,42	27.800,19	4,13 %	887,59	887,59	887,59	887,59	0,00	887,59	0,00	903,88
6.6	96116 SINAPI	FORRO EM REGIÃO DE PVC - FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO AF. 05/2017_P	m²	887,59	22,54	29,00	101.879,42	27.800,19	4,13 %	887,59	887,59	887,59	887,59	0,00	887,59	0,00	903,88
6.7	98679 SINAPI	PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E ÁREA), ACABAMENTO LISO, ESPESURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA AF. 06/2018	m²	963,11	22,54	29,00	101.879,42	27.800,19	4,13 %	963,11	963,11	963,11	963,11	0,00	963,11	0,00	903,88

LEVI LOPES DE ALIVEIRA NETO
RG: 19778777 SSP/AL
CREA 0207052026
RESPONSÁVEL TÉCNICO

Luiz André Portela da S. Filho
Engenheiro Civil
CREA AL 02118578 40

7	8623	ORSE	7.1	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida, lixamento e reboques	2013,55	8,26	10,62	58.843,59	8,67 %					
				APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM	m²			21.383,90	3,16 %	0	0	2.013,55	R\$	R\$
				PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	m²	2013,55	9,60	24.867,34	3,67 %	0	0	2.013,55	R\$	R\$
				TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF_09/2016	m²	708,99	9,99	9.110,52	1,35 %	0	0	708,99	R\$	R\$
				APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	m²	75,52	8,45	820,90	0,12 %	0	0	75,52	R\$	R\$
				Finalize o acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte AF_09/2016	m²	131,46	14,55	2.460,93	0,36 %	0	0	131,46	R\$	R\$
				Finalize o acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte AF_09/2016	m²	131,46	14,55	2.460,93	0,36 %	0	0	131,46	R\$	R\$
				ESQUADRIAS	UN	890,22	890,22	49.340,72	7,28 %	0	0	890,22	R\$	R\$
				KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO MÍDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09/2015	UN	3	672,11	2.594,61	0,38 %	0	0	20,00	R\$	R\$
				KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO MÍDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09/2015	UN	8	716,72	5.733,76	0,85 %	0	0	20,00	R\$	R\$
				KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO MÍDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09/2015	UN	10	630,60	6.306,00	0,93 %	0	0	20,00	R\$	R\$
				KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO MÍDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09/2015	UN	13	171,10	2.224,30	0,33 %	0	0	20,00	R\$	R\$
				Porta em madeira compensada (canelada), lisa, semi-oça, 2,00 x 2,10 m, com duas folhas, inclusive batentes e ferragens	un	2	696,94	1.393,88	0,20 %	0	0	10,00	R\$	R\$
				Porta em madeira compensada (canelada), lisa, semi-oça, 1,50 x 2,10 m, com duas folhas, inclusive batentes e ferragens	un	1	576,66	576,66	0,09 %	0	0	2,00	R\$	R\$
				Folha em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação, puxador e fechadura e material de acabamento	m²	6,3	344,58	403,92	0,06 %	0	0	1,00	R\$	R\$
				JANELA DE ALUMÍNIO MAXIMAR, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA, AF_07/2016	m²	13	171,10	2.224,30	0,33 %	0	0	6,30	R\$	R\$
				JANELA DE ALUMÍNIO MAXIMAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA, AF_07/2016	m²	11,4	296,38	3.379,53	0,50 %	0	0	13,00	R\$	R\$
				PORTÃO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	m²	1,68	395,51	664,45	0,10 %	0	0	13,48	R\$	R\$
				QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	514,33	514,33	0,08 %	0	0	0,00	R\$	R\$
				DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2016	UN	4	9,92	39,68	0,01 %	1	1	0,00	R\$	R\$
				DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2016	UN	2	12,07	24,14	0,00 %	4	4	0,00	R\$	R\$
				DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2016	UN	5	11,10	55,50	0,01 %	2	2	0,00	R\$	R\$
				DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2016	UN	6	11,10	66,60	0,01 %	3	3	0,00	R\$	R\$
				DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2016	UN	6	10,36	62,16	0,01 %	6	6	0,00	R\$	R\$
				Disjuntor termomagnético tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA AF_01/2016	un	1	404,40	404,40	0,06 %	0	0	0,00	R\$	R\$
				Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40KA - 175v	un	1	58,82	58,82	0,01 %	1	1	0,00	R\$	R\$
				Disjuntor bipolar DR 63 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA	un	1	184,39	184,39	0,03 %	1	1	0,00	R\$	R\$
				PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO AF_01/2016	UN	102	118,62	12.099,24	1,77 %	1	1	0,00	R\$	R\$
				Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 vs, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embudo Ø 3/4", incluindo conjunto escop/09a-220v, inclusive aterramento	pl	12	166,66	2.000,00	0,29 %	102	102	0,00	R\$	R\$
				Ponto de telefone, com eletroduto de pvc sanfonado embudo Ø 3/4"	un	1	115,78	115,78	0,00 %	12	12	0,00	R\$	R\$
				LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 18 W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2017	UN	51	74,27	3.787,77	0,05 %	1	1	0,00	R\$	R\$
				Piso de lã em feltro ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado aparente Ø 3/4"	un	98	150,83	14.781,34	0,22 %	0	0	5,00	R\$	R\$
				Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embudido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	pl	32	129,32	4.138,24	0,06 %	98	98	0,00	R\$	R\$
				Ponto de interruptor 02 seções (2 s) embudido com eletroduto de pvc flexível sanfonado embudo Ø 3/4"	pl	4	132,03	528,12	0,01 %	32	32	0,00	R\$	R\$
				LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA, PARA 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2017	UN	3	65,36	196,08	0,00 %	4	4	0,00	R\$	R\$
				LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2017	UN	3	29,00	87,00	0,00 %	4	4	0,00	R\$	R\$
				INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	UN	10	70,26	702,60	0,01 %	0	0	0,00	R\$	R\$
				REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, AF_12/2014	UN	10	70,26	702,60	0,01 %	0	0	0,00	R\$	R\$


LEVI LOPES DE OLIVEIRA NETO
 RG: 197877 SSP/AL
 CREA AL 02118578-40
 RESPONSÁVEL TÉCNICO

Luiz André Porteira da S. Filho
 Engenheiro Civil
 CREA AL 02118578-40

Item	Quantidade	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)	Porcentagem (%)	Medido no Período (R\$)	Valor Total (R\$)
10.2	8957 SINAPI	37	124,81	0,68%	20	2,46
10.3	8685 SINAPI	15	18,73	0,04%	0	0,00
11	8686 SINAPI	39,8	53,01	0,30%	0	0,00
11.1	10759 ORSE	9,87	264,52	0,40%	0	0,00
12	86832 SINAPI	14	382,52	0,50%	0	0,00
12.1	95472 SINAPI	4	588,60	0,37%	14	6,33
12.3	86936 SINAPI	12	218,30	0,45%	0	0,00
12.4	74234001 SINAPI	2	443,84	0,50%	0	0,00
12.5	86936 SINAPI	2	283,43	0,17%	0	0,00
12.6	86910 SINAPI	2	77,68	0,10%	0	0,00
12.7	86915 SINAPI	14	88,26	0,03%	0	0,00
12.8	86912 SINAPI	1	15,84	0,18%	0	0,00
13	9038 ORSE	13,57	54,14	0,00%	0	0,00
13.1	8342 ORSE	18	90,45	2,69%	0	0,00
13.2	1683 ORSE	18	84,50	0,14%	0	0,00
13.3	98107 SINAPI	1	171,81	0,31%	0	0,00
13.4	74166001 SINAPI	10	180,85	0,22%	0	0,00
13.5	89707 SINAPI	22	19,31	0,03%	0	0,00
13.6	98100 SINAPI	1	3,686,78	0,34%	22	0,02
13.7	86864 SINAPI	1	4,452,55	0,08%	0	0,00
13.8	94996 SINAPI	195,5	74,05	0,70%	0	0,00
14	94275 SINAPI	149,36	27,39	0,85%	0	0,00
14.1	92404 SINAPI	51,2	49,84	4,02%	0	0,00
14.2				2,75%		
14.3				0,76%		
				0,49%		
					Medido no Período	R\$ 97.214,68
						R\$ 477.735,2862
						R\$ 198.847,31

Luiz André Portela da S. Filho
Engenheiro Civil
CREA AL 02118578 40

LEVI LOPES VELOSO NETO
RG: 187837 SSP/AL
CREA 0207052026
RESPONSÁVEL TÉCNICO



**Construtora Novo Horizonte
Eireli EPP**

Rua Nossa Senhora
do e 682 salas 02 e
03 Bairro Brasília
Arapiraca Alagoas
CEP 57.313-310

82 3522 2615
construtora.n.h@hot
18.286.438/0001-
43

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

- Revestimento cerâmico Parede/Piso:




Luz André Poffela da S. Filho
Engenheiro Civil
CREA AL 02118578 40

Levi Lopes de O. Neto
Engº Civil 525 TP/AL
RN: 0207052026





Levi Lopes de O. Neto
Engº Civil 525 TP/AL
RN: 0207052026


Luiz Andre Portela da S. Filho
Engenheiro Civil
CREA AL 02118578 40






Levi Lopes de O. Neto
Eng° Civil 525 TP/AL
RN: 0207052026

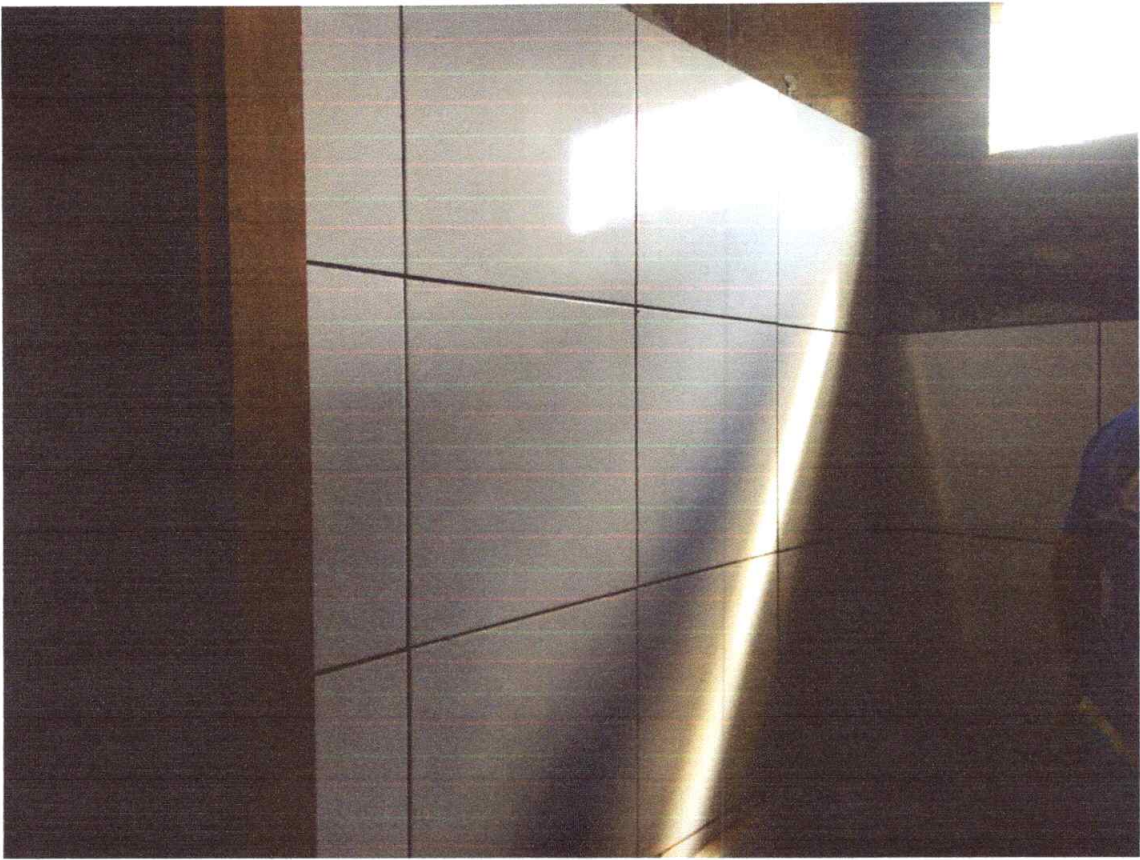

Luiz André Portela da S. Filho
Engenheiro Civil
CREA AL 02118578 40





Levi Lopes de O. Neto
Engº Civil 525 TP/AL
RN: 0207052026

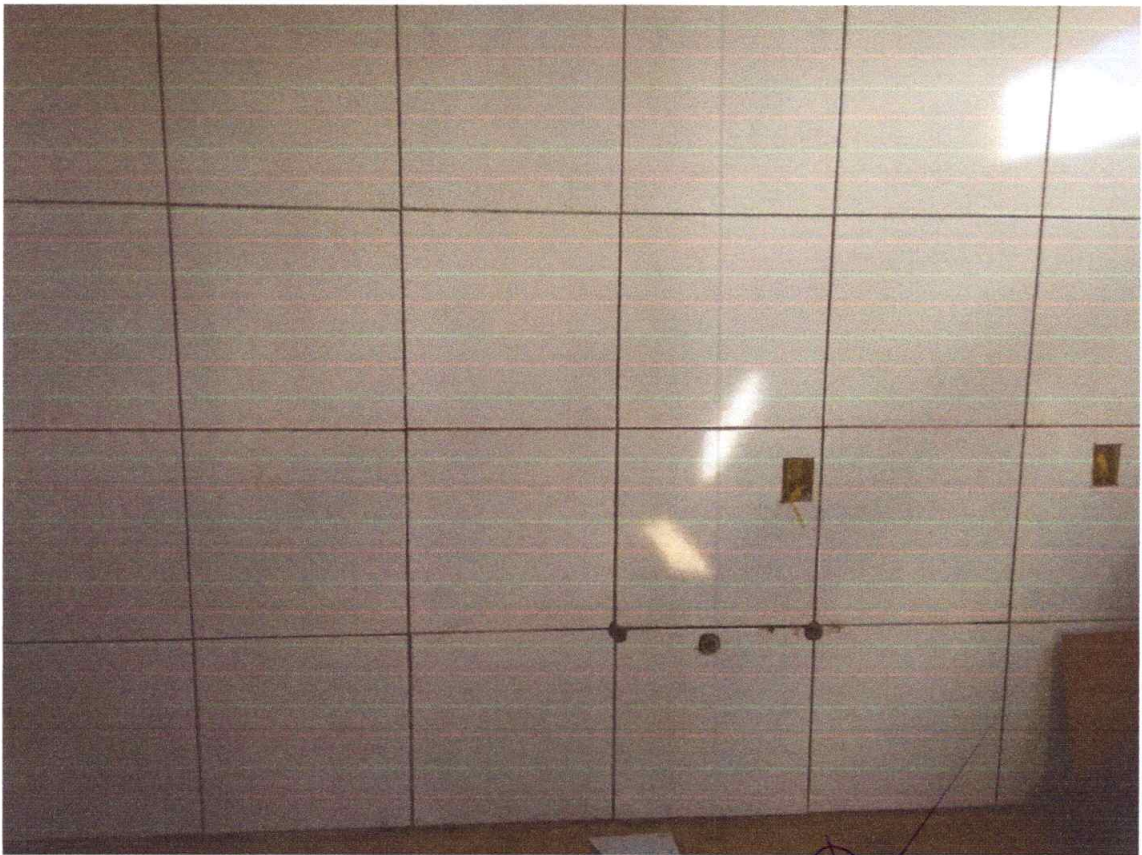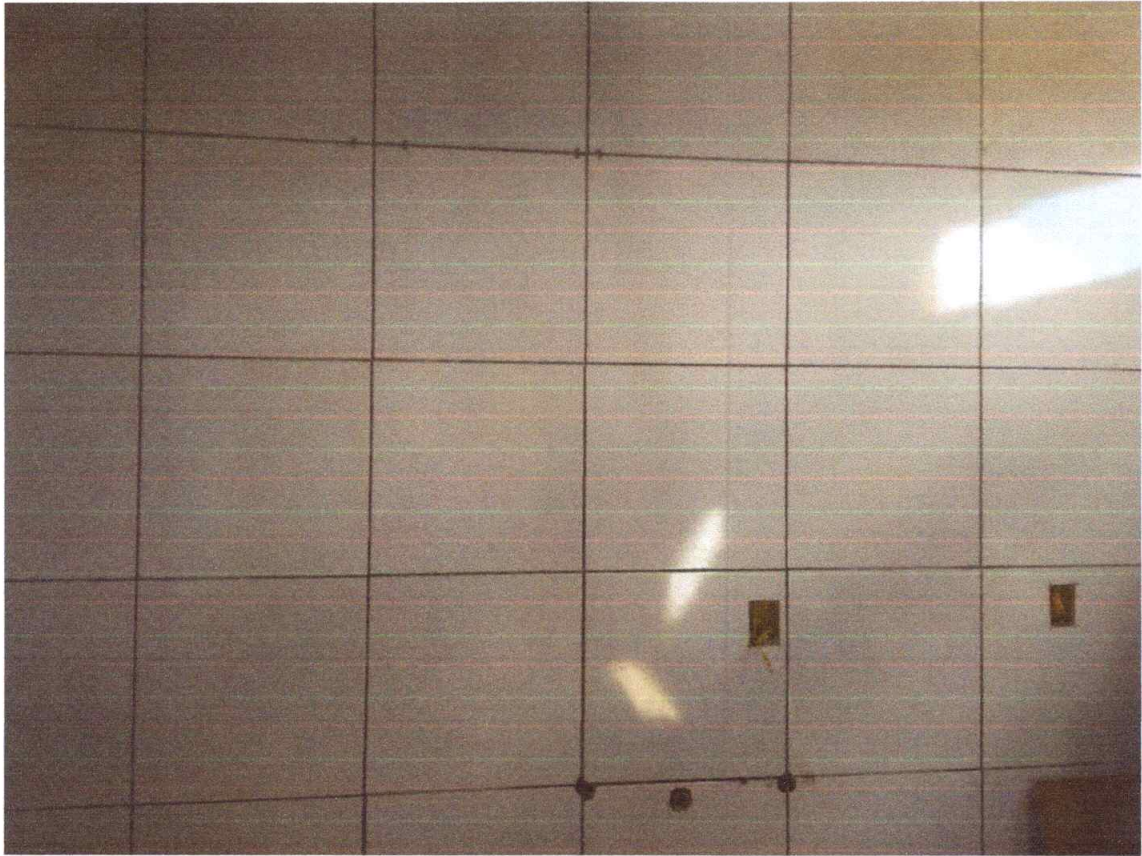

Lutz Andre Portela da S. Filho
Engenheiro Civil
CREA AL 02118578 40




Levi Lopes de O. Neto
Engº Civil 525 TP/AL
RN: 0207052026

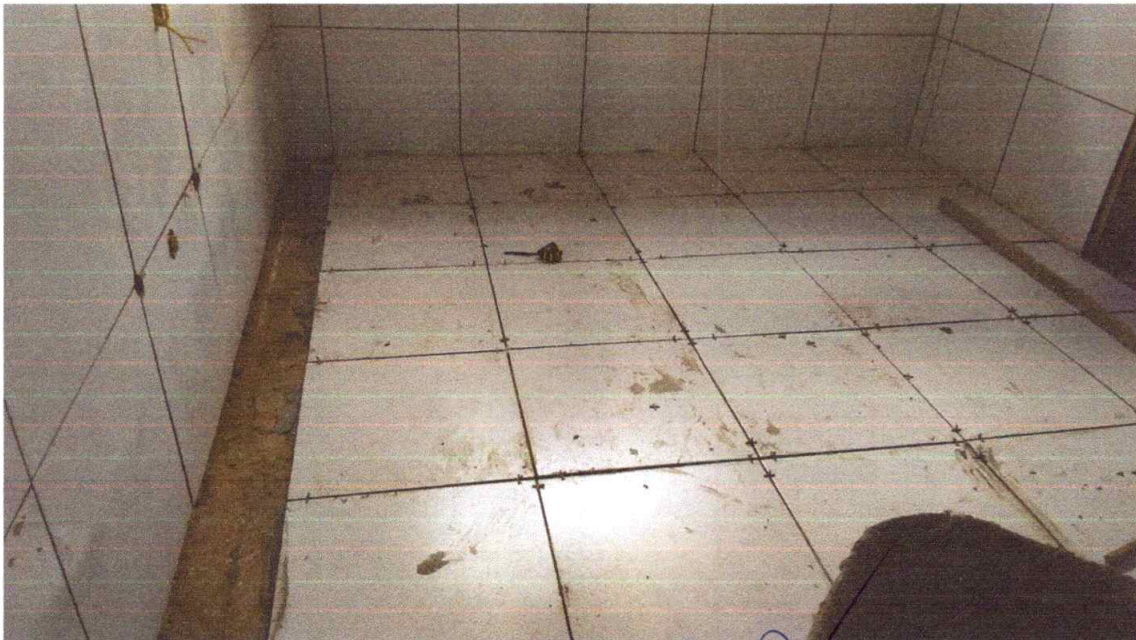
Luiz Andre Portela da S. Filho
Engenheiro Civil
CREA AL 02118578 40





Luiz Andre Portela da S. Filho
Engenheiro Civil
CREA AL 02118578 40


Levi Lopes de O. Neto
Engº Civil 525 TP/AL
FN 0207052026




Levi Lopes de O. Neto
Engº Civil 525 TP/AL
DN: 0207052026



Luiz André Portela da S. Filho
Engenheiro Civil
CREA AL 02118578 40

- Execução de forro em PVC:



Lepi Lopes da O. Neto
Engº Civil F25 TP/AL
RN: 0207052026

Luz André Pottela da S. Filho
Engenheiro Civil
CREA AL 07118578 40

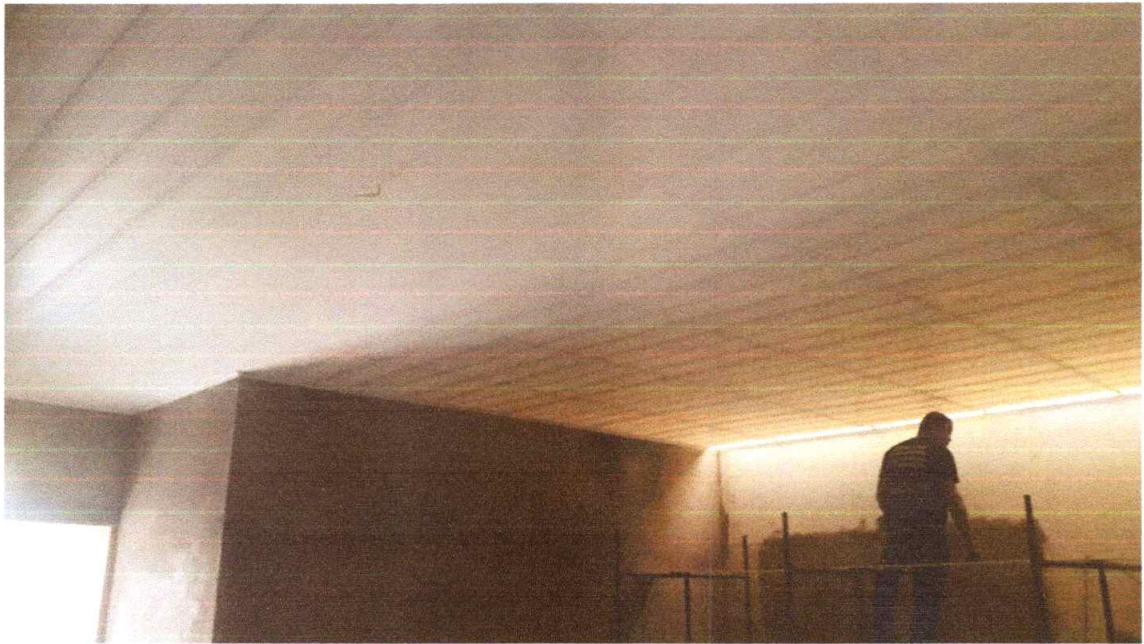


Lúcio Lopes de O. Neto
Engº Civil 525 TP/AL
3307052026


Lutz Andre Portela da S. Filho
Engenheiro Civil
CREA AL 02118578 40




Leon Torres de O. Neto
Engº Civil 525 TP/AL
RN: 0207052026


Luiz André Portela da S. Filho
Engenheiro Civil
CREA AL 02118578 40

DIÁRIO DE OBRAS



DATA:	13/03/2020
NUMERO DO DIÁRIO	120
PRAZO CONTRATUAL (DIAS)	93
DIAS TRABALHADOS	120
SALDO DO PRAZO	-27

construção do centro educacional municipal Padre José Joseth Theisen

INDIRETO		DIRETO		DESCRIÇÃO	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Engenheiro Civil	1	Ajudante	4		
Encarregado	1	Pedreiro	4		
		Carpinteiro			
		Operador de Maquina			
SUBEMPREGATEIROS - Mão de Obra			SUBEMPREGATEIROS -Equipamentos		
		EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
		Vigilância	1		
TOTAL GERAL MÃO DE OBRA					11
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS					0

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS

SOL		NUBLADO		CHUVA	
Manhã	x	Manhã		Manhã	
Tarde	x	Tarde		Tarde	
Noite		Noite		Noite	

Observação:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Execução de piso em granilite

Execução de revestimento cerâmico em paredes internas

COMENTÁRIOS

Assinatura Contratada

Levi Lopes de O. Neto
Engº Civil 515 TPIAL
RN: 037/052026

Assinatura Fiscalização/Supervisão

Luiz André Portela da S. Filho
Engenheiro Civil
CREA AL 02118578 40

DIÁRIO DE OBRAS



DATA:	14/03/2020
NUMERO DO DIÁRIO	121
PRAZO CONTRATUAL (DIAS)	93
DIAS TRABALHADOS	121
SALDO DO PRAZO	-28

construção do centro educacional municipal Padre José Joseth Theisen

MÃO DE OBRA					
INDIRETO			DIRETO		
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Engenheiro Civil	1	Ajudante	4		
Encarregado	1	Pedreiro	4		
		Carpinteiro			
		Operador de Maquina			
SUBEMPREENHEITORES - Mão de Obra			SUBEMPREENHEITORES -Equipamentos		
		EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
		Vigilância	1		
TOTAL GERAL MÃO DE OBRA					11
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS					0

CONDIÇÕES METEOROLOGICAS					
SOL		NUBLADO		CHUVA	
Manhã	x	Manhã		Manhã	
Tarde	x	Tarde		Tarde	
Noite		Noite		Noite	

Observação:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
folga para descanso no fim de semana

COMENTÁRIOS

<p>Assinatura Contratada</p> <p><i>Levi Lopes de O. Neto</i></p> <p>Engº Civil/525 TP/AL RN/0007052026</p>	<p>Assinatura Fiscalização/Supervisão</p> <p><i>Luiz Andre Portela da S. Filho</i></p> <p>Engenheiro Civil CREA AL 02118578 40</p>
---	---

DIÁRIO DE OBRAS



Construtora Novo Horizonte
Eireli EPP



DATA: 15/03/2020

NUMERO DO DIÁRIO 122

PRAZO CONTRATUAL (DIAS) 93

DIAS TRABALHADOS 122

SALDO DO PRAZO -29

construção do centro educacional municipal Padre José Joseth Theisen

MÃO DE OBRA

INDIRETO

DIRETO

DESCRIÇÃO QUANT. DESCRIÇÃO QUANT. DESCRIÇÃO QUANT.

Engenheiro Civil 1 Ajudante 4

Encarregado 1 Pedreiro 4

Carpinteiro

Operador de Máquina

SUBEMPREENTEIROS - Mão de Obra

SUBEMPREENTEIROS -Equipamentos

EMPRESA QUANT

EMPRESA QUANT

Vigilância 1

TOTAL GERAL MÃO DE OBRA 11

TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS 0

CONDIÇÕES METEOROLOGICAS

SOL

NUBLADO

CHUVA

Manhã x Manhã Manhã

Tarde x Tarde Tarde

Noite Noite Noite

Observação:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

folga para descanso no fim de semana

COMENTÁRIOS

Assinatura Contratada

Assinatura Fiscalização/Supervisão

Levi Lopes de Q. Neto
Engº Civil - TP/AL
RNº 0209962026

1.017 André Bartela da S. Filho
Engenheiro Civil
CREA AL 02118578 40

DIÁRIO DE OBRAS



Construtora Novo Horizonte
Eireli EPP



Lagoa da Canoa
Construindo com o povo!

DATA: 16/03/2020

NUMERO DO DIÁRIO 123

PRAZO CONTRATUAL (DIAS) 93

DIAS TRABALHADOS 123

SALDO DO PRAZO -30

construção do centro educacional municipal Padre José Joseth Theisen

MÃO DE OBRA

INDIRETO

DIRETO

DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Engenheiro Civil	1	Ajudante	4		
Encarregado	1	Pedreiro	4		
		Carpinteiro			
		Operador de Máquina			
		SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra		SUBEMPREENHEIROS - Equipamentos	
		EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
		Vigilância	1		
TOTAL GERAL MÃO DE OBRA					11
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS					0

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS

SOL		NUBLADO		CHUVA	
Manhã	x	Manhã		Manhã	
Tarde	x	Tarde		Tarde	
Noite		Noite		Noite	

Observação:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Execução de revestimento cerâmico em paredes internas

COMENTÁRIOS

Assinatura Contratada

Levi Lenzi de O. Neto
Eng.º CIVIL 525 TP/AL
RN: 0207052026

Assinatura Fiscalização/Supervisão

Luiz André Portela da S. Filho
Engenheiro Civil
CREA AL 02118578 40

DIÁRIO DE OBRAS



Construtora Novo Horizonte
Eireli EPP



Prefeitura Municipal de
Lagoa da Canoa
Construindo com o povo!

DATA:

17/03/2020

NUMERO DO DIÁRIO

124

PRAZO CONTRATUAL (DIAS)

93

DIAS TRABALHADOS

124

SALDO DO PRAZO

-31

construção do centro educacional municipal Padre José Joseth Theisen

MÃO DE OBRA

INDIRETO		DIRETO			
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Engenheiro Civil	1	Ajudante	4		
Encarregado	1	Pedreiro	4		
		Carpinteiro			
		Operador de Maquina			
SUBEMPREENHEITORES - Mão de Obra			SUBEMPREENHEITORES -Equipamentos		
		EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
		Vigilância	1		
TOTAL GERAL MÃO DE OBRA					11
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS					0

CONDIÇÕES METEOROLOGICAS

SOL		NUBLADO		CHUVA	
Manhã	Tarde	Manhã	Tarde	Manhã	Tarde
x					
	x				

Observação:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Execução de revestimento cerâmico em paredes internas

COMENTÁRIOS

Assinatura Contratada

Levi Lopes de O. Neto
Eng° Civil 525 TP/AL
RN: 0207052026

Assinatura Fiscalização/Supervisão

Luiz André Portela da S. Filho
Engenheiro Civil
CREA AL 02118578 40

DIÁRIO DE OBRAS



DATA:	18/03/2020
NUMERO DO DIÁRIO	125
PRAZO CONTRATUAL (DIAS)	93
DIAS TRABALHADOS	125
SALDO DO PRAZO	-32

construção do centro educacional municipal Padre José Joseth Theisen

MÃO DE OBRA					
INDIRETO			DIRETO		
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Engenheiro Civil	1	Ajudante	4		
Encarregado	1	Pedreiro	4		
		Carpinteiro			
		Operador de Maquina			
SUBEMPREENHEITORES - Mão de Obra			SUBEMPREENHEITORES -Equipamentos		
		EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
		Vigilância	1		
TOTAL GERAL MÃO DE OBRA					11
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS					0

CONDIÇÕES METEOROLOGICAS					
SOL		NUBLADO		CHUVA	
Manhã	x	Manhã		Manhã	
Tarde	x	Tarde		Tarde	
Noite		Noite		Noite	

Observação:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Execução de revestimento cerâmico em paredes internas

COMENTÁRIOS

Assinatura Contratada

Levi Lopes de O. Neto
Eng. CIV. 525 TP/AL
RN-0107052026

Assinatura Fiscalização/Supervisão

Andre Portela da S. Filho
Engenheiro Civil
CREA AL 02118578 40

DIÁRIO DE OBRAS



Construtora Novo Horizonte
Eireli EPP



Prefeitura Municipal de
Lagoa da Canoa
Construindo com o povo!

DATA:

19/03/2020

NUMERO DO DIÁRIO

126

PRAZO CONTRATUAL (DIAS)

93

DIAS TRABALHADOS

126

SALDO DO PRAZO

-33

construção do centro educacional municipal Padre José Joseth Theisen

MÃO DE OBRA

INDIRETO		DIRETO			
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Engenheiro Civil	1	Ajudante	4		
Encarregado	1	Pedreiro	4		
		Carpinteiro			
		Operador de Maquina			
SUBEMPREENTEIROS - Mão de Obra				SUBEMPREENTEIROS -Equipamentos	
		EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
		Vigilância	1		
TOTAL GERAL MÃO DE OBRA				11	
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS				0	

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS

SOL		NUBLADO		CHUVA	
Manhã	x	Manhã		Manhã	
Tarde	x	Tarde		Tarde	
Noite		Noite		Noite	

Observação:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Execução de revestimento cerâmico em paredes internas

COMENTÁRIOS

Assinatura Contratada

Levi Lopes de O. Neto
Engº Civil 525 TP/AL
RN 0207052026

Assinatura Fiscalização/Supervisão

Lutz Andre Fokela da S. Filho
Engenheiro Civil
CREA AL 02118578 40

DIÁRIO DE OBRAS



**Construtora Novo Horizonte
Eireli EPP**



**Prefeitura Municipal de
Lagoa da Canoa**
Construindo com o povo!

DATA:	20/03/2020
NUMERO DO DIÁRIO	127
PRAZO CONTRATUAL (DIAS)	93
DIAS TRABALHADOS	127
SALDO DO PRAZO	-34

construção do centro educacional municipal Padre José Joseth Theisen

MÃO DE OBRA

INDIRETO		DIRETO			
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Engenheiro Civil	1	Ajudante	4		
Encarregado	1	Pedreiro	4		
		Carpinteiro			
		Operador de Maquina			
SUBEMPREENHEITORES - Mão de Obra			SUBEMPREENHEITORES -Equipamentos		
		EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
		Vigilância	1		
TOTAL GERAL MÃO DE OBRA					11
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS					0

CONDIÇÕES METEOROLOGICAS

SOL		NUBLADO		CHUVA	
Manhã	x	Manhã		Manhã	
Tarde	x	Tarde		Tarde	
Noite		Noite		Noite	

Observação:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Execução de revestimento cerâmico em paredes internas

COMENTÁRIOS

Assinatura Contratada

Levi Lopes de *Neto*
Engº Civil S/CIP/AL
RN: 020700026

Assinatura Fiscalização/Supervisão

Lutz Andre Fortela da S. Filho
Engenheiro Civil
CREA AL 02118578 40

DIÁRIO DE OBRAS



Construtora Novo Horizonte
Eireli EPP



DATA: 21/03/2020

NUMERO DO DIÁRIO 129

PRAZO CONTRATUAL (DIAS) 93

DIAS TRABALHADOS 129

SALDO DO PRAZO -36

construção do centro educacional municipal Padre José Joseth Theisen

MÃO DE OBRA

INDIRETO		DIRETO			
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Engenheiro Civil	1	Ajudante	4		
Encarregado	1	Pedreiro	4		
		Carpinteiro			
		Operador de Maquina			
SUBEMPREENTEIROS - Mão de Obra			SUBEMPREENTEIROS -Equipamentos		
		EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
		Vigilância	1		
TOTAL GERAL MÃO DE OBRA					11
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS					0

CONDIÇÕES METEOROLOGICAS

SOL		NUBLADO		CHUVA	
Manhã		Manhã		Manhã	
	x				
Tarde	x	Tarde		Tarde	
Noite		Noite		Noite	

Observação:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

folga para descanso no fim de semana	

COMENTÁRIOS

Assinatura Contratada
Levi Lopes de A. Neto
Engº Civil 574 TP/AL
RN: 0207082026

Assinatura Fiscalização/Supervisão
Luiz Andre Portela da S. Filho
Engenheiro Civil
CREA AL 02118578 40

DIÁRIO DE OBRASConstrutora Novo Horizonte
Eireli EPPPrefeitura Municipal de
Lagoa da Canoa
Construindo com o povo!

DATA: 22/03/2020

NUMERO DO DIÁRIO 130

PRAZO CONTRATUAL (DIAS) 93

DIAS TRABALHADOS 130

SALDO DO PRAZO -37

construção do centro educacional municipal Padre José Joseth Theisen**MÃO DE OBRA**

INDIRETO		DIRETO			
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Engenheiro Civil	1	Ajudante	4		
Encarregado	1	Pedreiro	4		
		Carpinteiro			
		Operador de Maquina			
		SUBEMPREENHEITORES - Mão de Obra		SUBEMPREENHEITORES -Equipamentos	
		EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
		Vigilância	1		
TOTAL GERAL MÃO DE OBRA					11
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS					0

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS

SOL		NUBLADO		CHUVA	
Manhã	x	Manhã		Manhã	
Tarde	x	Tarde		Tarde	
Noite		Noite		Noite	

Observação:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

folga para descanso no fim de semana

COMENTÁRIOS

Assinatura Contratada

Levi Lopes de O. Neto
Eng° Civil 535 TP/AL
RN: 0207052026

Assinatura Fiscalização/Supervisão

Luiz Andre Portela da S. Filho
Engenheiro Civil
CREA AL 02118578 40

DIÁRIO DE OBRAS



**Construtora Novo Horizonte
Eireli EPP**



DATA: 23/03/2020

NUMERO DO DIÁRIO	131
PRAZO CONTRATUAL (DIAS)	93
DIAS TRABALHADOS	131
SALDO DO PRAZO	-38

construção do centro educacional municipal Padre José Joseth Theisen

MÃO DE OBRA

INDIRETO		DIRETO			
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Engenheiro Civil	1	Ajudante	4		
Encarregado	1	Pedreiro	4		
		Carpinteiro			
		Operador de Maquina			
SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra			SUBEMPREENHEIROS -Equipamentos		
		EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
		Vigilância	1		
TOTAL GERAL MÃO DE OBRA					11
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS					0

CONDIÇÕES METEOROLOGICAS

SOL		NUBLADO		CHUVA	
Manhã	x	Manhã		Manhã	
Tarde	x	Tarde		Tarde	
Noite		Noite		Noite	

Observação:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

revestimento cerâmico em paredes internas
revestimento cerâmico em pisos

COMENTÁRIOS

Assinatura Contratada

Levi Lopes de O. Neto
Engº CIV 525 TP/AL
CNPJ 0707052026

Assinatura Fiscalização/Supervisão

Luiz André Portela da S. Filho
Engenheiro Civil
CREA AL 02118578 40

DIÁRIO DE OBRAS



Construtora Novo Horizonte
Eireli EPP



Prefeitura Municipal de
Lagoa da Canoa
Construindo com o povo!

DATA:	25/03/2020
NUMERO DO DIÁRIO	133
PRAZO CONTRATUAL (DIAS)	93
DIAS TRABALHADOS	133
SALDO DO PRAZO	-40

construção do centro educacional municipal Padre José Joseth Theisen

MÃO DE OBRA

INDIRETO		DIRETO			
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Engenheiro Civil	1	Ajudante	4		
Encarregado	1	Pedreiro	4		
		Carpinteiro			
		Operador de Maquina			
		SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra		SUBEMPREENHEIROS -Equipamentos	
		EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
		Vigilância	1		
TOTAL GERAL MÃO DE OBRA					11
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS					0

CONDIÇÕES METEOROLOGICAS

SOL		NUBLADO		CHUVA	
Manhã		Manhã		Manhã	
	x				
Tarde	x	Tarde		Tarde	
Noite		Noite		Noite	

Observação:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

revestimento cerâmico em paredes internas
revestimento cerâmico em pisos

COMENTÁRIOS

Assinatura Contratada

Levi Lopes de O. Neto
Engº Civil 525 TP/AL
RN: 0207052026

Assinatura Fiscalização/Supervisão

Luiz André Portela da S. Filho
Engenheiro Civil
CREA AL 02118578 40

DIÁRIO DE OBRAS



Construtora Novo Horizonte
Eireli EPP



Prefeitura Municipal de
Lagoa da Canoa
Construindo com o povo!

DATA: 26/03/2020

NUMERO DO DIÁRIO 134

PRAZO CONTRATUAL (DIAS) 93

DIAS TRABALHADOS 134

SALDO DO PRAZO -41

construção do centro educacional municipal Padre José Joseth Theisen

MÃO DE OBRA

INDIRETO		DIRETO			
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Engenheiro Civil	1	Ajudante	4		
Encarregado	1	Pedreiro	4		
		Carpinteiro			
		Operador de Maquina			
SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra				SUBEMPREENHEIROS -Equipamentos	
		EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
		Vigilância	1		
TOTAL GERAL MÃO DE OBRA					11
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS					0

CONDIÇÕES METEOROLOGICAS

SOL		NUBLADO		CHUVA	
Manhã	x	Manhã		Manhã	
Tarde	x	Tarde		Tarde	
Noite		Noite		Noite	

Observação:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

revestimento cerâmico em paredes internas
revestimento cerâmico em pisos

COMENTÁRIOS

Assinatura Contratada
Levi Lopes de O. Neto
Engº CIVIL EPT/AL
RN: 020/052026

Assinatura Fiscalização/Supervisão
Luiz André Portela da S. Filho
Engenheiro Civil
CREA AL 02118578 40

DIÁRIO DE OBRAS



DATA:	27/03/2020
NUMERO DO DIÁRIO	135
PRAZO CONTRATUAL (DIAS)	93
DIAS TRABALHADOS	135
SALDO DO PRAZO	-42

construção do centro educacional municipal Padre José Joseth Theisen

INDIRETO		DIRETO			
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Engenheiro Civil	1	Ajudante	4		
Encarregado	1	Pedreiro	4		
		Carpinteiro			
		Operador de Maquina			
		SUBEMPREGATEIROS - Mão de Obra		SUBEMPREGATEIROS - Equipamentos	
		EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
		Vigilância	1		
TOTAL GERAL MÃO DE OBRA					11
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS					0

CONDIÇÕES METEOROLOGICAS

SOL		NUBLADO		CHUVA	
Manhã	x	Manhã		Manhã	
Tarde	x	Tarde		Tarde	
Noite		Noite		Noite	

Observação:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

revestimento cerâmico em paredes internas
revestimento cerâmico em pisos

COMENTÁRIOS

Assinatura Contratada

Levi Jones de O. Neto
Engº CIVIL 325 TP/AL
CNPJ 0207052026

Assinatura Fiscalização/Supervisão

Luiz André Portela da S. Filho
Engenheiro Civil
CREA AL 02118578 40

DIÁRIO DE OBRAS



**Construtora Novo Horizonte
Eireli EPP**



DATA: 28/03/2020

NUMERO DO DIÁRIO 136

PRAZO CONTRATUAL (DIAS) 93

DIAS TRABALHADOS 136

SALDO DO PRAZO -43

construção do centro educacional municipal Padre José Joseth Theisen

MÃO DE OBRA

CONDIÇÕES METEOROLOGICAS

Observação:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

folga para descanso no fim de semana

COMENTÁRIOS

Assinatura Contratada

Levi Lopes Neto
Eng° Civil 525 TP/AL
RN-0207052026

Assinatura Fiscalização/Supervisão

Luiz André Portela da S. Filho
Engenheiro Civil
CREA AL 02118578 40

DIÁRIO DE OBRAS



Construtora Novo Horizonte
Eireli EPP



DATA: 29/03/2020

NUMERO DO DIÁRIO 137

PRAZO CONTRATUAL (DIAS) 93

DIAS TRABALHADOS 137

SALDO DO PRAZO -44

construção do centro educacional municipal Padre José Joseth Theisen

MÃO DE OBRA

INDIRETO		DIRETO			
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.		
Engenheiro Civil	1	Ajudante	4		
Encarregado	1	Pedreiro	4		
		Carpinteiro			
		Operador de Máquina			
SUBEMPREGADOS - Mão de Obra			SUBEMPREGADOS - Equipamentos		
		EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
		Vigilância	1		
TOTAL GERAL MÃO DE OBRA					11
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS					0

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS

SOL		NUBLADO		CHUVA	
Manhã	x	Manhã		Manhã	
Tarde	x	Tarde		Tarde	
Noite		Noite		Noite	

Observação:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

folga para descanso no fim de semana

COMENTÁRIOS

Assinatura Contratada

Levi Lopes da Q. Neto
 Engº Civil S.A.T.P./AL
 RN- 02070/2026

Assinatura Fiscalização/Supervisão

Lutz André Portela da S. Filho
 Engenheiro Civil
 CREA AL 02118578-40

DIÁRIO DE OBRAS



DATA:	30/03/2020
NUMERO DO DIÁRIO	138
PRAZO CONTRATUAL (DIAS)	93
DIAS TRABALHADOS	138
SALDO DO PRAZO	-45

construção do centro educacional municipal Padre José Joseth Theisen

INDIRETO		DIRETO		DESCRIÇÃO	QUANT.
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.		
Engenheiro Civil	1	Ajudante	4		
Encarregado	1	Pedreiro	4		
		Carpinteiro			
		Operador de Maquina			
SUBEMPREENHEITORES - Mão de Obra				SUBEMPREENHEITORES -Equipamentos	
		EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
		Vigilância	1		
TOTAL GERAL MÃO DE OBRA					11
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS					0

CONDIÇÕES METEOROLOGICAS

SOL		NUBLADO		CHUVA	
Manhã	x	Manhã		Manhã	
Tarde	x	Tarde		Tarde	
Noite		Noite		Noite	

Observação:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

execução de revestimento cerâmico em pisos
assentamento de vasos acoplados

COMENTÁRIOS

Assinatura Contratada

Levi Lopes de O. Neto
Engº CIVIL 025 TP/AL
RN: 0207052026

Assinatura Fiscalização/Supervisão

Luiz André Portela da S. Filho
Engenheiro Civil
CREA AL 02178578 40

DIÁRIO DE OBRAS



DATA:	31/03/2020
NUMERO DO DIÁRIO	139
PRAZO CONTRATUAL (DIAS)	93
DIAS TRABALHADOS	139
SALDO DO PRAZO	-46

construção do centro educacional municipal Padre José Joseth Theisen

INDIRETO		DIRETO			
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Engenheiro Civil	1	Ajudante	4		
Encarregado	1	Pedreiro	4		
		Carpinteiro			
		Operador de Maquina			
SUBEMPREENHEITORES - Mão de Obra			SUBEMPREENHEITORES -Equipamentos		
		EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
		Vigilância	1		
TOTAL GERAL MÃO DE OBRA					11
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS					0

CONDIÇÕES METEOROLOGICAS

SOL		NUBLADO		CHUVA	
Manhã	x	Manhã		Manhã	
Tarde	x	Tarde		Tarde	
Noite		Noite		Noite	

Observação:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

execução de revestimento cerâmico em pisos
 assentamento de vasos acoplados

COMENTÁRIOS

Assinatura Contratada
 Levi Lopes de O. Neto
 Engº Civil 5 TP/AL
 RN: 0207052026

Assinatura Fiscalização/Supervisão
 Luiz Andre Portela da S. Filho
 Engenheiro Civil
 CREA AL 02118578 40

DIÁRIO DE OBRAS



DATA:	01/04/2020
NUMERO DO DIÁRIO	140
PRAZO CONTRATUAL (DIAS)	93
DIAS TRABALHADOS	140
SALDO DO PRAZO	-47

construção do centro educacional municipal Padre José Joseth Theisen

MÃO DE OBRA

INDIRETO		DIRETO		DESCRIÇÃO	QUANT.
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.		
Engenheiro Civil	1	Ajudante	4		
Encarregado	1	Pedreiro	4		
		Carpinteiro			
		Operador de Maquina			
SUBEMPREENTEIROS - Mão de Obra			SUBEMPREENTEIROS -Equipamentos		
		EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
		Vigilância	1		
TOTAL GERAL MÃO DE OBRA					11
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS					0

CONDIÇÕES METEOROLOGICAS

SOL		NUBLADO		CHUVA	
Manhã	x	Manhã		Manhã	
Tarde	x	Tarde		Tarde	
Noite		Noite		Noite	

Observação:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

assentamento de vasos convencionais
rejuntamento de juntas de dilatação

COMENTÁRIOS

Assinatura Contratada

Levi Lopes O. Neto
Engº Civil 025 TP/AL
RN: 0207052026

Assinatura Fiscalização/Supervisão

Luiz Andre Portela da S. Filho
Engenheiro Civil
CREA AL 02118578 40

DIÁRIO DE OBRAS



DATA:	02/04/2020
NUMERO DO DIÁRIO	141
PRAZO CONTRATUAL (DIAS)	93
DIAS TRABALHADOS	141
SALDO DO PRAZO	-48

construção do centro educacional municipal Padre José Joseth Theisen

MÃO DE OBRA					
INDIRETO			DIRETO		
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Engenheiro Civil	1	Ajudante	4		
Encarregado	1	Pedreiro	4		
		Carpinteiro			
		Operador de Maquina			
		SUBEMPREENHEITORES - Mão de Obra		SUBEMPREENHEITORES -Equipamentos	
		EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
		Vigilância	1		
TOTAL GERAL MÃO DE OBRA					11
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS					0

CONDIÇÕES METEOROLOGICAS					
SOL		NUBLADO		CHUVA	
Manhã	x	Manhã		Manhã	
Tarde	x	Tarde		Tarde	
Noite		Noite		Noite	

Observação:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
rejuntamento de juntas de dilatação

COMENTÁRIOS

<p>Assinatura Contratada</p> <p><i>Levi Lopes de O. Neto</i></p> <p>Engº Civil 525 TP/AL RN 0307052026</p>	<p>Assinatura Fiscalização/Supervisão</p> <p><i>André Portela da S. Filho</i></p> <p>1.017 André Portela da S. Filho Engenheiro Civil CREA AL 02118578 40</p>
---	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA
Secretaria Municipal da Fazenda



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://www.e-nfs.com.br/arapiraca , informando o código de verificação.	Código de verificação 1892.405D.3F45	Data/Hora da emissão 07/04/2020 - 09:44:54
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 311

Prestador de Serviços

	CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI NOSSA SENHORA DO Ó, 682,SALA 02 E 03 BRASILIA, Telefone: .	
	CEP 57313310 - ARAPIRACA - AL - BRASIL CPF/CNPJ 18.286.438/0001-43 Email OASISCONSULTORIA@HOTMAIL.COM.BR	Inscrição Municipal 143890 Inscrição Estadual

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA	
CPF/CNPJ	12.207.551/0001-00	
Endereço	PRAÇA VEREADOR BENÍCIO ALVES DE OLIVEIRA, S/N,	
Bairro	CENTRO, Telefone: .	
Cep	57330-000	
Cidade	LAGOA DA CANOA - AL - BRASIL	Inscrição Municipal
Email	sec.transporte.canoa@gmail.com	Inscrição Estadual

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

REFERENTE A 7ª (SÉTIMA) MEDIÇÃO CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL PADRE JOSÉ JOSEPH THEISEN, NO MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA/AL, CONFORME CONTRATO Nº 01 - TP 007/2019, PERÍODO DE EXECUÇÃO 13/03/2020 A 02/04/2020; RECURSO: UNIDADE 08.81 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB; PROJETO ATIVIDADE: 2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%; ELEMENTO DE DESPESA 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES; 50% MATERIAL 50% MÃO DE OBRA DADOS BANCÁRIOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 0056 OPERAÇÃO 003 CONTA 5198-5

Serviço: 7.02-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO E POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS)

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
67.214,58	1,00	0,00	0,00	67.214,58	2,50	1.680,36	67.214,58

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 67.214,58

Retenções

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L.(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN(R\$)	Outras Retenções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
1.680,36	0,00	1.680,36	65.534,22	

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço- Tomador de serviço sem cadastro no NFSE, responsável pelo recolhimento do ISSQN acesse o Portal da Fazenda para emitir a guia.- ISSQN devido pelo Tomador em LAGOA DA CANOA - AL- NFSE é emitida com respaldo da Lei Municipal nº 2.342/2013, alterada por Lei Municipal nº 2.995/2014 e Decreto Municipal 2.217/2010. - Data do vencimento do ISS desta NFSE: 05/05/20- Retenções ISSQN (Retido): 1680,36.

LUIZ Andre Portela da S. Filho
Engenheiro Civil
CREA AL 02118578 40



**ESTADO DE ALAGOAS****FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA**

Praça Vereador Benício Alves de Oliveira, 15 - CENTRO

Lagoa da Canoa - AL

C.N.P.J.: 12.207.551/0000-29

Nota de Empenho

ABRIL/2020

Nota de Empenho 0407002**FORNECEDOR**

Nome: CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI CNPJ/CPF: 18286438000143
 Endereço: R NOSSA SENHORA DO O, 682 Compl: SALA 02 E 03
 Bairro: BRASILIA Cidade: Arapiraca UF: AL
 E-mail: oasisconsultoria@hotmail.com.br Telefone: (82)9968-3635
 PIS/PASEP: RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0881 FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
 Função: 12 Educação
 SubFunção: 361 Ensino Fundamental
 Programa: 0002 EDUCAÇÃO IDEAL BUSCANDO DIVERSIDADE E INCLUSÃO
 Ação: 2023 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%
 Natureza Despesa: 449051000000 Obras e Instalações
 SubElemento: 449051910000 Obras Em Andamento
 Fonte: 025100000 FUNDEF/PRECATÓRIOS
 Centro Custo:

Licitação: Nº 007/2019 - Tomada Preços, Art.22 Inciso II Lei 8.666/93

Processo: Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Ordinário	162.872,12	67.214,58	95.657,54

HISTÓRICO

REFERENTE A 7ª (SÉTIMA) MEDIÇÃO CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL PADRE JOSÉ JOSETH THEISEN, NO MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA - AL

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	1 - Outras Despesas Gerais	UND	1,0000	67.214,5800	67.214,5800


SESSENTA E SETE MIL E DUZENTOS E QUATORZE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS

67.214,58

Data: 07/04/2020

Autorizo o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio


 JOANA DARQUE BEZERRA LIMA ROSENDO
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO Mat.500

PUSKIN VEIGA LAVINAS CORREA DE SA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.3683



Nota de Liquidação: 0407003

Fonte: 025100000 - FUNDEF/PRECATÓRIOS

FORNECEDOR

Nome: CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI CNPJ/CPF: 18286438000143
 Endereço: R NOSSA SENHORA DO O Compl: SALA 02 E 03
 Bairro: BRASILIA Cidade: Arapiraca UF: AL
 E-mail: oasisconsultoria@hotmail.com.br Telefone: (82)9968-3635 RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0881 FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
 Função: 12 Educação
 SubFunção: 361 Ensino Fundamental
 Programa: 0002 EDUCAÇÃO IDEAL BUSCANDO DIVERSIDADE E INCLUSÃO
 Ação: 2023 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%
 Natureza Despesa: 449051000000 Obras e Instalações
 SubElemento: 449051910000 Obras Em Andamento
 Fonte: 025100000 FUNDEF/PRECATÓRIOS
 Centro Custo:

EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0407002	07/04/2020	67.214,58	67.214,58	0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A 7ª (SÉTIMA) MEDIÇÃO CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL PADRE JOSÉ JOSETH THEISEN, NO MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA - AL

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A 7ª (SÉTIMA) MEDIÇÃO CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL PADRE JOSÉ JOSETH THEISEN, NO MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA - AL

Documento

Nota Fiscal (311 / Série: 0 / UF: AL / Emissão: 07/04/2020)

Valor

67.214,58

SUBEVENTO

15 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Conta Débito

13321060100000000 - Obras Em Andamento

Conta Crédito

21311010000000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício

Valor

67.214,58

Função

21881010900000001-ISS - EDUCAÇÃO

Valor

1.680,36

SESSENTA E SETE MIL E DUZENTOS E QUATORZE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS

Total Retido: 1.680,36

Total Liquido: 65.534,22


Data: 07/04/2020

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento de acordo com o Artigo 64 da Lei 4.320/64.


 JOANA DARQUE BEZERRA LIMA ROSENDO
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO Mat.500

PUSKIN VEIGA LAVINAS CORREA DE SA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.3683



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

CERTIDÃO ESTADUAL

FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL E CONCORDATA

CERTIDÃO Nº: 002741118

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Certifico que, pesquisando os registros de distribuição de feitos do Estado de Alagoas, no período de 10 anos, verifiquei NÃO CONSTAR distribuições em nome de:

CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI EPP, residente na RUA NOSSA SENHORA DO Ó, 682, BRASÍLIA, CEP: 57313-310, Arapiraca - AL, vinculado ao CNPJ: 18.286.438/0001-43 *****

Certifico ainda que a pesquisa acima refere-se a AÇÕES DE FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL E CONCORDATA em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado de Alagoas, com as ressalvas abaixo:

Observações:

- 1 - A presente certidão foi emitida de acordo com a Resolução nº. 121/2010 do CNJ;
- 2 - A presente certidão não abrange eventuais ações de FALÊNCIA em que a pessoa a respeito da qual é expedida figure no pólo ativo;
- 3 - Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ;
- 4 - Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, que deverão ser objeto de certidões específicas;
- 5 - A exatidão dos dados pessoais fornecidos para pesquisa é de inteira responsabilidade da parte interessada.
- 6 - A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas (www.tjal.jus.br).

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias.

Maceió, segunda-feira, 30 de março de 2020 às 09h20min.

PEDIDO Nº: 002741118



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 18.286.438/0001-43

Razão Social: CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI

Endereço: R NOSSA SENHORA DO O 682 SL 02 E 03 / BRASÍLIA / ARAPIRACA / AL /
57313-310

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 18/03/2020 a 15/07/2020

Certificação Número: 2020031805273312068357

Informação obtida em 30/03/2020 09:25:11

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 18.286.438/0001-43

Certidão n°: 7393841/2020

Expedição: 30/03/2020, às 10:40:57

Validade: 25/09/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **18.286.438/0001-43**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



Estado de Alagoas
Secretaria de Estado da Fazenda
Superintendência da Receita Estadual

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS

Certidão fornecida para o CNPJ: 18.286.438/0001-43

Nome/Contribuinte: CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir, até a presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos do contribuinte e refere-se a débitos de natureza tributária e descumprimento de obrigações acessórias.

Certidão emitida gratuitamente com base na Instrução Normativa SEF nº. 27 de 15 de maio de 2017.

Certidão emitida nos termos do art. 78 da Lei nº 6.771/06 e do art. 255 do Decreto nº 25.370/13.

Válida até 29/05/2020

Emitida às 09:16:35 do dia 30/03/2020

Código de controle da certidão: ECB1-CA77-DEBA-4FF5

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Executiva da Receita Estadual na internet, no endereço: www.sefaz.al.gov.br.



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA
FAZENDA MUNICIPAL
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS N.º 6116 / 2020

Identificação do Contribuinte

Contribuinte: CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI

CNPJ/CPF: 18.286.438/0001-43

Tipo do Contribuinte

Contribuinte Econômico **Situação Cadastral:** Ativo

Inscrição Municipal: 143890

Identificação: 7344

Endereço: RUA - NOSSA SENHORA DO Ó, Nº: 682, SALA 02 E 03
57.313-310,

Bairro: BRASILIA

Cidade: ARAPIRACA

Complemento do Loteamento:

Certificamos, com fundamento nas informações constantes em nosso Sistema de Cadastro e Controle de Arrecadação, e ressalvado o direito da Fazenda Municipal de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, conforme art. 332 do CTM, com referência ao presente instrumento, que em relação ao contribuinte/imóvel acima identificado **INEXISTE DÉBITO** impeditivo a expedição desta certidão.

De Autenticidade: 37A.720.BB3.126

A autenticidade desta certidão DEVE ser confirmada na pagina da Secretaria de fazenda, no endereço:

<https://arapiraca.abaco.com.br/eagata/portal/>

Certidão emitida as 09:20:07 hs, do dia 30/03/2020 **Validade:29/05/2020**



Observação:



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 18.286.438/0001-43 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 11/06/2013
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE	PORTE EPP
--	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</p> <p>01.61-0-99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente</p> <p>38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos</p> <p>42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias</p> <p>42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais</p> <p>42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas</p> <p>42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica</p> <p>42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação</p> <p>42.22-7-02 - Obras de irrigação</p> <p>42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas</p> <p>43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas</p> <p>43.13-4-00 - Obras de terraplenagem</p> <p>43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica</p> <p>43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás</p> <p>43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração</p> <p>43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio</p> <p>43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente</p> <p>43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material</p> <p>43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque</p> <p>43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral</p> <p>43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores</p>

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO R NOSSA SENHORA DO O	NÚMERO 682	COMPLEMENTO SALA 02 E 03
------------------------------------	---------------	-----------------------------

CEP 57.313-310	BAIRRO/DISTRITO BRASILIA	MUNICÍPIO ARAPIRACA	UF AL
-------------------	-----------------------------	------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO OASISCONSULTORIA@HOTMAIL.COM.BR	TELEFONE (82) 9968-3635/ (82) 8764-1757
--	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 11/06/2013
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 30/03/2020 às 09:42:54 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 18.286.438/0001-43 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 11/06/2013
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.24-8-00 - Transporte escolar 49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal 49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO R NOSSA SENHORA DO O	NÚMERO 682	COMPLEMENTO SALA 02 E 03
------------------------------------	---------------	-----------------------------

CEP 57.313-310	BAIRRO/DISTRITO BRASILIA	MUNICÍPIO ARAPIRACA	UF AL
-------------------	-----------------------------	------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO OASISCONSULTORIA@HOTMAIL.COM.BR	TELEFONE (82) 9968-3635/ (82) 8764-1757
--	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 11/06/2013
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 30/03/2020 às 09:42:54 (data e hora de Brasília).


Página: 2/2



Sistema de Emissão da Ficha Cadastral do Contribuinte - FIC On-Line

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte, Confira os dados de Identificação da Empresa e, se houver qualquer divergência, providencie junto à SEFAZ a sua atualização cadastral.
As informações contidas nesta ficha carecem de verificação junto a SEFAZ para comprovação da idoneidade dos dados contidos.

 Secretaria de Estado da Fazenda de Alagoas - SEFAZ Secretaria Especial da Receita Estadual Superintendência Especial da Receita Estadual Superintendência de Crédito Tributário, Cadastro e Articulação Regional		
NÚMERO CACEAL 244.52538-2 CNPJ/CPF 18.286.438/0001-43	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	INÍCIO DE ATIVIDADE 11/02/2016 OPTANTE PELO SIMPLES ? NÃO
RAZÃO SOCIAL CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI		
NOME DE FANTASIA CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE		
CÓDIGO - DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONOMICA 4120400 - Construção de edifícios (PRINCIPAL) 0161099 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente 4929901 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal 4929902 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional 3811400 - Coleta de resíduos não-perigosos 4211101 - Construção de rodovias e ferrovias 4212000 - Construção de obras-de-arte especiais 4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 4221901 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 4222701 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 4222702 - Obras de irrigação 4292801 - Montagem de estruturas metálicas 4311801 - Demolição de edifícios e outras estruturas 4313400 - Obras de terraplenagem 4321500 - Instalação e manutenção elétrica 4322301 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 4322302 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 4322303 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 4329199 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente 4330402 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 4330403 - Obras de acabamento em gesso e estuque 4330404 - Serviços de pintura de edifícios em geral 4330405 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 4330499 - Outras obras de acabamento da construção 4391600 - Obras de fundações 4399101 - Administração de obras 4399102 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 4399103 - Obras de alvenaria 4399105 - Perfuração e construção de poços de água 4399199 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 7719599 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 7711000 - Locação de automóveis sem condutor 7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 4923002 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 4924800 - Transporte escolar		
CÓDIGO - DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 134 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)		
LOGRADOURO R NOSSA SENHORA DO O	NÚMERO 682	COMPLEMENTO SALA 02 E 03
CEP 57313-310	BARRIO/DISTRITO BRASILIA	MUNICÍPIO ARAPIRACA
UF AL		
SITUAÇÃO CADASTRAL BAIXADA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 30/3/2020	
ENDEREÇO ELETRÔNICO OASISCONSULTORIA@HOTMAIL.COM.BR		

Data de Emissão: **Segunda, 30 de Março de 2020, às 09:36:05** (data e hora de Brasília).

Para qualquer sugestão ligar para:



Informações: Call Center Sefaz - 0800 284 1060

2000 - 2020 @SUTI WEB - © Superintendência de Tecnologia da Informação - SEFAZ/AL



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI
CNPJ: 18.286.438/0001-43

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:45:08 do dia 18/02/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/08/2020.

Código de controle da certidão: **9E93.16D5.E489.9E9A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/03/2020 - 10:23:47

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI				02-DDD/TELEFONE (0082)35212902
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 29.369,76	06-QTDE TRABALHADORES 24	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 18.286.438/0001-43	11-COMPETÊNCIA 02/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.349,58	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.349,58
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2020

85800000232 495801802000 307638180810 828643800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CEF00550603200580754001554

2.349,58RD1012

SEFIP 8.40 TAB. 40,0 DATA: 03/03/2020 HORA: 10:23:47

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI

NOSSA SENHORA DO O 682

BRASILIA

57313-310

ARAPIRACA

AL

(0082) 35212902

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

CEF00560603200690784001576

11.295,44RD1012

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 02/2020

5 - IDENTIFICADOR 18.286.438/0001-43

6 - VALOR DO INSS (+) 9.480,44

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 1.815,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 11.295,44

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

N. IN: 128643800143 COD. PAR: 2100 CONF: 02020

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIF 8.40 (14/13/2017)

DATA: 03/03/2020
HORA: 10:23:47
FÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI
COMPETÊNCIA: 02/2020

CÓD REC: 150

FPAS: 507

INSCRIÇÃO: 18.286.438/0001-43
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

24

REMUNERAÇÃO

29.369,76

DEPÓSITO

2.349,58

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

2.349,58

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2020

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

DATA: 03/03/2020
 HORA: 10:23:47
 PÁG : 001/001

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 40.0 (12/02/2020)

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 02/2020

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	DEB FPAS	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DEB FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI	7.197,44	1.815,00	18.286.438/0001-43	0,00	0,00	2100	507
2.503,41			220,41			11.295,44	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 40.0 (12/02/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/03/2020
 HORA: 10:23:47
 PÁG: 0001/0016

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858000000232 495801802000 307638180810 828643800019

EMPRESA: CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI
 COMP: 02/2020 COD REC:150 COD GPS:2100
 TOMADOR/OBRA: CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI

EMPRESA:	COMP:	TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:	FAP:	RAT AJUSTADO:	INSCRIÇÃO:	CBO
CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI	02/2020	CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI	18.286.438/0001-43	1,00	3,00	18.286.438/0001-43	JAM
EMPREGADO:	RECEITA:	RENTES:	INSCRIÇÃO:	DATA:	DEPÓSITO:	INSCRIÇÃO:	CBO
CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI	02/2020	02/2020	18.286.438/0001-43	02/05/2019	132,74	18.286.438/0001-43	05173
CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI	02/2020	02/2020	18.286.438/0001-43	02/05/2019	134,46	18.286.438/0001-43	05173
CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI	02/2020	02/2020	18.286.438/0001-43	30/01/2020	122,88	18.286.438/0001-43	07152
CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI	02/2020	02/2020	18.286.438/0001-43	13/01/2020	86,96	18.286.438/0001-43	07170
CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI	02/2020	02/2020	18.286.438/0001-43	13/12/2019	86,96	18.286.438/0001-43	07170
CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI	02/2020	02/2020	18.286.438/0001-43	20/11/2019	122,88	18.286.438/0001-43	07152
CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI	02/2020	02/2020	18.286.438/0001-43	20/11/2019	86,96	18.286.438/0001-43	07170
CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI	02/2020	02/2020	18.286.438/0001-43	13/01/2020	122,88	18.286.438/0001-43	07152
CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI	02/2020	02/2020	18.286.438/0001-43	20/11/2019	86,96	18.286.438/0001-43	07170
CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI	02/2020	02/2020	18.286.438/0001-43	20/11/2019	122,88	18.286.438/0001-43	07152
CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI	02/2020	02/2020	18.286.438/0001-43	13/12/2019	115,27	18.286.438/0001-43	07155
CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI	02/2020	02/2020	18.286.438/0001-43	06/01/2020	86,96	18.286.438/0001-43	07170

EMPREGADO:	RECEITA:	RENTES:	INSCRIÇÃO:	DATA:	DEPÓSITO:	INSCRIÇÃO:	CBO
CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI	02/2020	02/2020	18.286.438/0001-43	02/05/2019	132,74	18.286.438/0001-43	05173
CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI	02/2020	02/2020	18.286.438/0001-43	02/05/2019	134,46	18.286.438/0001-43	05173
CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI	02/2020	02/2020	18.286.438/0001-43	30/01/2020	122,88	18.286.438/0001-43	07152
CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI	02/2020	02/2020	18.286.438/0001-43	13/01/2020	86,96	18.286.438/0001-43	07170
CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI	02/2020	02/2020	18.286.438/0001-43	13/12/2019	86,96	18.286.438/0001-43	07170
CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI	02/2020	02/2020	18.286.438/0001-43	20/11/2019	122,88	18.286.438/0001-43	07152
CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI	02/2020	02/2020	18.286.438/0001-43	20/11/2019	86,96	18.286.438/0001-43	07170
CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI	02/2020	02/2020	18.286.438/0001-43	13/01/2020	122,88	18.286.438/0001-43	07152
CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI	02/2020	02/2020	18.286.438/0001-43	20/11/2019	86,96	18.286.438/0001-43	07170
CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI	02/2020	02/2020	18.286.438/0001-43	20/11/2019	122,88	18.286.438/0001-43	07152
CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI	02/2020	02/2020	18.286.438/0001-43	13/12/2019	115,27	18.286.438/0001-43	07155
CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI	02/2020	02/2020	18.286.438/0001-43	06/01/2020	86,96	18.286.438/0001-43	07170

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 40.0 (12/02/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/03/2020
 HORA: 10:23:47
 PÁG: 0002/0016

RELACÃO DOS TRABALHADORES COM GREF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000232 495801802000 307638180810 828643800019

EMPRESA: CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI
 COMP: 02/2020 COD REC: 150 COD GFS: 2100
 TOMADOR/OPERA: CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GFS	FPAS	507	OUTRAS ENT	0079	SIMPLES	1	RAT	3.0	INSCRIÇÃO	18.286.438/0001-43
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
GERALDO BATISTA DOS SANTOS	870,40	256,00	125.91706.93-1			20/11/2019	01			17/02/2020	I3	07152	
JOSE BISPO DA SILVA	615,97	181,17	125.56994.85-3			20/11/2019	01			17/02/2020	I3	07170	
			181,17			63,76				0,00		0,00	

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 437,17 437,17 1.462,65 1.308,79 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 40.0 (12/02/2020)

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/03/2020
 HORA: 10:23:47
 PÁG: 0003/0016

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858000000232 495801802000 307638180810 828643800019

EMPRESA: CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI
 COMP: 02/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA: CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI
 N° DE CONTROLE: G1Z82KHNDLZ0000-7
 N° ARQUIVO: Pvh6DNL0bxi0000-2
 INSCRIÇÃO: 18.286.438/0001-43
 FAP: 1.00 PAT AJUSTADC: 3.00
 INSCRIÇÃO: 18.286.438/0001-43
 LOGRADUORO: NOSSA SENHORA DO O 682
 UF: AL
 CEP: 57313-310
 BAIRRO: BRASILIA
 CNAE PREPONDERANTE: 4120400
 CNAE: 4120400
 CIDADE: APAFIRACA

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	14	16.359,97	0,00	17.846,34	437,17
TOTALS:	14	16.359,97	0,00	17.846,34	437,17

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - NTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 40.0 (12/02/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/03/2020
 HORA: 10:23:47
 PAG: 0004/0016

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI
 COMP: 02/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA: CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI
 LOGRADOURO: NOSSA SENHORA DO O 682
 CIDADE: APAFIRACA

UF: AL CEP: 57313-310 BAIRRO: BRASILIA CNAE: 4120400
 TELEFONE: 0082 3521 2902 CNAE: 4120400

FFAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 PAT: 3.0
 N° DE CONTROLE: G1Z82kbND1z0000-7

N° ARQUIVO: Fvb6DNL0bx10000-2
 INSCRIÇÃO: 18.286.438/0001-43
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
 INSCRIÇÃO: 18.286.438/0001-43

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 6.631.05 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.462.65
 SALÁRIO FAMÍLIA: 97.24 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
 PERÍODO INICIAL: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00
 VALOR ABATIDO: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
 VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
 15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	2	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 40.0 (12/02/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/03/2020
 HORA: 10:23:47
 PAG: 0005/0016

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000232 495801802000 307638180810 828643800019

EMPRESA: CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI COMP: 02/2020 COD REC:150 COD GPS: 2100 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUN DE SAO MIGUEL DOS CAMPOS	FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079	SIMPLES: 1 FAT: 3.0	INSCRIÇÃO: 18.286.438/0001-43 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00 INSCRIÇÃO: 900005707079			
NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA CONTRIB SEG DEVIDA	CAT OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CRC JAM
DANIEL DOS SANTOS DE MENDONCA 1.087,00	0,00	160.15519,10-0 0,00	19/05/2019 86,96	01		07170 0,00
DOMICIO SALUSTIANO DA SILVA 1.087,00	0,00	106.37374,19-0 0,00	19/05/2019 86,96	01		07170 0,00
FELIPE DA SILVA ALCANTARA 1.087,00	0,00	161.65531,62-9 0,00	19/05/2019 86,96	01		07170 0,00
LENILSON DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA 1.536,00	0,00	123.77291,88-2 0,00	19/05/2019 122,88	01		07152 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 4.797,00 0,00 383,76 383,77 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 40.0 (12/02/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/03/2020
 HORA: 10:23:47
 PAG: 0006/0016

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858000000232 495801802000 307638180810 828643800019

EMPRESA: CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI
 COMP: 02/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUN DE SAO MIGUEL DOS CAMPOS
 LOGRADUORO: NOSSA SENHORA DO O 682
 CIDADE: ARAPIRACA

UF: AL
 CEP: 57313-310
 BAIRRO: BRASILLIA

Nº ARQUIVO: FvhdNl0bx10000-2
 INSCRIÇÃO: 18.286.438/0001-43
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADC: 3.00
 INSCRIÇÃO: 900005707079
 CNAE PREPONDERANTE: 4120400
 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13 ^o	REMUNERAÇÃO 13 ^o	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13 ^o PREV SOC
01	4	4.797,00	0,00	4.797,00	0,00
TOTALS:	4	4.797,00	0,00	4.797,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 40.0 (12/02/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/03/2020
HORA: 10:23:47
PÁG: 0007/0016

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI
COMP: 02/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUN DE SAO MIGUEL DOS CAMPOS
LOGRADOURO: NOSSA SENHORA DO C 682
CIDADE: ARAPIPACA

FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
Nº DE CONTROLE: FmpBfivaJKL0000-2
BAIRRO: BRASILIA
CEP: 57313-310 TELEFONE: 0082 3521 2902

Nº ARQUIVO: Fvh5DNL0bxi0000-2
INSCRIÇÃO: 18.286.438/0001-43
FAP: 1.00 FAF AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO: 900005707079
CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.765.29 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 383.76
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
PERÍODO INICIAL: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 25 ANOS: 0.00
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

DATA: 03/03/2020
 HORA: 10:23:47
 PAG: 0008/0016

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 40.0 (12/02/2020)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000232 495801802000 307638180810 828643800019

EMPRESA: CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI
 COMP: 02/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OPERA: POSTO DE SAUDE

EMPRESA:	INSCRIÇÃO:	FAP:	RAT AJUSTADO:	CHG		
CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI	18.286.438/0001-43	1.00	3.00	JAM		
TOMADOR/OPERA:	INSCRIÇÃO:					
POSTO DE SAUDE	900006110571					
NOME TRABALHADOR	RECEITA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEFÓSITO	CHG
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	ADMISSÃO	CONTRIB	SEG DEVIDA	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL FREV SOCIAL
ANTONIO RAIMUNDO DA SILVA AMORIM	0,00	19/05/2019	01	122,88	122,89	07102
1.536,00	0,00	19/05/2019	01	122,88	122,89	0,00
BRUNO RAFAEL SANTOS DE ALMEIDA	0,00	01/11/2019	01	83,12	83,12	04110
1.039,00	0,00	19/05/2019	01	113,44	113,44	0,00
DJALMA SALUSTIANO DA SILVA	0,00	19/05/2019	01	86,96	86,96	07155
1.418,00	0,00	19/05/2019	01	86,96	86,96	0,00
ELSON DE OLIVEIRA SILVA	0,00	19/05/2019	01	86,96	86,96	07170
1.087,00	0,00	19/05/2019	01	86,96	86,96	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 406,40 406,41 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 40.0 (12/02/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/03/2020
 HORA: 10:23:47
 PAG : 0009/0016

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA
 858000000232 495801802000 307638180810 828643800019

EMPRESA: CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI
 COMP: 02/2020 COD REC: 150 COD GFS: 2100
 TOMADOR/OBRA: POSTO DE SAUDE
 LOGRADOURO: NOSSA SENHORA DO O 682
 CIDADE: ARAPIRACA
 UF: AL CEP: 57313-310
 BAIRRO: BRASÍLIA
 N° DE CONTROLE: MacE01e0tqu0000-3
 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
 FPAS: 507
 N° ARQUIVO: Pvh6DNL0bxi0000-2
 INSCRIÇÃO: 18.286.438/0001-43
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
 INSCRIÇÃO: 900006110571
 CNAE PREPONDERANTE: 4120400
 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	4	5.080,00	0,00	5.080,00	0,00
TOTAIS:	4	5.080,00	0,00	5.080,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 40.0 (12/02/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/03/2020
 HORA: 10:23:47
 PÁG: 0010/0016

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI
 COMP: 02/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA: POSTO DE SAUDE
 LOGRADOURO: NCSA SENHORA DO C 682
 CIDADE: ARAPIRACA

UF: AL CEP: 57313-310 BAIRRO: BRASILIA TELEFONE: 0082 3521 2902 CNAE: 4120400

Nº DE CONTROLE: Ma0E1e0tQ0000-3
 N° DE CONTROLE: Ma0E1e0tQ0000-3

FFAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
 N° ARQUIVO: Evh6DNLObxi0000-2
 INSCRIÇÃO: 18.286.438/0001-43
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
 INSCRIÇÃO: 900006110571
 CNAE PREPONDERANTE: 4120400
 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.772.20 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 406.40
 SALÁRIO FAMÍLIA: 97.24 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO FJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
 PERÍODO INICIAL: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00
 VALOR ABATIDO: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
 VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA
 15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0 0 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	F :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 40.0 (12/02/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/03/2020
 HORA: 10:23:47
 PAG: 0011/0016

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000232 495801802000 307638180810 828643800019

EMPRESA: CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI	INSCRIÇÃO: 18.286.438/0001-43									
COMP: 02/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2100	FAP: 1.00	RAT AJUSTADO: 3.00								
TOMADOR/OBRA: CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI	INSCRIÇÃO: 900028568070									
NOME TRABALHADOR	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO				
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	CONTRIB SEG DEVIDA	CONTRIB SOC	BASE CÁL 13º SAL PREV SOCIAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	OUTRAS ENT: 0079	SIMPLES: 1	RAT: 3.0	INSCRICÃO: 18.286.438/0001-43
CLAYTON LUCAS DOS SANTOS DE ANDRADE	579,73	0,00	206.38149,73-2	15/02/2020	01	46,37	0,00	0,00	0,00	07170
JHONATHAN HENRIQUE DA SILVA	640,00	0,00	201.13116,48-3	15/02/2020	01	51,20	0,00	0,00	0,00	07243
JOSE CICERO DE ALCANTARA	1.333,33	0,00	123.74111,29-8	15/02/2020	01	106,66	0,00	0,00	0,00	07102
RODOLFO MARQUES DO NASCIMENTO	579,73	0,00	203.61050,72-5	15/02/2020	01	46,37	0,00	0,00	0,00	07170

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 3.132,79 0,00 250,60 250,61 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 40.0 (12/02/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/03/2020
 HORA: 10:23:47
 PÁG: 0012/0016

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 853000000232 495801802000 307638180810 828643800019

EMPRESA: CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI
 COMP: 02/2020 COD REC:150 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA: CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI
 LOGRADOURO: NOSSA SENHORA DO O 682
 CIDADE: ARAPIRACA

UF: AL CEP: 57313-310 BAIRRO: BRASILIA
 N° DE CONTROLE: LdeMgZDbuCe0000-0
 N° ARQUIVO: FvH6DNL0bxi0000-2
 INSCRIÇÃO: 18.286.438/0001-43
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
 INSCRIÇÃO: 900028568070
 CNAE PREPONDERANTE: 4120400
 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	4	3.132,79	0,00	3.132,79	0,00
TOTALS:	4	3.132,79	0,00	3.132,79	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 40.0 (12/02/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/03/2020
HORA: 10:23:47
PAG: 0013/0016

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI
COMP: 02/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA: CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI
LOGRADOURO: NOSSA SENHORA DO O 682
CIDADE: ARAPIRACA

EPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
N° DE CONTROLE: Ldemq2DbuCe0000-0
BAIRRO: BRASÍLIA
CEP: 57313-310 TELEFONE: 0082 3521 2902
CNAE: 4120400

N° ARQUIVO: Evh6DNLOBx10000-2
INSCRIÇÃO: 18.286.438/0001-43
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO: 900028568070
CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.126.90 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 250.60
SALÁRIO FAMÍLIA: 25.93 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 40.0 (12/02/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/03/2020
 HORA: 10:23:47
 PAG: 0014/0016

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

85800000C232 495801802000 307638180810 828643800019

EMPRESA: CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI
 COMP: 02/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBEA:
 LOGRADOURO: NOSSA SENHORA DO C 682
 CIDADE: APAPIRACA

Nº DE CONTROLE: D995JRN0Cy10000-3
 Nº ARQUIVO: Pvh6DNL0Bxi0000-2
 INSCRIÇÃO: 18.286.438/0001-43
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
 INSCRIÇÃO:
 CNAE PREPONDERANTE: 4120400
 CNAE: 4120400

UF: AL
 CEP: 57313-310
 BAIRRO: BRASILLIA

FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	26	30.856,13	437,17	30.856,13	437,17
TOTALS:	26	30.856,13	437,17	30.856,13	437,17

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 40.0 (12/02/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/03/2020
HORA: 10:23:47
PÁG: 0015/0016

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS 858000000232 495801802000 307638180810 828643800019

EMPRESA: CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI
COMP: 02/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: NOSSA SENHORA DO O 682
CIDADE: ARAPIRACA
UF: AL CEP: 57313-310 BAIRRO: BRASILIA
CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CNAE: 4120400

Nº DE CONTROLE: D99JURN0CY10000-3
Nº ARQUIVO: Pvh6DNL0bxi0000-2
INSCRIÇÃO: 18.286.438/0001-43
INSCRIÇÃO:
FAP: 1.00 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 PAT: 3.0
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00

MODALIDADE : "BIRACO" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 29.369,76
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00
FGTS - 8%

QUANTIDADE TRABALHADORES 24

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.349,58	0,00	0,00	0,00	2.349,58

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2020

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 40.0 (12/02/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

DATA: 03/03/2020
 HORA: 10:23:47
 PÁG: 0016/0016

Nº ARQUIVO: Pvh6DNL0bxi0000-2
 INSCRIÇÃO: 18.286.438/0001-43
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: Dsg9JRN0Cy10000-3
 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0

EMPRESA: CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI
 COMP: 02/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

CNAE PREPONDERANTE: 4120400
 CNAE: 4120400

BAIRRO: BRASÍLIA
 TELEFONE: 0082 3521 2902

LOGRADOURO: NOSSA SENHORA DO G 682
 CIDADE: APARIPACÁ

UF: AL CEP: 57313-310
 VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 11.295.44 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.503.41
 SALÁRIO FAMÍLIA: 220.41 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 COM SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO
 PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
 VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA
 15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	2	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000000232 495801802000 307638180810 828643800019

EMPRESA:CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI INSCRIÇÃO: 18.286.438/0001-43 N° ARQUIVO: Pvh6DNL0bxi0000-2
 FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAF: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 02/2020 N° CONTROLE: DsggJRN0Cy10000-3
 TOMADOR/OBRA : CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI INSCRIÇÃO: 18.286.438/0001-43 N° CONTROLE: G1Z82khND1z0000-7
 LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
 NOSSA SENHORA DO O 682 BRASÍLIA ARAPIRACA 57313310 AL

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	17.846,34	REM SEM 13° SALÁRIO	16.359,97
REM BASE CALC 13° SAL	437,17	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	1.308,79
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	14	TOTAL TRABALHADORES	12

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	17.846,34	REM SEM 13° SALÁRIO	16.359,97
REM BASE CALC 13° SAL	437,17	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	1.462,65	DEPÓSITO	1.308,79
VAL DEVIDO PREV SOC	6.631,05	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	14	TOTAL TRABALHADORES	12

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

8580000000232 495801802000 307638180810 828643800019

N° ARQUIVO: Pvh6DNL0bxi0000-2 N° ARQUIVO: Pvh6DNL0bxi0000-2
 EMPRESA: CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI INSCRIÇÃO: 18.286.438/0001-43 N° CONTROLE: DsggJRN0Cy10000-3 N° CONTROLE: DsggJRN0Cy10000-3
 FAPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 PAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 02/2020
 TOMADOR/OBRA : PREFEITURA MUN DE SAO MIGUEL DOS CAMPOS INSCRIÇÃO: 900005707079 N° CONTROLE: FmpBfFvaJKL0000-2 N° CONTROLE: FmpBfFvaJKL0000-2
 LOGRADOURO BAIRRO CIDADE
 PREFEITO MOACIR CAVALCANTE CENTRO SAO MIGUEL DOS CEPS 57240042 UFSAL AL

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	4.797,00	REM SEM 13° SALÁRIO	4.797,00
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	383,77
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	4	TOTAL TRABALHADORES	4

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	4.797,00	REM SEM 13° SALÁRIO	4.797,00
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	383,76	DEPÓSITO	383,77
VAL DEVIDO PREV SOC	1.765,29	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	4	TOTAL TRABALHADORES	4

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000000232 495801802000 307638180810 828643800019

EMPRESA: CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI INSCRIÇÃO: 18.286.438/0001-43 N° ARQUIVO: Fvh6DNL0bxi0000-2
 FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 02/2020 N° CONTROLE: Dsg9JRN0Cy10000-3
 TOMADOR/OBRA : POSTO DE SAUDE INSCRIÇÃO: 900006110571 N° CONTROLE: Ma0E0IeoTqU0000-3
 LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
 CENTENARIO CENTRO SAO MIGUEL DOS 57240018 AL

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES FGTS - 8%

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13° SALÁRIO	5.080,00	REM SEM 13° SALÁRIO	5.080,00
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	406,41
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	4	TOTAL TRABALHADORES	4

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO	5.080,00	REM SEM 13° SALÁRIO	5.080,00
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	406,40	DEPÓSITO	406,41
VAL DEVIDO PREV SOC	1.772,20	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	4	TOTAL TRABALHADORES	4

RELACÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000000232 495E01802000 307638180810 828643800019

EMPRESA: CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI INSCRIÇÃO: 18.286.438/0001-43 N° ARQUIVO: Fvh6DNL0bx10000-2
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 02/2020 N° CONTROLE: Dsg9JRN0CY10000-3
TOMADOR/OBRA : CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI INSCRIÇÃO: 900028568070 N° CONTROLE: LdeMq2DbuCe0000-0
LOGRADOURO BAIRO CIDADE CEP UF
PEDRO FERNANDES CENTRO SAO MIGUEL DOS 57240970 AL

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES FGTS - 8%

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13° SALÁRIO	3.132,79	REM SEM 13° SALÁRIO	3.132,79
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	250,61
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	4	TOTAL TRABALHADORES	4

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO	3.132,79	REM SEM 13° SALÁRIO	3.132,79
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	250,60	DEPÓSITO	250,61
VAL DEVIDO PREV SOC	1.126,90	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	4	TOTAL TRABALHADORES	4

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000000232 495801802000 307638180810 828643800019

EMPRESA: CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI INSCRIÇÃO: 18.286.438/0001-43 N° ARQUIVO: Pvh6DNL0bxi0000-2
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 02/2020 N° CONTROLE: DsggJRN0CY10000-3

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA
REM SEM 13° SALÁRIO 30.856,13
REM BASE CALC 13° SAL 437,17
CONTR SEGURADOS DEVIDA 2.503,41
VAL DEVIDO PREV SOC 11.295,44

TOTAL TRABALHADORES 26

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 29.369,76
REM 13° SALÁRIO 0,00
DEPÓSITO 2.349,58
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 24

TOTAL A RECOLHER 2.349,58

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 40.0 (12/02/2020)

DATA: 03/03/2020
HORA: 10:23:47
PÁG.: 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E À OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

EMPRESA: CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI
COMP: 02/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SÍMBOLOS: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAT AJUSTADO: 3,00
TOMADOR/OBRA: N° ARQUIVO: Pvh6DMLobxi0000-2
LOGRADUORO: NCSA SENHORA DO C 682 N° CONTROLE: DsggJRNOCy10000-3 INSCRIÇÃO: 18.296.439/0001-43
CIDADE: ARAPIRACA UF: AL CEP: 57313-310 BAIRRO: BRASÍLIA CNAE PREPONDERANTE: 4120400
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 744 620 779 CNAE: 4120400
TOTAL

SEGURADO		507	744	620	779	TOTAL
Empregados/Avulsos		2.503,41	0,00	0,00	0,00	2.503,41
Contribuintes Individuais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA						
Empregados/Avulsos		6.258,65	0,00	0,00	0,00	6.258,65
Contribuintes Individuais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAT		938,79	0,00	0,00	0,00	938,79
PAT - Agentes Ncivos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98		220,41	0,00	0,00	0,00	220,41
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL		9.480,44	0,00	0,00	0,00	9.480,44
OUTRAS ENTIDADES		1.815,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES		1.815,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00
TOTAL A RECOLHER		11.295,44	0,00	0,00	0,00	11.295,44

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI EM CRÉDITO(S) PASSÍVEL(S) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORITUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.930/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.
