



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS
SERVIÇO DE ENGENHARIA
CNPJ: 12.207.551/0001-00



Ofício SMVO/SE/ n.º 07/2020.



Lagoa da Canoa – AL, 07 de fevereiro de 2020.

Ilma. Senhora,

Joana Darque Bezerra Lima Rosendo

MD. Secretária Municipal de Educação

Nesta.

ASSUNTO: RELATÓRIO DE VISTORIA DE MEDIÇÃO

OBRA: ESCOLA DE 4 SALAS NO POVOADO FUNIL

EMPRESA CONTRATADA: Construtora Novo Horizonte Eirelli - EPP

Nº MEDIÇÃO: 01

Após vistoriar in loco, comparando os serviços apresentados no último boletim de medição e relatório fotográfico, atesto que os itens medidos no boletim 01 apresentado está em conformidade com a execução física. Deste modo segue processo da oitava e última medição com nota fiscal atestada e devidas certidões.

ciente, encaminho ao gabinete da prefeita para autorização de pagamento da medição.
07/02/20

Joana Darque B. Lima Rosendo
Secretaria Municipal de Educação
Portaria 0016

Luiz André Portela da Silva Filho
Eng. Civil Luiz André Portela da Silva Filho
Crea: 0211857840
Fiscal de Obra / Gestor de Contrato

Conforme o despacho do fiscal de obra do município, autorizo o pagamento da referida medição.
HAVENDO DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA AUTORIZO O PEDIDO
DATA: 07/02/20
TAINÁ VIEIRA PREFEITA



Construtora Novo Horizonte
Eireli EPP

Rua Nossa Senhora
do o 682 salas 02 e
03 Bairro Brasília
Arapiraca Alagoas
CEP 57.313-310

82 3522 2615
construtora.n.h@hotmail.com
18.286.438/0001-43



SOLICITAÇÃO

Venho pela presente solicitar a Secretaria Municipal competente do Município de Lagoa da Canoa/AL o pagamento da 1ª (primeira) MEDIÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 04 (QUATRO) SALAS NO POVOADO FUNIL, NO MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA/AL, CONFORME CONTRATO Nº 001 – TP 014/2019.

Na certeza do pleno atendimento, exponho a minha gratidão.

Atenciosamente,

Arapiraca/AL, 05 de fevereiro de 2020

Joel Pereira Silva

CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI EPP
Joel Pereira Silva
CPF: 786.941.244-91
Sócio-administrador

Lutz André Portela da S. Filho
Engenheiro Civil
CREA AL 02118576-40



Construtora Novo Horizonte
Ereli EPP

Rua Mossa senhora
49, o 682 salas 02 e
03 Bairro Brasília
Aparecida Alagoas
CEP 57.313-310

82.3522 2615
construtora.n.h@hot
18.286.438/0001-
43

Obra: Escola 4 Salas
Banco: SINAPI - 05/2019 - Alagoas ORSE - 09/2019 - Sergipe 25,22%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horaria 85,63%
Mensalista: 47,28%

Planilha Orçamentária Síntica

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	Medio no Período	Acumulado Anterior	Acumulado Atual	Saldo de Contrato	Medio no Período	Acumulado Anterior	Acumulado Atual	Saldo de Contrato
SERVIÇOS PRELIMINARES																
1								3,93 %								
1.1	74209001 SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6	238,80	299,02	1.794,12	0,40 %	6,00	0	6	0	1.794,12	0	1.794,12	0
1.2	73859002 SINAPI	CABINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	650	0,91	1,13	734,50	0,16 %	650,00	0	650	0	734,50	0	734,50	0
1.3	C1630 SENIFRA	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	m²	650	4,88	6,11	3.971,50	0,88 %	650,00	0	650	0	3.971,50	0	3.971,50	0
1.4	41598 SINAPI	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELÉTRICA AEREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1	977,33	1.223,81	1.223,81	0,27 %	1,00	0	1	0	1.223,81	0	1.223,81	0
1.5	C1622 SENIFRA	LIGAÇÃO PROVISORIA DE ÁGUA E SANITÁRIO	UN	1	1.792,21	2.244,20	2.244,20	0,50 %	1,00	0	1	0	2.244,20	0	2.244,20	0
1.6	62 ORSE	Barracão fechado para depósito de cimento e areia/sifido (6=58/72 m2) com materiais novos	un	1	6.151,95	7.703,34	7.703,34	1,71 %	1,00	0	1	0	7.703,34	0	7.703,34	0
FUNDAÇÕES																
2								8,40 %								
2.1	93368 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF 032016	m³	16,32	45,17	56,56	923,06	0,21 %	16,32	16,32	0	0	923,06	0	923,06	0
2.2	96617 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 3 CM AF_082017	m²	5,93	9,53	11,93	70,74	0,02 %	5,93	5,93	0	0	70,74	0	70,74	0
2.3	92915 SINAPI	ARMADAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF_122015	KG	230,3	8,15	10,20	2.349,06	0,52 %			0	230,3	0	0	2.349,06	0
2.4	92917 SINAPI	ARMADAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF_122015	KG	201,5	6,88	8,61	1.734,91	0,39 %			0	201,5	0	0	1.734,91	0
2.5	92919 SINAPI	ARMADAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_122015	KG	871,9	5,61	7,02	6.120,73	1,36 %			0	871,9	0	0	6.120,73	0
2.6	97086 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZANDO AF_092017	m²	227,49	64,36	80,59	18.333,41	4,08 %			0	227,49	0	0	18.333,41	0
2.7	94985 SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREIA/MEDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_072016	m³	18,68	233,87	292,86	5.470,43	1,22 %			0	18,68	0	0	5.470,43	0
2.8	92873 SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADESIAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF_122015	m³	18,68	117,83	147,54	2.756,04	0,61 %			0	18,68	0	0	2.756,04	0
SUPRAESTRUTURA																
3								8,04 %								
3.1	92915 SINAPI	ARMADAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF_122015	KG	414,3	8,15	10,20	4.225,86	0,94 %			0	414,3	0	0	4.225,86	0
3.2	92919 SINAPI	ARMADAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_122015	KG	1484,7	5,61	7,02	10.422,59	2,32 %			0	1484,7	0	0	10.422,59	0
3.3	92431 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PELO DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZANDO AF_122015	m²	368,08	25,79	32,29	11.895,30	2,64 %			0	368,08	0	0	11.895,30	0

VALOR DA OBRA:

R\$

449.488,97

DATA DE MEDIÇÃO:

3-fev-20

13 dias

PERÍODO:

20-jan-20

3-fev-20

DIAS TRABALHADOS:

01

18.655,27

VALOR DA MEDIÇÃO

R\$

18.655,27

Lutz Andre Pereira da S. Filho
Engenheiro Civil
CREA AL 0578 40

Levi Lopes de O. Neto
Engº Civil 525 TP/AL
RN: 0297092026

7525 TPIAL
 02052026

4.1	7525 TPIAL	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VAZOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	m²	830,02	44,82	56,12	46.590,72	10,36%	0	830,02 R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	46.590,72
4.2	87520 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VAZOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	m²	1669,72	44,82	56,12	93.704,68	20,85%	0	1669,72 R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	93.704,68
4.3	89173 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE EMBOCCAMASSA ÚNICA APLICAÇÃO MANUALMENTE TRACO 1:2:8 EM BETONEIRA DE 400L PAREDES INTERMAS COM EXECUÇÃO DE TALISCAS EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO AF_06/2014	m²	1669,72	20,44	25,59	42.728,13	9,51%	0	1669,72 R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	42.728,13
4.4	1912 ORSE	Revestimento cerâmico para parede: 15 x 15 cm, azulejo branco, tipo "A", aplicado com argamassa industrializada acrílica, rejuntamento, exclusive emboço	m²	274,39	18,42	23,06	6.327,43	1,41%	0	1669,72 R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	6.327,43
4.5	95465 SINAPI	COBOCO CERÂMICO (ELEMENTO VAZADO) 30X20X20CM ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 MF CIMENTO F A FRIA	m²	13,5	83,33	104,34	1.408,59	0,31%	0	274,39 R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.408,59
5	1841 ORSE	Revestimento de esquadrias de alumínio	m²	50,39	64,75	81,07	4.085,11	0,91%	0	13,5 R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	4.085,11
5.2	91332 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEM COCA (LEITE OU MÍDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: PORTA, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATEANTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2015	UN	9	482,72	579,41	5.214,69	1,16%	0	50,39 R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	5.214,69
5.3	90844 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM COCA (LEITE OU MÍDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATEANTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2015	UN	1	529,68	663,26	663,26	0,15%	0	9 R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	663,26
5.4	12105 ORSE	Grade de ferro de gradeil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive ferrinho e dobradiças conforme desenho	m²	11,63	267,14	334,51	3.890,35	0,87%	0	1 R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	3.890,35
6	CO802 SEINFRA	SISTEMA DE COBERTA	m²	364,44	93,73	117,36	41.597,07	11,14%	0	11,63 R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	41.597,07
6.2	4449 ORSE	COBERTURA C/TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E=6mm (C/ANFRAMFINTO) 1 Forro de pvc em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfil em PVC) marca Aristoflex ou similar, instalado	m²	247,56	20,91	26,18	6.481,12	1,44%	0	247,56 R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	6.481,12
6.3	C1353 SEINFRA	ESTRUTURA METÁLICA TREFILADA EM AÇO, EM MARQUISES	m²	12	133,00	166,54	1.998,48	0,44%	0	12 R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.998,48
7	9443 ORSE	IMPERMEABILIZAÇÃO	m²	21,6	25,45	31,66	688,17	0,15%	0	12 R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	688,17
7.1	95240 SINAPI	Impermeabilização - Aplicação de Frosastato - 02 demãos	m²	364,17	9,11	11,40	4.151,53	0,92%	0	21,6 R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	4.151,53
8	84191 SINAPI	SISTEMA DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	m²	364,17	68,84	86,20	31.391,45	6,98%	0	364,17 R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	31.391,45
8.1	88423 SINAPI	PISO EM GRANULITE, MARMORITE OU GRANITO ESPESURA 8 MM, INCLUI LUSTRO E FINITIMAS DE MÍDIA ACABO PLASTICAS	m²	1395,33	10,71	13,41	18.711,37	4,16%	0	1 R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	18.711,37
9.1	74056002 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR AF_06/2014	m²	50	14,58	18,25	912,50	0,20%	0	1395,33 R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	912,50
9.2	74145001 SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMOAS, SOBRE FINITO NINHO, ANOR PRANCO	m²	23,26	11,14	13,94	324,24	0,07%	0	50 R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	324,24
9.3		PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMOAS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE UMA DEMOA DE FUNDO ANTICORROSIVO	m²	23,26	11,14	13,94	324,24	0,07%	0	23,26 R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	324,24
10		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	m	3,57	6,34	7,93	28,31	0,01%	0	23,26 R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	28,31
10.1	2342 ORSE	Tubo pvc rígido sodavel, p/ água, marrom, d= 50mm	m	4,57	3,80	4,75	21,70	0,00%	0	3,57 R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	21,70
10.2	2339 ORSE	Tubo pvc rígido sodavel, p/ água marrom, d= 25mm	m	85,56	1,69	2,11	180,53	0,04%	0	4,57 R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	180,53
10.3	94703 SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, LONGO, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE FIBRAFIBROCEMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2015	UN	4	9,71	12,15	48,60	0,01%	0	85,56 R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	48,60
10.4	94787 SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, LONGO, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE FIBRAFIBROCEMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2015	UN	2	26,84	33,60	67,20	0,01%	0	9,71 R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	67,20
10.5	94785 SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, LONGO, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE FIBRAFIBROCEMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2015	UN	1	16,39	20,52	20,52	0,00%	0	2 R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	20,52

Leoni Lopes de O. Neto
 Engº Civil 525 TPIAL
 RN: 02052026

Lutz André Portela da S. Filho
 Engenheiro Civil
 CREA AL 07118578-40

06
20

07	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO PVC SOLDÁVEL DN 25 MM X 1/2" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFÍCIO DE PESQUISA RESERVATÓRIO DE FIBRAMBROCIMENTO FORNECIMENTO DE INSTALAÇÃO AF_08/2018	UN	18	3,38	4,23	76,14	0,02%	0	18 R\$	-	R\$	-	R\$	76,14
10,8	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diam = 25 x 20mm	un	5	3,01	3,76	18,80	0,00%	0	5 R\$	-	R\$	-	R\$	18,80
10,9	Joelho 45° de pvc rígido soldável, marrom, diam = 32mm	un	1	5,78	7,23	7,23	0,00%	0	1 R\$	-	R\$	-	R\$	7,23
10,10	Joelho 45° de pvc rígido soldável, marrom, diam = 32mm	un	1	7,12	8,91	8,91	0,00%	0	1 R\$	-	R\$	-	R\$	8,91
10,11	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom, diam = 50mm	un	1	10,67	13,36	13,36	0,00%	0	1 R\$	-	R\$	-	R\$	13,36
10,12	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom, diam = 32mm	un	9	6,18	7,73	69,57	0,02%	0	9 R\$	-	R\$	-	R\$	69,57
10,13	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom, diam = 25mm	un	32	5,44	6,81	217,92	0,05%	0	32 R\$	-	R\$	-	R\$	217,92
10,14	Joelho 90° de pvc rígido roscaivel com bucha de bitão, diam = 1/2"	un	17	8,07	10,10	171,70	0,04%	0	17 R\$	-	R\$	-	R\$	171,70
10,15	Lua de pvc rígido soldável, marrom, diam = 25mm	un	2	3,16	3,95	7,90	0,00%	0	2 R\$	-	R\$	-	R\$	7,90
10,16	Lua de pvc rígido soldável, marrom, diam = 32mm	un	2	3,82	4,78	9,56	0,00%	0	2 R\$	-	R\$	-	R\$	9,56
10,17	Lua de pvc soldável e croscsa, marrom d = 25mmx3/4"	un	3	6,08	7,61	22,83	0,01%	0	3 R\$	-	R\$	-	R\$	22,83
10,18	Lua de redução de pvc rígido soldável, marrom, diam = 32 x 25mm	un	3	4,54	5,69	17,04	0,00%	0	3 R\$	-	R\$	-	R\$	17,04
10,19	Te 90° pvc rígido soldável, marrom, d = 32mm	un	17	1,88	2,35	39,95	0,01%	0	17 R\$	-	R\$	-	R\$	39,95
10,20	Te 90° pvc rígido soldável, marrom, d = 32mm	un	2	1,88	2,35	4,70	0,00%	0	2 R\$	-	R\$	-	R\$	4,70
10,21	Te 90° pvc rígido soldável, marrom, d = 50mm	un	1	4,80	5,76	5,76	0,00%	0	1 R\$	-	R\$	-	R\$	5,76
10,22	Te 90° redução pvc rígido soldável, marrom, d = 25 x 20mm	un	3	1,48	1,85	5,55	0,00%	0	3 R\$	-	R\$	-	R\$	5,55
10,23	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP 1000L	UN	2	308,74	386,60	773,20	0,17%	0	2 R\$	-	R\$	-	R\$	773,20
10,24	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL, 3/4" COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADAS FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA AF_12/2014	UN	5	53,87	67,45	337,25	0,08%	0	5 R\$	-	R\$	-	R\$	337,25
10,25	REGISTRO GLOBO EM BRONZE ROSC. DE 3/4"	UN	3	48,99	61,34	184,02	0,04%	0	3 R\$	-	R\$	-	R\$	184,02
10,26	REGISTRO GLOBO EM BRONZE ROSC. DE 1"	UN	1	54,62	68,99	68,99	0,02%	0	1 R\$	-	R\$	-	R\$	68,99
10,27	REGISTRO DE PRESSÃO C/ CANOPLA GROMADA D= 20mm (3/4")	UN	3	61,43	76,92	230,76	0,05%	0	3 R\$	-	R\$	-	R\$	230,76
10,28	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	3	9,04	11,31	33,93	0,01%	0	3 R\$	-	R\$	-	R\$	33,93
11	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS						4,98%							
11,1	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (CERRI HA NI TAMPA C/REGA	UN	3	30,70	38,44	115,32	0,03%	0	3 R\$	-	R\$	-	R\$	115,32
11,2	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO CROMADO (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE	UN	4	27,32	34,21	136,84	0,03%	0	4 R\$	-	R\$	-	R\$	136,84
11,3	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO CROMADO (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS	M	13,92	33,97	42,53	592,01	0,13%	0	4 R\$	-	R\$	-	R\$	136,84
11,4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PREDIOS	M	53,4	48,15	60,29	3.219,48	0,72%	0	13,92 R\$	-	R\$	-	R\$	592,01
11,5	91795 SINAPI	M	96,64	35,10	43,95	4.242,93	0,94%	0	53,4 R\$	-	R\$	-	R\$	3.219,48
11,6	1537 ORSE	un	1	19,19	24,02	24,02	0,01%	0	96,54 R\$	-	R\$	-	R\$	4.242,93
11,7	1616 ORSE	un	4	17,72	22,18	88,72	0,02%	0	1 R\$	-	R\$	-	R\$	24,02
11,8	88533 SINAPI	UN	1	15,35	19,22	19,22	0,00%	0	4 R\$	-	R\$	-	R\$	88,72
11,9	88802 SINAPI	UN	3	3,44	4,30	12,90	0,00%	0	1 R\$	-	R\$	-	R\$	19,22
11,10	89726 SINAPI	UN	4	4,08	5,10	20,40	0,00%	0	3 R\$	-	R\$	-	R\$	12,90
11,11	00009526 SINAPI	UN	9	1,00	1,25	11,25	0,00%	0	4 R\$	-	R\$	-	R\$	20,40

Levi Lopes de O. Neto
Engº Civil 625 TP/AL
RN 07052026


Lutz Andre Porteira da S. Filho
Engenheiro Civil
CREA Al 02118578 40

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

- Execução de placa de obra




Luiz André Portela da S. Filho
Engenheiro Civil
CREA AL 02118578 40

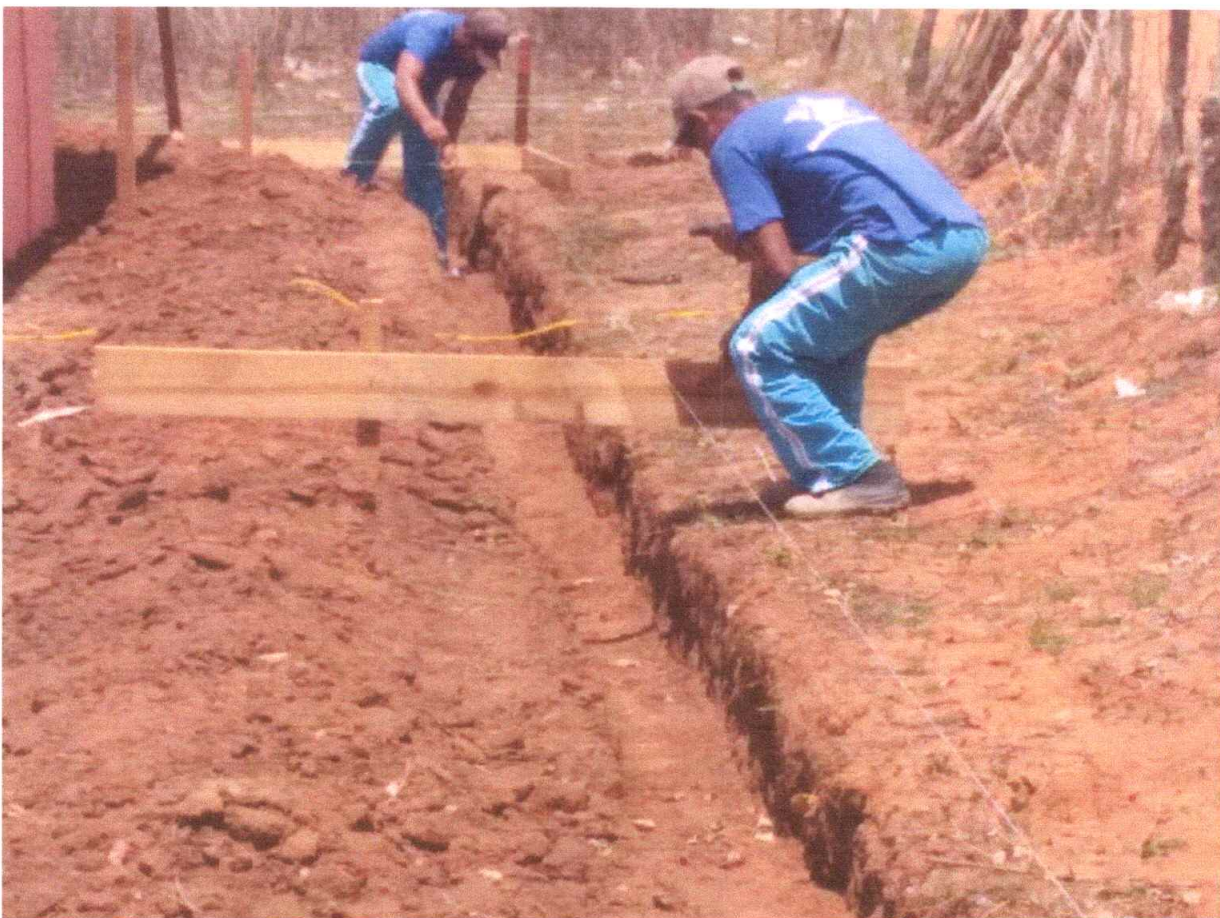

Levi Lopes de O. Neto
Engº Civil 525 TP/AL
RN: 0207052026


- Locação de obra – Gabarito



[Signature]
Luiz André Portela da S. Filho
Engenheiro Civil
CREA AL 02118578 40

[Signature]
Levi Lopes de O. Neto
Engº Civil 525 TP/AL
RN: 0207052026




Luiz André Portela da S. Filho
Engenheiro Civil
CREA AL 02118578 40


Levi Lopes de O. Neto
Engº Civil 525 TP/AL
RN: 0207052026

- Escavação de valas para fundação e lastro de concreto




Luiz Andre Portela da S. Filho
Engenheiro Civil
CREA AL 02118578 40


Levi Lopes de O. Neto
Engº Civil 525 TP/AL
RN: 0207052026




Luiz André Portela da S. Filho
Engenheiro Civil
CREA AL 02118578 40

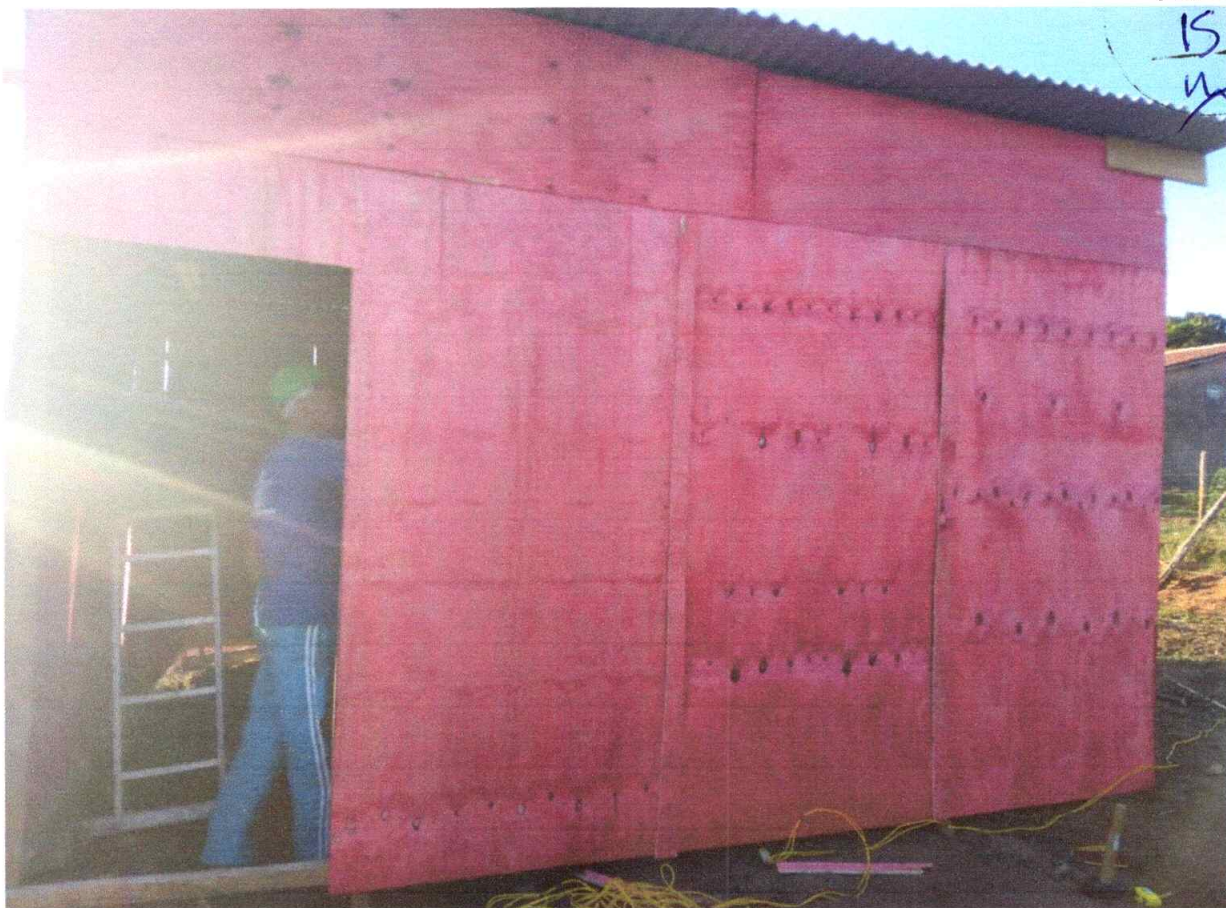

Levi Lopes de O. Neto
Engº Civil 525 TP/AL
RN: 0207052026


- Execução de Barracão para depósito de materiais




Luiz André Portela da S. Filho
Engenheiro Civil
CREA AL 02118578 40


Levi Lopes de O. Neto
Engº Civil 525 TP/AL
RN: 0207052026




Luiz André Portela da S. Filho
Engenheiro Civil
CREA AL 02118578 40


Levi Lopes de O. Neto
Engº Civil 525 TP/AL
RN: 0207052026

DIÁRIO DE OBRAS

		DATA:	20/01/2020
		NUMERO DO DIÁRIO	1
		PRAZO CONTRATUAL (DIAS)	150
		DIAS TRABALHADOS	1
		SALDO DO PRAZO	149

Construção de uma Escola de 04 (Quatro) Salas no Povoado Funil

INDIRETO		DIRETO			
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Engenheiro Civil	1	Ajudante	3		
Encarregado	1	Pedreiro	2		
		Carpinteiro			
		Operador de Maquina			
SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra			SUBEMPREENHEIROS - Equipamentos		
		EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
		Vigilância	1		
TOTAL GERAL MÃO DE OBRA					8
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS					0

CONDIÇÕES METEOROLOGICAS

SOL		NUBLADO		CHUVA	
Manhã		Manhã		Manhã	
	x				
Tarde	x	Tarde		Tarde	
Noite		Noite		Noite	

Observação:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Locação de obra

Execução de barracão fechado

COMENTÁRIOS



Assinatura Contratada

Levi Lopes de O. Neto
Eng° Civil 825 TP/AL
RN: 0207052026

Assinatura Fiscalização/Supervisão

Lutz André Portela da S. Filho
Engenheiro Civil
CREA AL 02118578 40

DIÁRIO DE OBRAS

				DATA:	21/01/2020
				NUMERO DO DIÁRIO	2
				PRAZO CONTRATUAL (DIAS)	150
				DIAS TRABALHADOS	2
				SALDO DO PRAZO	148
Construção de uma Escola de 04 (Quatro) Salas no Povoado Funil					
MÃO DE OBRA					
INDIRETO			DIRETO		
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Engenheiro Civil	1	Ajudante	3		
Encarregado	1	Pedreiro	2		
		Carpinteiro			
		Operador de Maquina			
SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra			SUBEMPREENHEIROS - Equipamentos		
		EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
		Vigilância	1		
TOTAL GERAL MÃO DE OBRA					8
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS					0
CONDIÇÕES METEOROLOGICAS					
SOL		NUBLADO		CHUVA	
Manhã	x	Manhã		Manhã	
Tarde	x	Tarde		Tarde	
Noite		Noite		Noite	
Observação:					
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
Locação de obra					
Execução de barracão fechado					
Colocação de placa de obra					
COMENTÁRIOS					
Assinatura Contratada			Assinatura Fiscalização/Supervisão		
<i>Levi Lopes de A. Neto</i> Engº Civil 526 TP/AL RN: 0207052026			<i>Lutz Andre Portela da S. Filho</i> Engenheiro Civil CREA AL 02118578 40		

DIÁRIO DE OBRAS

Folhas

20



DATA:	24/01/2020
NUMERO DO DIÁRIO	5
PRAZO CONTRATUAL (DIAS)	150
DIAS TRABALHADOS	5
SALDO DO PRAZO	145

Construção de uma Escola de 04 (Quatro) Salas no Povoado Funil

MÃO DE OBRA

INDIRETO		DIRETO			
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Engenheiro Civil	1	Ajudante	3		
Encarregado	1	Pedreiro	2		
		Carpinteiro			
		Operador de Maquina			
SUBEMPREENHEITORES - Mão de Obra			SUBEMPREENHEITORES - Equipamentos		
		EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
		Vigilância	1		
TOTAL GERAL MÃO DE OBRA					8
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS					0

CONDIÇÕES METEOROLOGICAS

SOL		NUBLADO		CHUVA	
Manhã	x	Manhã		Manhã	
Tarde		Tarde		Tarde	x
Noite		Noite		Noite	

Observação:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Escavação de vala para fundação do muro
 Execução de lastro de concreto magro
 escavação de pilares e sapatas

COMENTÁRIOS

Assinatura Contratada

Levi Lopes de O. Neto
 Engº Civil 525/TP/AL
 RN: 0207052026

Assinatura Fiscalização/Supervisão

Luiz André Portela da S. Filho
 Engenheiro Civil
 CREA AL 02118578 40

DIÁRIO DE OBRAS

Folhas

Construtora Novo Horizonte
Eireli EPP



DATA:

26/01/2020

NUMERO DO DIÁRIO	7
PRAZO CONTRATUAL (DIAS)	150
DIAS TRABALHADOS	7
SALDO DO PRAZO	143

Construção de uma Escola de 04 (Quatro) Salas no Povoado Funil

MÃO DE OBRA

INDIRETO		DIRETO			
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Engenheiro Civil	1	Ajudante	3		
Encarregado	1	Pedreiro	2		
		Carpinteiro			
		Operador de Maquina			
SUBEMPREENHEITORES - Mão de Obra			SUBEMPREENHEITORES - Equipamentos		
		EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
		Vigilância	1		
TOTAL GERAL MÃO DE OBRA					8
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS					0

CONDIÇÕES METEOROLOGICAS

SOL		NUBLADO		CHUVA	
Manhã	x	Manhã		Manhã	
Tarde		Tarde		Tarde	x
Noite		Noite		Noite	

Observação:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Folga para descanso no fim de semana

COMENTÁRIOS





Assinatura Contratada

Levi Lopes de O. Neto
Engº CIVIL 525 TP/AL
RN: 0207052026

Assinatura Fiscalização/Supervisão

Lutz André Portela da S. Filho
Engenheiro Civil
CREA AL 02118578 40

DIÁRIO DE OBRAS

				DATA:	27/01/2020
				NUMERO DO DIÁRIO	1
				PRAZO CONTRATUAL (DIAS)	150
				DIAS TRABALHADOS	1
				SALDO DO PRAZO	149
Construção de uma Escola de 04 (Quatro) Salas no Povoado Funil					
MÃO DE OBRA					
INDIRETO			DIRETO		
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Engenheiro Civil	1	Ajudante	3		
Encarregado	1	Pedreiro	2		
		Carpinteiro			
		Operador de Maquina			
SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra			SUBEMPREENHEIROS -Equipamentos		
		EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
		Vigilância	1		
TOTAL GERAL MÃO DE OBRA					8
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS					0
CONDIÇÕES METEOROLOGICAS					
SOL		NUBLADO		CHUVA	
Manhã	x	Manhã		Manhã	
Tarde	x	Tarde		Tarde	
Noite		Noite		Noite	
Observação:					
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
Locação de obra					
Execução de barracão fechado					
COMENTÁRIOS					
Assinatura Contratada			Assinatura Fiscalização/Supervisão		
 Levi Lopes de A. Neto Engº Civil 526 TP/AL RN: 0207052026			 Luiz André Portela da S. Filho Engenheiro Civil CREA AL 02118578 40		

DIÁRIO DE OBRAS

Folhas

24



DATA:	28/01/2020
NUMERO DO DIÁRIO	2
PRAZO CONTRATUAL (DIAS)	160
DIAS TRABALHADOS	2
SALDO DO PRAZO	148

Construção de uma Escola de 04 (Quatro) Salas no Povoado Funil

MÃO DE OBRA

INDIRETO		DIRETO			
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Engenheiro Civil	1	Ajudante	3		
Encarregado	1	Pedreiro	2		
		Carpinteiro			
		Operador de Maquina			
SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra			SUBEMPREENHEIROS -Equipamentos		
		EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
		Vigilância	1		
TOTAL GERAL MÃO DE OBRA					8
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS					0

CONDIÇÕES METEOROLOGICAS

SOL		NUBLADO		CHUVA	
Manhã	x	Manhã		Manhã	
Tarde	x	Tarde		Tarde	
Noite		Noite		Noite	

Observação:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Locação de obra

Execução de barracão fechado

Colocação de placa de obra

COMENTÁRIOS

Assinatura Contratada
Levi Lopes
 Engº Civil 525 TP/AL
 RN: 0207052026

Assinatura Fiscalização/Supervisão
Lutz André Portela da S. Filho
 Engenheiro Civil
 CREA AL 02118578 40

DIÁRIO DE OBRAS

Folhas

25



DATA:	29/01/2020
NUMERO DO DIÁRIO	3
PRAZO CONTRATUAL (DIAS)	150
DIAS TRABALHADOS	3
SALDO DO PRAZO	147

Construção de uma Escola de 04 (Quatro) Salas no Povoado Funil

MÃO DE OBRA					
INDIRETO			DIRETO		
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Engenheiro Civil	1	Ajudante	3		
Encarregado	1	Pedreiro	2		
		Carpinteiro			
		Operador de Maquina			
SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra			SUBEMPREENHEIROS - Equipamentos		
		EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
		Vigilância	1		
TOTAL GERAL MÃO DE OBRA					8
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS					0

CONDIÇÕES METEOROLOGICAS

SOL		NUBLADO		CHUVA	
Manhã	x	Manhã		Manhã	
Tarde	x	Tarde		Tarde	
Noite		Noite		Noite	

Observação:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Execução de locação de obra por gabarito
 Escavação de vala para fundação do muro

COMENTÁRIOS

<p style="text-align: center;">Assinatura Contratada</p> <p style="text-align: center;"><i>Levi Lopes de O. Neto</i> Engº Civil 525 TP/AL RN: 0207052026</p>	<p style="text-align: center;">Assinatura Fiscalização/Supervisão</p> <p style="text-align: center;"><i>Luiz André Portela da S. Filho</i> Engenheiro Civil CREA AL 02118578 40</p>
--	---

DIÁRIO DE OBRAS

Folhas 27

Construtora: Novo Horizonte Eireli EPP



DATA: 31/01/2020

NUMERO DO DIÁRIO: 5
 PRAZO CONTRATUAL (DIAS): 150
 DIAS TRABALHADOS: 5
 SALDO DO PRAZO: 145

Construção de uma Escola de 04 (Quatro) Salas no Povoado Funil

MÃO DE OBRA

INDIRETO		DIRETO			
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Engenheiro Civil	1	Ajudante	3		
Encarregado	1	Pedreiro	2		
		Carpinteiro			
		Operador de Maquina			
SUBEMPREENHEITORES - Mão de Obra			SUBEMPREENHEITORES -Equipamentos		
		EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
		Vigilância	1		
TOTAL GERAL MÃO DE OBRA					8
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS					0

CONDIÇÕES METEOROLOGICAS

SOL		NUBLADO		CHUVA	
Manhã	x	Manhã		Manhã	
Tarde		Tarde		Tarde	x
Noite		Noite		Noite	

Observação:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Escavação de vala para fundação do muro
 Execução de lastro de concreto magro
 escavação de pilares e sapatas

COMENTÁRIOS

Assinatura Contratada

Levi Lopes de O. Neto
 Engº Civil 526 TP/AL
 RN: 0207052026

Assinatura Fiscalização/Supervisão

Lutz André Portela da S. Filho
 Engenheiro Civil
 CREA AL 02118578 40

DIÁRIO DE OBRAS

Construtora Novo Horizonte
Eireli EPP



DATA:

02/02/2020

NUMERO DO DIÁRIO

7

PRAZO CONTRATUAL (DIAS)

150

DIAS TRABALHADOS

7

SALDO DO PRAZO

143

Construção de uma Escola de 04 (Quatro) Salas no Povoado Funil

MÃO DE OBRA

INDIRETO		DIRETO			
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Engenheiro Civil	1	Ajudante	3		
Encarregado	1	Pedreiro	2		
		Carpinteiro			
		Operador de Maquina			
SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra			SUBEMPREENHEIROS - Equipamentos		
		EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
		Vigilância	1		
TOTAL GERAL MÃO DE OBRA					8
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS					0

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS

SOL		NUBLADO		CHUVA	
Manhã	x	Manhã		Manhã	
Tarde		Tarde		Tarde	x
Noite		Noite		Noite	

Observação:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Folga para descanso no fim de semana

COMENTÁRIOS





Assinatura Contratada

Levi Lopes da S. Neto
Engº Civil 525 TP/AL
RN: 0207052026

Assinatura Fiscalização/Supervisão

Luiz André Portela da S. Filho
Engenheiro Civil
CREA AL 02118578 40

DIÁRIO DE OBRAS

 Construtora Novo Horizonte Eireli EPP		 Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa Construindo com o povo!		DATA:	03/02/2020
				NUMERO DO DIÁRIO	8
				PRAZO CONTRATUAL (DIAS)	150
				DIAS TRABALHADOS	8
				SALDO DO PRAZO	142
Construção de uma Escola de 04 (Quatro) Salas no Povoado Funil					
MÃO DE OBRA					
INDIRETO			DIRETO		
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Engenheiro Civil	1	Ajudante	3		
Encarregado	1	Pedreiro	2		
		Carpinteiro			
		Operador de Maquina			
SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra			SUBEMPREENHEIROS -Equipamentos		
		EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
		Vigilância	1		
TOTAL GERAL MÃO DE OBRA					8
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS					0
CONDIÇÕES METEOROLOGICAS					
SOL		NUBLADO		CHUVA	
Manhã	x	Manhã		Manhã	
Tarde		Tarde		Tarde	x
Noite		Noite		Noite	
Observação:					
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
Escavação de pilares e sapatas					
COMENTÁRIOS					
Assinatura Contratada			Assinatura Fiscalização/Supervisão		
 Levi Lopes de O. Neto Engº Civil 525 TP/AL RN: 0207052026			 Luiz André Portela da S. Filho Engenheiro Civil CREA AL 02118578 40		



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

CERTIDÃO ESTADUAL
**FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL E CONCORDATA**

CERTIDÃO Nº: 002705275

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Certifico que, pesquisando os registros de distribuição de feitos do Estado de Alagoas, no período de 10 anos, verifiquei NÃO CONSTAR distribuições em nome de:

CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI EPP, residente na RUA NOSSA SENHORA DO Ó, BRASÍLIA, CEP: 57313-310, Arapiraca - AL, vinculado ao CNPJ: 18.286.438/0001-43 *****

Certifico ainda que a pesquisa acima refere-se a AÇÕES DE FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL E CONCORDATA em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado de Alagoas, com as ressalvas abaixo:

Observações:

- 1 - A presente certidão foi emitida de acordo com a Resolução nº. 121/2010 do CNJ;
- 2 - A presente certidão não abrange eventuais ações de FALÊNCIA em que a pessoa a respeito da qual é expedida figure no pólo ativo;
- 3 - Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ;
- 4 - Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, que deverão ser objeto de certidões específicas;
- 5 - A exatidão dos dados pessoais fornecidos para pesquisa é de inteira responsabilidade da parte interessada.
- 6 - A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas (www.tjal.jus.br).

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias.

Maceió, quinta-feira, 30 de janeiro de 2020 às 09h13min.

PEDIDO Nº:

002705275



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Folhas

32

40



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 18.286.438/0001-43

Razão Social: CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI

Endereço: R NOSSA SENHORA DO O 682 SL 02 E 03 / BRASÍLIA / ARAPIRACA / AL /
57313-310

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 21/01/2020 a 19/02/2020

Certificação Número: 2020012103182054048818

Informação obtida em 30/01/2020 09:19:19

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Folhas

33

70

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 18.286.438/0001-43

Certidão n°: 2704069/2020

Expedição: 30/01/2020, às 09:15:01

Validade: 27/07/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **18.286.438/0001-43**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



Estado de Alagoas
Secretaria de Estado da Fazenda
Superintendência da Receita Estadual

Folhas

34

20

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS

Certidão fornecida para o CNPJ: 18.286.438/0001-43

Nome/Contribuinte: CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir, até a presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos do contribuinte e refere-se a débitos de natureza tributária e descumprimento de obrigações acessórias.

Certidão emitida gratuitamente com base na Instrução Normativa SEF nº. 27 de 15 de maio de 2017.

Certidão emitida nos termos do art. 78 da Lei nº 6.771/06 e do art. 255 do Decreto nº 25.370/13.

Válida até 27/03/2020

Emitida às 09:03:20 do dia 27/01/2020

Código de controle da certidão: C86C-041E-0880-465E

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Executiva da Receita Estadual na internet, no endereço: www.sefaz.al.gov.br.

Folhas

35

40



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA

FAZENDA MUNICIPAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS N.º 1848 / 2020

Identificação do Contribuinte

Contribuinte: CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI**CNPJ/CPF:** 18.286.438/0001-43

Tipo do Contribuinte

Contribuinte Econômico **Situação Cadastral:** Ativo**Inscrição Municipal:** 143890**Identificação:** 7344**Endereço:** RUA - NOSSA SENHORA DO Ó, Nº: 682, SALA 02 E 03
57.313-310,**Bairro:** BRASILIA**Cidade:** ARAPIRACA**Complemento do Loteamento:**

Certificamos, com fundamento nas informações constantes em nosso Sistema de Cadastro e Controle de Arrecadação, e ressalvado o direito da Fazenda Municipal de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, conforme art. 332 do CTM, com referência ao presente instrumento, que em relação ao contribuinte/imóvel acima identificado **INEXISTE DÉBITO** impeditivo a expedição desta certidão.

De Autenticidade: C60.3C5.DE5.641

A autenticidade desta certidão DEVE ser confirmada na pagina da Secretaria de fazenda, no endereço:
<https://arapiraca.abaco.com.br/eagata/portal/>

Certidão emitida as 10:12:31 hs, do dia 28/01/2020 **Validade:**28/03/2020**Observação:** @ObsCert



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 18.286.438/0001-43 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 11/06/2013
NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 01.61-0-99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.22-7-02 - Obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO R NOSSA SENHORA DO O	NÚMERO 682	COMPLEMENTO SALA 02 E 03
CEP 57.313-310	BAIRRO/DISTRITO BRASILIA	MUNICÍPIO ARAPIRACA
UF AL	ENDEREÇO ELETRÔNICO OASISCONSULTORIA@HOTMAIL.COM.BR	TELEFONE (82) 9968-3635/ (82) 8764-1757
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 11/06/2013	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 30/01/2020 às 09:18:08 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Folhas

37

40

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 18.286.438/0001-43 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 11/06/2013
NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.24-8-00 - Transporte escolar 49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal 49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO R NOSSA SENHORA DO O	NÚMERO 682	COMPLEMENTO SALA 02 E 03
CEP 57.313-310	BAIRRO/DISTRITO BRASILIA	MUNICÍPIO ARAPIRACA
UF AL	ENDEREÇO ELETRÔNICO OASISCONSULTORIA@HOTMAIL.COM.BR	
TELEFONE (82) 9968-3635/ (82) 8764-1757		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 11/06/2013	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 30/01/2020 às 09:18:08 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



Secretaria de Estado da Fazenda de Alagoas
Superintendência de Receita Estadual - SRE
Secretaria Adjunta da Receita Estadual
Diretoria de Cadastro

Quinta-feira, 30 de Janeiro de 2020

Folhas

38

Sistema de Emissão da Ficha Cadastral do Contribuinte - FIC On-Line

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte. Confira os dados de Identificação da Empresa e, se houver qualquer divergência, providencie junto à SEFAZ a sua atualização cadastral.
As informações contidas nesta ficha carecem de verificação junto a SEFAZ para comprovação da idoneidade dos dados contidos.

Secretaria de Estado da Fazenda de Alagoas - SEFAZ Secretaria Especial da Receita Estadual Superintendência Especial da Receita Estadual Superintendência de Crédito Tributário, Cadastro e Articulação Regional		
NÚMERO CACEAL 244.52538-2 CNPJ/CPF 18.286.438/0001-43	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	INÍCIO DE ATIVIDADE 11/02/2016 OPTANTE PELO SIMPLES ? NÃO
RAZÃO SOCIAL CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI		
NOME DE FANTASIA CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE		
CÓDIGO - DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONOMICA 4120400 - Construção de edifícios (PRINCIPAL) 0161099 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente 4929901 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal 4929902 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional 3811400 - Coleta de resíduos não-perigosos 4211101 - Construção de rodovias e ferrovias 4212000 - Construção de obras-de-arte especiais 4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 4221901 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 4222701 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 4222702 - Obras de irrigação 4292801 - Montagem de estruturas metálicas 4311801 - Demolição de edifícios e outras estruturas 4313400 - Obras de terraplenagem 4321500 - Instalação e manutenção elétrica 4322301 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 4322302 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 4322303 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 4329199 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente 4330402 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 4330403 - Obras de acabamento em gesso e estuque 4330404 - Serviços de pintura de edifícios em geral 4330405 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 4330499 - Outras obras de acabamento da construção 4391600 - Obras de fundações 4399101 - Administração de obras 4399102 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 4399103 - Obras de alvenaria 4399105 - Perfuração e construção de poços de água 4399199 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 7719599 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 7711000 - Locação de automóveis sem condutor 7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 4923002 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 4924800 - Transporte escolar		
CÓDIGO - DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 134 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)		
LOGRADOURO R NOSSA SENHORA DO O	NÚMERO 682	COMPLEMENTO SALA 02 E 03
CEP 57313-310	BAIRRO/DISTRITO BRASILIA	MUNICÍPIO ARAPIRACA
SITUAÇÃO CADASTRAL BAIXADA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 30/1/2020	
ENDEREÇO ELETRÔNICO OASISCONSULTORIA@HOTMAIL.COM.BR		

Data de Emissão: **Quinta, 30 de Janeiro de 2020, às 09:17:03** (data e hora de Brasília).

Para qualquer sugestão ligar para:



Informações: Call Center Sefaz - 0800 284 1060

2000 - 2020 @SUTI WEB - © Superintendência de Tecnologia da Informação - SEFAZ/AL



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Folhas

39
20

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI
CNPJ: 18.286.438/0001-43

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:51:26 do dia 28/01/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/07/2020.
Código de controle da certidão: **AD45.3FD2.C000.1B6F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 08/01/2020 - 11:39:39

Folhas

40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI				02-BDD/TELEFONE (0082) 35212902
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 22.676,73	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018083-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(3) 18.286.438/0001-43	11-COMPETÊNCIA 12/2019	12-DATA DE VALIDADE 10/01/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.814,13	14-ENCARGOS 99,78	15-TOTAL A RECOLHER 1.913,91
--	----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 10/01/2020

858100000196 139101802007 110636203810 828643800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

1.913.9131000



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4-COMPETÊNCIA	12/2019
		5-IDENTIFICADOR	18.286.438/0001-43
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI RUA NOSSA SENHORA DO Ó, 682 SALA 02 E 03 - BRASÍLIA 57313310 ARAPIRACA - AL 8235212902		6-VALOR DO INSS	5.459,54
		7-	
		8-	
		9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.021,44
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/01/2020	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11-TOTAL	6.480,98
		12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Folhas

41
20

18.286.438/0001-43
18.286.438/0001-43
18.286.438/0001-43

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/01/2020
HORA: 15:12:06
PÁG: 0002/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000183 141301802002 107636200810 828643800019

EMPRESA: CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI N° ARQUIVO: Hc12pmzplvb0000-3
COMP: 12/2019 COD REC: 155 COD GPS: 2100 INSCRIÇÃO: 18.286.438/0001-43
TOMADOR/OBRA: CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
N° DE CONTROLE: M30zjvqE0Ha0000-6 INSCRIÇÃO: 18.286.438/0001-43

LOGRADOURO: NOSSA SENHORA DO O 682

BAIRRO: BRASÍLIA

CNAE PREPONDERANTE: 4120400

CIDADE: ARAPIRACA

UF: AL CEP: 57313-310

CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	13	17.600,88	5.075,85	17.600,88	10,54
TOTALS:	13	17.600,88	5.075,85	17.600,88	10,54

Folhas

43

40

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/01/2020
HORA: 15:12:06
PÁG: 0003/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI
COMP: 12/2019 COD REC: 155 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA: CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI
LOGRADOURO: NOSSA SENHORA DO O 682
CIDADE: ARAPIRACA
UF: AL
CEP: 57313-310
BAIRRO: BRASÍLIA
TELEFONE: 0082 3521 2902
CNAE: 4120400

Nº ARQUIVO: Hc12pmzplvb0000-3
INSCRIÇÃO: 18.286.438/0001-43
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO: 18.286.438/0001-43

FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
Nº DE CONTROLE: M30zjvqE0Ha0000-6

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 6.480.99 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.408.91
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 25 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/01/2020
HORA: 15:12:06
PÁG: 0004/0006

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

858400000183 141301802002 107636200810 828643800019

EMPRESA: CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI N° DE CONTROLE: Oh8gMmcp7Z0000-9 N° ARQUIVO: Hc12pmzplyb0000-3
COMP: 12/2019 COD REC:155 COD GPS: FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 18.286.438/0001-43
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: NOSSA SENHORA DO O 682 UF: AL CEP: 57313-310 BAIRRO: BRASILIA CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CIDADE: APARIRACA CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	13	17.600,88	5.075,85	17.600,88	10,54
TOTALS:	13	17.600,88	5.075,85	17.600,88	10,54

Folhas

45

40

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/01/2020
HORA: 15:12:06
PÁG: 0005/0006

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858400000183 141301802002 107636200810 828643800019

EMPRESA: CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI N° DE CONTROLE: Oh8gMmcpp7Z0000-9 N° ARQUIVO: Hc12pmzplvb0000-3
COMP: 12/2019 COD REC: 155 COD GPS: FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 18.286.438/0001-43
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: NOSSA SENHORA DO O 682 BAIRRO: BRASÍLIA CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CIDADE: ARAPIRACA UF: AL CEP: 57313-310 CNAE: 4120400

MODALIDADE: "Branco" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 17.600,88
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 5.075,85

QUANTIDADE TRABALHADORES 13

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2020

DEPÓSITO FGTS 1.814,13

ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 1.814,13

Folhas

46

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/01/2020
HORA: 15:12:06
PÁG: 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI N° DE CONTROLE: 0h8gmccp7z0000-9 N° ARQUIVO: Hc12pmzplvb0000-3
COMP: 12/2019 COD REC: 155 COD GPS: FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 18.286.438/0001-43
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00

LOGRADOURO: NOSSA SENHORA DO O 682 UF: AL CEP: 57313-310 BAIRRO: BRASÍLIA CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CIDADE: ARAPIRACA TELEFONE: 0082 3521 2902 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 6.480.99 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.408.91
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 25 ANOS: 0.00
15 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0



ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

Praça Vereador Benício Alves de Oliveira, 15 - CENTRO

Lagoa da Canoa - AL

C.N.P.J.: 31.651.645/0001-18

Nota de Empenho

FEVEREIRO/2020

Nota de Empenho 0207002

FORNECEDOR

Nome: CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI CNPJ/CPF: 18286438000143
 Endereço: R NOSSA SENHORA DO O, 682 Compl: SALA 02 E 03
 Bairro: BRASILIA Cidade: Arapiraca UF: AL
 E-mail: oasisconsultoria@hotmail.com.br Telefone: (82)9968-3635
 PIS/PASEP: RG:

Folhas

49

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0881 FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
 Função: 12 Educação
 SubFunção: 361 Ensino Fundamental
 Programa: 0002 EDUCAÇÃO IDEAL BUSCANDO DIVERSIDADE E INCLUSÃO
 Ação: 2023 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%
 Natureza Despesa: 449051000000 Obras e Instalações
 SubElemento: 449051910000 Obras Em Andamento
 Fonte: 025100000 FUNDEF/PRECATÓRIOS
 Centro Custo:

Licitação: Nº 014/2019 - Tomada Preços, Art.22 Inciso II Lei 8.666/93

Processo: Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Ordinário	112.322,44	18.665,27	93.657,17

HISTÓRICO

REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 04 (QUATRO) SALAS NO POVOADO FUNIL, NO MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA/AL.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	1 - Outras Despesas Gerais	UND	1,0000	18.665,2700	18.665,2700

DEZOITO MIL E SEISCENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS

18.665,27

Da 07/02/2020

Autorizo o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

JOANA DARQUE BEZERRA LIMA ROSENDO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO Mat.500

PUSKIN VEIGA LAVINAS CORREA DE SA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.3683

imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA
Secretaria Municipal da Fazenda



Folhas
50

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://www.e-nfs.com.br/arapiraca , informando o código de verificação.	Código de verificação 573A.A4CC.9936	Data/Hora da emissão 07/02/2020 - 10:03:53
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 273

Prestador de Serviços

	CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI	
	NOSSA SENHORA DO Ó, 682,SALA 02 E 03 BRASILIA, Telefone: . CEP 57313-310 - ARAPIRACA - AL - BRASIL CPF/CNPJ 18.286.438/0001-43 Email construtora.n.h@hotmail.com	
	Inscrição Municipal	143890
	Inscrição Estadual	

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA	
CPF/CNPJ	12.207.551/0001-00	
Endereço	PRAÇA VEREADOR BENÍCIO ALVES DE OLIVEIRA, S/N,	
Bairro	CENTRO, Telefone: .	
Cep	57330-000	
Cidade	LAGOA DA CANOA - AL - BRASIL	Inscrição Municipal
Email	sec.transporte.canoa@gmail.com	Inscrição Estadual

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 04 (QUATRO) SALAS NO POVOADO FUNIL, NO MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA/AL, CONFORME CONTRATO Nº 001 - TP 014/2019 PERÍODO DE EXECUÇÃO 20/01/2020 A 03/02/2020; RECURSO: UNIDADE 08,81 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB; PROJETO ATIVIDADE: 2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%; ELEMENTO DE DESPESA 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES; FONTE DE RECURSOS: FUNDEF/PRECATÓRIOS 50% MATERIAL 50% MÃO DE OBRA DADOS BANCÁRIOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 0056 OPERAÇÃO 003 CONTA 5198-5

Serviço: 7.02-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO E POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS)

Valor do Serviço (R\$)	Qtd	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
18.665,27	1,00	0,00	0,00	18.665,27	2,50	466,63	18.665,27

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 18.665,27**Retenções**

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN(R\$)	Outras Retenções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
466,63	0,00	466,63	18.198,64	

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço- Tomador de serviço sem cadastro no NFSE, responsável pelo recolhimento do ISSQN acesse o Portal da Fazenda para emitir a guia.- ISSQN devido pelo Tomador em LAGOA DA CANOA - AL- NFSE é emitida com respaldo da Lei Municipal nº 2.342/2013, alterada por Lei Municipal nº 2.995/2014 e Decreto Municipal 2.217/2010. - Data do vencimento do ISS desta NFSE: 05/03/20- Retenções ISSQN (Retido): 466,63.



Lutz André Portela da S. Filho
Engenheiro Civil
CREA AL 02118578 40



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA
Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento

FEVREIRO/2020

Nota de Liquidação: 0207003

Fonte: 025100000 - FUNDEF/PRECATÓRIOS

FORNECEDOR

Nome: CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI CNPJ/CPF: 18286438000143
 Endereço: R NOSSA SENHORA DO O Compl: SALA 02 E 03
 Bairro: BRASILIA Cidade: Arapiraca UF: AL
 E-mail: oasisconsultoria@hotmail.com.br Telefone: (82)9968-3635 RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0881 FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
 Função: 12 Educação
 SubFunção: 361 Ensino Fundamental
 Programa: 0002 EDUCAÇÃO IDEAL BUSCANDO DIVERSIDADE E INCLUSÃO
 Ação: 2023 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%
 Natureza Despesa: 449051000000 Obras e Instalações
 SubElemento: 449051910000 Obras Em Andamento
 Fonte: 025100000 FUNDEF/PRECATÓRIOS
 Centro Custo:

EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0207002	07/02/2020	18.665,27	18.665,27	0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 04 (QUATRO) SALAS NO POVOADO FUNIL, NO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA/AL.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 04 (QUATRO) SALAS NO POVOADO FUNIL, NO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA/AL.

Documento	Valor
Nota Fiscal (273 / Série: 0 / UF: AL / Emissão: 07/02/2020)	18.665,27

SUBEVENTO

15 OBRAS E INSTALAÇÕES

Conta Débito	Conta Crédito	Valor
12321060100000000 - Obras Em Andamento	21311010000000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	18.665,27
Retenção		Valor
21881010900000001-ISS - EDUCAÇÃO		466,63

DEZOITO MIL E SEISCENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS

Total Retido:	466,63
Total Liquido:	18.198,64


Data: 07/02/2020


DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento de acordo com o Artigo 64 da Lei 4.320/64.


 JOANA DARQUE BEZERRA LIMA ROSENDO
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO Mat.500


 PUSKIN VEIGA LAVINIAS CORREA DE SA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.3683



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
GABINETE DA SECRETÁRIA
CNPJ: 12.207.551/0001-00



Ofício 65/2020/SEMED/GS

Lagoa da Canoa, 10 de fevereiro de 2020.

A Excelentíssima
Senhora,
Tainá Correa de Sá Lucio da Silva
DD. Prefeita do Município de Lagoa da Canoa.
Nesta

Folhas
51
20

Assunto: **Solicitação de Pagamento referente à 1ª medição do das obras e serviços de construção de uma escola de 4 salas no Povoado Funil, município de Lagoa da Canoa-AL, conforme contrato N°001- TP 014/2019.**

Senhora Prefeita,

Após a prestação do serviço requerido e autorizado por Vossa Excelência. Vimos por meio deste, solicitar que seja efetuado o pagamento no valor de R\$ 18.665,27 (dezoito mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e vinte e sete centavos) em favor **Construtora Novo Horizonte EIRELI**, cadastrado no **CNPJ: 18.286.438/0001-43**, conforme Nota Fiscal: **273**

Destarte, Informamos que o pagamento deverá ser debitado da conta do recurso advindo da ação ajuizada contra união, objeto de precatório, em virtude de insuficiência dos depósitos do FUNDEF atual FUNDEB referente a exercícios anteriores.

Certa de que ao assunto será dada a atenção merecida, contamos com vossa presteza, em tempo que renovo votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Joana Darque Bezerra Lima Rosendo
Secretaria Municipal de Educação de Lagoa da Canoa - AL

conforme o despacho do fiscal de obra do município, autorizo o pagamento da referida medição.

AUTORIZO PAGAMENTO
10/02/20
[Handwritten initials]

::Comprovantes



Folhas

52

60

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	PM DE LAGOA DA CANOA PREC FUNDEF
Conta Origem:	0056/006/00071011-8

Conta Destino:	0056/003/00005198-5
Nome do Destinatário:	CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIREL
Valor:	R\$18.198,64
Identificação da Operação:	PAGT PRESTADOR SERVICO

Data de Débito:	13/02/2020 -14:58:15
Data da Operação:	13/02/2020
Código da Operação:	74651116
Chave de Segurança:	97AX87EX0WXEF3TE

CPFs Autorizadores:
804.479.374-72
986.518.034-00

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
