



Ofício SMVO/SE/ n.º 41/2020.

Lagoa da Canoa – AL, 13 de abril de 2020.

Ilma. Senhora,

Joana Darque Bezerra Lima Rosendo

MD. Secretária Municipal de Educação

Nesta.

ASSUNTO: RELATÓRIO DE VISTORIA DE MEDIÇÃO

OBRA: Reforma e Ampliação da construção do centro multidisciplinar de atendimento especializado

EMPRESA CONTRATADA: M D M Construção e Locação Eirelli - EPP

Nº MEDIÇÃO: 03

Após vistoriar in loco, comparando os serviços apresentados no último boletim de medição e relatório fotográfico, atesto que os itens medidos no boletim 03 apresentado esta em conformidade com a execução física. Deste modo segue processo da oitava e última medição com nota fiscal atestada e devidas certidões.

ciente, encaminho ao gabinete da prefeita para autorização do pagamento da medição data: 13/04/20

Joana Darque B Lima Rosendo
Secretaria Municipal de Educação
Portaria 0016

Luiz André Portela da Silva Filho
Eng. Civil Luiz André Portela da Silva Filho
Crea: 0211857840
Fiscal de Obra / Gestor de Contrato

Conforme o despacho do fiscal de obra do município, autorizo o pagamento da referida medição.

AUTORIZO PAGAMENTO

DATA: 13, 04, 20

TAINÁ VEIGA
PREFEITA

Ofício MDM: N° 023/2020

Arapiraca-AL, 13 de abril de 2020.

À PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA / AL
TOMADA DE PREÇOS 008/2019
CONTRATO N°: 001 – TP 008/2019

OBRA: Reforma e Ampliação da Construção do Centro Multidisciplinar de Atendimento Especializado, na Cidade de Lagoa da Canoa/AL.

VALOR INICIAL DO CONTRATO: R\$ 310.726,60

VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO: R\$ 452.310,26

ASSUNTO: Encaminhamento do Boletim de Medição N° 03 e documentos, para pagamento

Senhora Prefeita,

A Empresa **M D M CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP**, vem por meio de sua representante legal, encaminhar a Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa, documentos referentes à solicitação de pagamento do **Boletim de Medição N° 03**, de acordo com o contrato firmado e serviço executado no valor abaixo discriminado:

- Valor Global da Medição a Ser Pago **R\$ 95.657,54** (noventa e cinco mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos).

Segue em anexo: Boletim de Medição, Nota Fiscal, Certidões e Demais Documentos.

Outrossim, informamos que a Empresa possui conta corrente na Caixa Econômica Federal, Agencia nº 4813, Conta nº 859-7, Operação: 003, Praça de Pagamento: Arapiraca / Alagoas.

Aproveitando a oportunidade agradece pelo atendimento, reiterando votos de estima e consideração.

Atenciosamente;




JULLIANY TAVARES MACHADO DOS SANTOS

RG N° 2005371, CPF N° 058.112.374-30

Empresária

A Ilma. Senhora
TAINÁ CORRÊA DE SÁ LUCIO DA SILVA
PREFEITA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA / AL
LAGOA DA CANOA - AL


Luiz André Pereira da S. Filho
Engenheiro Civil
CREA AL 02118578 40

Obr: Reforma e Ampliação da Construção do Centro Multidisciplinar de Atendimento Especializado, na Cidade de Lagoa da Canoa/AL.

Local: Lagoa da Canoa/AL

Contratante: Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa

Data do Contrato: 11/17/2019

N.º do Contrato: 001 - 1P-008/2019

Tomada de Preço Nº: 008/2019

Valor Inicial do Contrato: R\$ 310.728,60

Valor Atualizado do Contrato: R\$ 452.310,26

Valor dos Serviços Adicionais: R\$ 7.046,88

Valor Final do Aditivo do Contrato: R\$ 148.630,54

Valor da Medição: R\$ 141.593,66

Valor do Aditivo do Contrato: R\$ 96.677,54

Valor do Aditivo do Contrato: R\$ 96.677,54



trezentos e dez mil, setecentos e vinte e seis reais e sessenta centavos
quatrocentos e cinquenta e dois mil, trezentos e dez reais e seis centavos
sete mil e quarenta e oito reais e oitenta e oito centavos
cento e quarenta e oito mil, setecentos e trinta reais e cinquenta e quatro centavos
cento e quarenta e um mil, quinhentos e oitenta e três reais e sessenta e seis centavos
noventa e cinco mil, setecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos

Marcos Douglas Medeiros dos Santos
Engenheiro Civil
Engenharia de Produção
CREA Nº 020034779-9

Luiz André Fortes da S. Filho
Engenheiro Civil
CREA AL 02118578-40

Data do Relatório: 08/04/2020

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	PR. UNIT.(R\$)	Previsão Inicialmente	Suprimento	Aditivo	Consolidado	Medido no Período	Acumulado Inicialmente o Período	Acumulado Inicialmente o Período	Saldo dos Serviços Previsíveis	Previsão	Suprimento de Serviços	Serviços Adicionais	Aditivo Final	FINANCEIRO (R\$)		Medido no Período	%	Acumulado Inicialmente o Período	%	Saldo do Contrato (R\$)	%	
																Consolidado	Medido no Período							
10.6	Ponto de interruptor 01 cada (1) embudo com eletrodos de pvc	pt	R\$ 161,17	21,00			21,00	21,00	21,00	21,00	0,00	3.394,57	0,00	0,00	0,00	3.394,57	3.394,57	100,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
10.7	Isolante elétrico apropriado para isolamento até 500V x 2,40m	un	R\$ 55,68	3,00			3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	107,04	0,00	0,00	0,00	107,04	107,04	100,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
10.8	Ponto de tomada 30 parafusos com condutor até 500V, com eletrodos de ferro galvanizado aparente Ø 3/4", incluindo conjunto esquadria, inclusive aterramento	pt	R\$ 314,40	13,00			13,00	13,00	13,00	13,00	0,00	4.087,20	0,00	0,00	0,00	4.087,20	4.087,20	100,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
10.9	Ponto de tomada 20" ABNT, de embudo, 10 A, com eletrodos de pvc (feixe) embudo embudo Ø 3/4", no tipo 25mm" (6) 12), inclusive	pt	R\$ 173,40	45,00			45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	7.803,00	0,00	0,00	0,00	7.803,00	7.803,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
10.10	Luminária sanoflex tipo normal, com 1 lâmpada de 15 W -	un	R\$ 60,02	6,00			6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	363,72	0,00	0,00	0,00	363,72	363,72	100,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
10.11	Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 0 e 15,2 kv - Rev 01 (Código do ORSE: 11386)	un	R\$ 2.208,35	1,00			1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	2.208,35	0,00	0,00	0,00	2.208,35	2.208,35	100,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
Subtotal Item 10													R\$ 24.425,15	0,00	0,00	R\$ 7.047,58	R\$ 7.047,58	R\$ 31.472,73	R\$ 29.072,02	82,30%	R\$ 29.072,02	82,30%	R\$ 2.403,66	7,64%
11.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS																							
11.1	Ponto de água fria embudo, orientado pvc rígido condutor Ø 3/4"	un	R\$ 156,40	12,00			12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	1.876,80	0,00	0,00	0,00	1.876,80	1.876,80	100,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
11.2	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido condutor Ø 60 mm	un	R\$ 55,82	12,00			12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	669,84	0,00	0,00	0,00	669,84	669,84	100,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
11.3	Forquilha para esgoto com tubo de pvc rígido condutor Ø 50 mm (para de Forquilha para esgoto de 100 mm)	un	R\$ 78,28	2,00			2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	156,56	0,00	0,00	0,00	156,56	156,56	100,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
11.4	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido condutor Ø 100 mm (verso sanitário)	pt	R\$ 82,77	9,00			9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	744,93	0,00	0,00	0,00	744,93	744,93	100,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
11.5	RAIO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDADVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO - AF-122014	UN	R\$ 9,05	9,00			9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	81,45	0,00	0,00	0,00	81,45	81,45	100,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
11.6	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO - AF-122014	UN	R\$ 24,65	1,00			1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	24,65	0,00	0,00	0,00	24,65	24,65	100,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
11.7	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, FORNECIDA E INSTALADA - AF-122013	UN	R\$ 52,44	9,00			9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	471,96	0,00	0,00	0,00	471,96	471,96	100,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
11.8	AF-122013 TORNEIRA CROMADA EM PNC 1/4" X 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF-122013	UN	R\$ 18,79	1,00			1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	18,79	0,00	0,00	0,00	18,79	18,79	100,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
11.9	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 3/4" COM ACABAMENTO E CAPOTLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA AF-122014	UN	R\$ 96,82	1,00			1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	96,82	0,00	0,00	0,00	96,82	96,82	100,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
11.10	Visão sanitária c/ caixa de descarga acoplada, ELIZABETH ou similar, padrão popular, inclusive assento plástico Amarelo ou similar, conjunto de limpeza, anel de vedação e encaixe plástico	un	R\$ 315,28	9,00			9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	2.837,52	0,00	0,00	0,00	2.837,52	2.837,52	100,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
11.11	FANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF-122013	UN	R\$ 443,87	1,00			1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	443,87	0,00	0,00	0,00	443,87	443,87	100,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
11.12	Bancada em granito cinza andorinha, 60x20m	m2	R\$ 344,49	6,59			7,78	7,78	7,78	7,78	0,00	2.710,19	0,00	0,00	0,00	2.710,19	2.710,19	100,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
11.13	Caixa de aço inox 304, dimensões: 35 x 40cm, para instalação em bancada, c/ válvula cromada (deixa ref 1623), selo cromado (deixa ref 1620), torneira cromada (deixa linha cfo ref 1159) e encaixe de plástico ou similares	un	R\$ 516,92	2,00			2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	1.033,84	0,00	0,00	0,00	1.033,84	1.033,84	100,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
11.14	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	R\$ 128,64	1,00			1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	128,64	0,00	0,00	0,00	128,64	128,64	100,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
11.15	MICROTOR SIFONADO DE 100 X 50 MM COM CAPOTLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLER E CONJUNTO PARA FIMACAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	R\$ 572,03	2,00			2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	1.144,06	0,00	0,00	0,00	1.144,06	1.144,06	100,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
11.16	LAVATÓRIO DE CANTO LOUÇA BRANCA SUSPENSO -40 X 30" CM	UN	R\$ 138,83	2,00			2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	277,66	0,00	0,00	0,00	277,66	277,66	100,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
11.17	CAIXA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF-122013	UN	R\$ 281,49	7,00			7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	1.970,43	0,00	0,00	0,00	1.970,43	1.970,43	100,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
11.18	MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF-122013	UN	R\$ 40,82	1,00			1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	40,82	0,00	0,00	0,00	40,82	40,82	100,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
11.19	Fornas em alumínio de bloco cozido 5,00 x 2,90 x 1,40 m	un	R\$ 13.226,10	1,00			1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	13.226,10	0,00	0,00	0,00	13.226,10	13.226,10	100,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
11.20	Santônio paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 2,00 x 1,00 x 0,80 m	un	R\$ 1.546,32	1,00			1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1.546,32	0,00	0,00	0,00	1.546,32	1.546,32	100,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
11.21	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 3/4" COM ACABAMENTO E CAPOTLA CROMADA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA AF-122014	UN	R\$ 96,82	7,00			7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	677,74	0,00	0,00	0,00	677,74	677,74	100,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
11.22	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H- 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	R\$ 233,09	12,00			12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	2.797,08	0,00	0,00	0,00	2.797,08	2.797,08	100,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
11.23	Caixa de poldara 0,90 x 0,90 x 0,60m	un	R\$ 526,46	1,00			1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	526,46	0,00	0,00	0,00	526,46	526,46	100,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	

Obra: Reforma e Ampliação da Construção do Centro Multidisciplinar de Atendimento Especializado, na Cidade de Lagoa da Canoa/L.

Local: Lagoa da Canoa/L.

Data do Relatório: 09/04/2020

Contratante: Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa
 Data do Contrato: 11/11/2019
 N.º do Contrato: 001 - TP/008/2019
 Tomada de Preço Nº: 008/2019
 Valor Inicial do Contrato: R\$ 310.726,60
 Valor Atualizado do Contrato: R\$ 452.310,26
 Valor da Suprta dos Serviços: R\$ 7.046,88
 Valor dos Serviços Adicionais: R\$ 148.630,54
 Valor Final do Aditivo de Contrato: R\$ 141.953,66
 Valor da Medição: R\$ 95.657,54

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	PR. UNIT. (R\$)	QUANTIDADE				FINANCEIRO (R\$)				%		%		
				Previsão Inicialmente	Suprta	Aditivo Consolidado	Medido no Período	Acumulado Incluindo o Período	Saldo dos Serviços Previsão	Previsão	Suprta de Serviços	Serviços Adicionais	Aditivo Final	Consolidado	Medido no Período	Acumulado Incluindo o Período
11.24	Caixa reforçada em PVC, 100x150x50mm, acabamento branco, c/grades e fechadura	un	R\$ 97,87	7,00		7,00	7,00	0,00	265,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.25	Folha Escanada, DECA, linha dura 1994, C 61 ou similar	un	R\$ 524,62	9,00		9,00	9,00	0,00	4.721,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.721,58
12.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES																
12.1	Limpeza geral	m2	R\$ 2,06	497,13		497,13	0,00	497,13	1.024,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,09
12.2	Burra de apoio, red., fixa, em aço inox, 1x80cm, d=1 1/2", Jackwell ou similar	un	R\$ 195,17	8,00		8,00	0,00	8,00	1.561,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.561,36
12.3	Cama de água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte, cap. 500 litros	un	R\$ 396,51	2,00		2,00	2,00	0,00	797,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,02
TOTAL GERAL																
				R\$ 310.726,60	R\$ 7.046,88	R\$ 148.630,54	R\$ 141.953,66	R\$ 452.310,26	R\$ 95.657,54	211,15%	R\$ 329.096,44	72,75%	R\$ 129.253,62	27,25%		

Valor Total dos Serviços: R\$ 452.310,26
 Valor da 3ª Medição: R\$ 95.657,54

Arquiteta, 09 de abril de 2020

MARCOS DOUGLAS MEDEIROS DOS SANTOS
 Engenheiro Civil e de Produção, CREA RNP nº 020034779-9
 Responsável Técnico

Luiz André Fortes da S. Filho
 Engenheiro Civil
 CREA AL 02.18578-40


DIÁRIO DE OBRA

Obra: Reforma e Ampliação da Construção do Centro Multidisciplinar de Atendimento Especializado, na Cidade de Lagoa da Canoa/AL	Valor do Contrato Atualizado:
Local: Lagoa da Canoa/AL	R\$ 451.200,29
Contratante: Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa	Período da Obra:
Data do Contrato: 11/11/2019	11/03/2020 a 09/04/2020
N.º do Contrato: 001 - TP 008/2019	
Tomado de Preço Nº: 008/2019	

OCORRÊNCIAS REGISTRADAS

09/03/2020 A 13/03/2020

QUARTA	EXECUÇÃO DE PISO GRANILITE						
	Condições Climáticas						
	X	Bom		Bom não trabalhável		Chuvoso Trabalhável	Chuvoso não trabalhável
QUINTA	EXECUÇÃO DE PISO GRANILITE						
	Condições Climáticas						
		Bom		Bom não trabalhável	X	Chuvoso Trabalhável	Chuvoso não trabalhável
SEXTA	EXECUÇÃO DE PISO GRANILITE						
	Condições Climáticas						
		Bom		Bom não trabalhável	X	Chuvoso Trabalhável	Chuvoso não trabalhável
16/03/2020 A 20/03/2020							
SEGUNDA	EXECUÇÃO DE PISO GRANILITE E EXECUÇÃO DE FÓSSA SÉPTICA						
	Condições Climáticas						
	X	Bom		Bom não trabalhável		Chuvoso Trabalhável	Chuvoso não trabalhável
TERÇA	EXECUÇÃO DE PISO GRANILITE E EXECUÇÃO DE FÓSSA SÉPTICA						
	Condições Climáticas						
	X	Bom		Bom não trabalhável		Chuvoso Trabalhável	Chuvoso não trabalhável
QUARTA	EXECUÇÃO DE PISO GRANILITE E EXECUÇÃO DE FÓSSA SÉPTICA						
	Condições Climáticas						
	X	Bom		Bom não trabalhável		Chuvoso Trabalhável	Chuvoso não trabalhável
QUINTA	EXECUÇÃO DE PISO GRANILITE, INSTALAÇÕES ELETRICAS, HIDRÁULICAS E EXECUÇÃO DE FÓSSA SÉPTICA						
	Condições Climáticas						
		Bom		Bom não trabalhável	X	Chuvoso Trabalhável	Chuvoso não trabalhável
SEXTA	INSTALAÇÕES ELETRICAS, HIDRÁULICAS, INSTALAÇÃO DE FORRA DAS PORTAS E EXECUÇÃO DE FÓSSA SÉPTICA						
	Condições Climáticas						
		Bom		Bom não trabalhável	X	Chuvoso Trabalhável	Chuvoso não trabalhável


 Luiz André Portela da S. Filho
 Engenheiro Civil
 CREA AL 02118578 40


 Marcos Douglas Medeiros dos Santos
 Engenheiro Civil
 Engenheiro de Produção
 CREA Nº 020034779-9

DIÁRIO DE OBRA

Obra: Reforma e Ampliação da Construção do Centro Multidisciplinar de Atendimento Especializado, na Cidade de Lagoa da Canoa/AL	Valor do Contrato Atualizado:
Local: Lagoa da Canoa/AL	R\$ 451.200,29
Contratante: Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa	
Data do Contrato: 11/11/2019	Período da Obra:
N.º do Contrato: 001 - TP 008/2019	11/03/2020 a 09/04/2020
Tomado de Preço Nº: 008/2019	

OCORRÊNCIAS REGISTRADAS

23/03/2020 A 27/03/2020

SEGUNDA	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE, EXECUÇÃO DE FÓSSA SÉPTICA E SUMIDOURO						
	Condições Climáticas						
	X	Bom		Bom não trabalhável		Chuvoso Trabalhável	Chuvoso não trabalhável
TERÇA	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE, EXECUÇÃO DE FÓSSA SÉPTICA E SUMIDOURO						
	Condições Climáticas						
	X	Bom		Bom não trabalhável		Chuvoso Trabalhável	Chuvoso não trabalhável
	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDE E EXECUÇÃO DE SUMIDOURO						
	Condições Climáticas						
	X	Bom		Bom não trabalhável		Chuvoso Trabalhável	Chuvoso não trabalhável
QUINTA	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDE E EXECUÇÃO DE SUMIDOURO						
	Condições Climáticas						
		Bom		Bom não trabalhável	X	Chuvoso Trabalhável	Chuvoso não trabalhável
SEXTA	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDE E EXECUÇÃO DE SUMIDOURO						
	Condições Climáticas						
	X	Bom		Bom não trabalhável		Chuvoso Trabalhável	Chuvoso não trabalhável
30/03/2020 A 03/04/2020							
SEGUNDA	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PISO E EXECUÇÃO DE SUMIDOURO						
	Condições Climáticas						
	X	Bom		Bom não trabalhável		Chuvoso Trabalhável	Chuvoso não trabalhável
TERÇA	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PISO						
	Condições Climáticas						
	X	Bom		Bom não trabalhável		Chuvoso Trabalhável	Chuvoso não trabalhável
QUARTA	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PISO						
	Condições Climáticas						
	X	Bom		Bom não trabalhável		Chuvoso Trabalhável	Chuvoso não trabalhável
QUINTA	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PISO						
	Condições Climáticas						
		Bom		Bom não trabalhável	X	Chuvoso Trabalhável	Chuvoso não trabalhável
SEXTA	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PISO E EXECUÇÃO DE EMASSAMENTO EM PAREDE						
	Condições Climáticas						
	X	Bom		Bom não trabalhável		Chuvoso Trabalhável	Chuvoso não trabalhável

 Marcos Douglas Medeiros dos Santos
 Engenheiro Civil
 Engenheiro de Produção
 CREA Nº 020034779-9

 Luiz André Portela da S. Filho
 Engenheiro Civil
 CREA AL 02118578 44

DIÁRIO DE OBRA

Obra: Reforma e Ampliação da Construção do Centro Multidisciplinar de Atendimento Especializado, na Cidade de Lagoa da Canoa/AL	Valor do Contrato Atualizado:
Local: Lagoa da Canoa/AL	R\$ 451.200,29
Contratante: Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa	Período da Obra:
Data do Contrato: 11/11/2019	11/03/2020 a 09/04/2020
N.º do Contrato: 001 - TP 008/2019	
Tomado de Preço Nº: 008/2019	


OCORRÊNCIAS REGISTRADAS

06/04/2020 A 09/04/2020


SEGUNDA	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PISO E EXECUÇÃO DE EMASSAMENTO EM PAREDE						
	Condições Climáticas						
	X	Bom		Bom não trabalhável		Chuvoso Trabalhável	Chuvoso não trabalhável
TERÇA	EXECUÇÃO DE EMASSAMENTO EM PAREDE						
	Condições Climáticas						
	X	Bom		Bom não trabalhável		Chuvoso Trabalhável	Chuvoso não trabalhável
QUARTA	EXECUÇÃO DE EMASSAMENTO EM PAREDE						
	Condições Climáticas						
	X	Bom		Bom não trabalhável		Chuvoso Trabalhável	Chuvoso não trabalhável
QUINTA	EXECUÇÃO DE EMASSAMENTO EM PAREDE						
	Condições Climáticas						
		Bom		Bom não trabalhável	X	Chuvoso Trabalhável	Chuvoso não trabalhável

OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

Contratada:


 Marcos Douglas Medeiros dos Santos
 Engenheiro Civil
 Engenheiro de Produção
 CREA Nº 020034779-9

Contratante:


 Luiz André Portela da S. Filho
 Engenheiro Civil
 CREA AL 07118578-40

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

3ª MEDIÇÃO


REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO
CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE ATENDIMENTO
ESPECIALIZADO, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE
LAGOA DA CANOA/AL



Luiz Antônio Fortes da S. Filho
Engenheiro Civil
CREA AL 02118578-48





Luiz André Portela da S. Filho
Engenheiro Civil
CREA AL 02118578 40



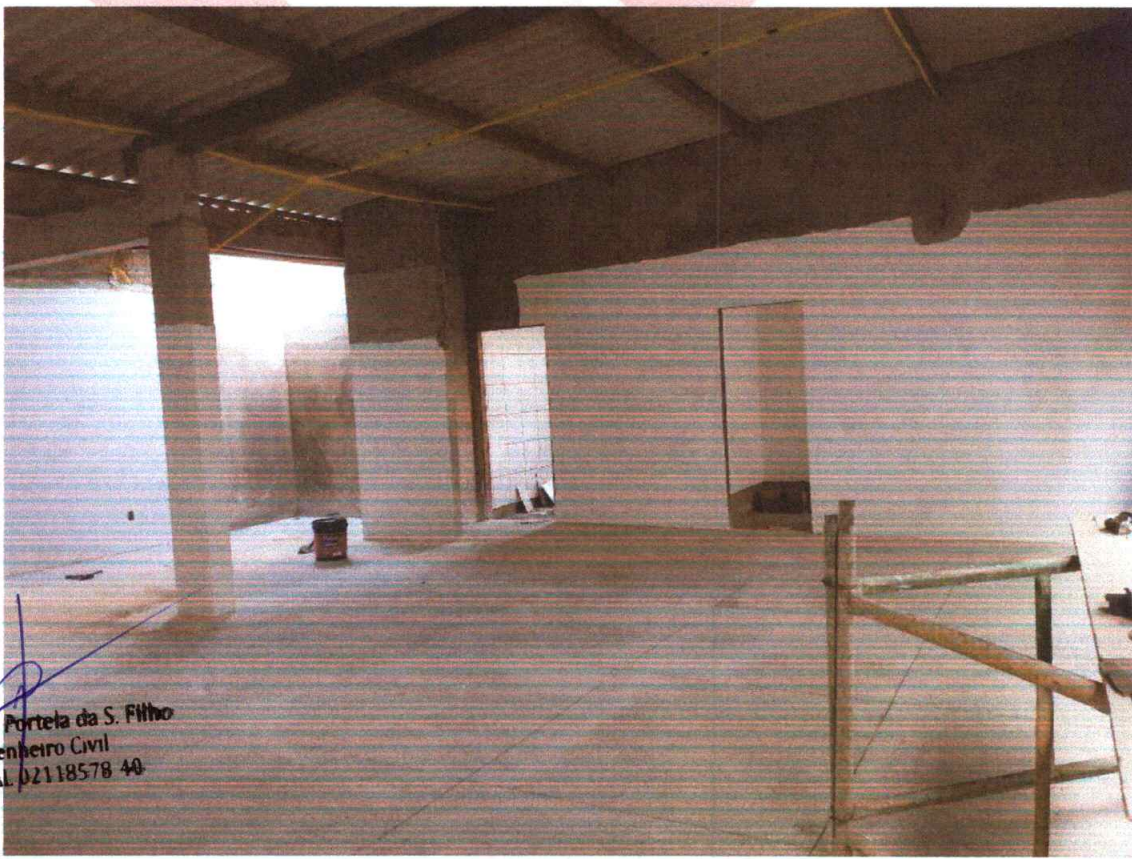

Luiz André Portela da S. Filho
Engenheiro Civil
CREA AL 02118578-40





Luiz André Portela da S. Filho
Engenheiro Civil
CREA AL 02118578-40




Luiz André Portela da S. Filho
Engenheiro Civil
CREA AL 02118578 40




Luiz André Portela da S. Filho
Engenheiro Civil
CREA AL 02118578 40


Folhas




[Handwritten Signature]
Armando da S. Filho
Engenheiro Civil
118578 40



Folhas

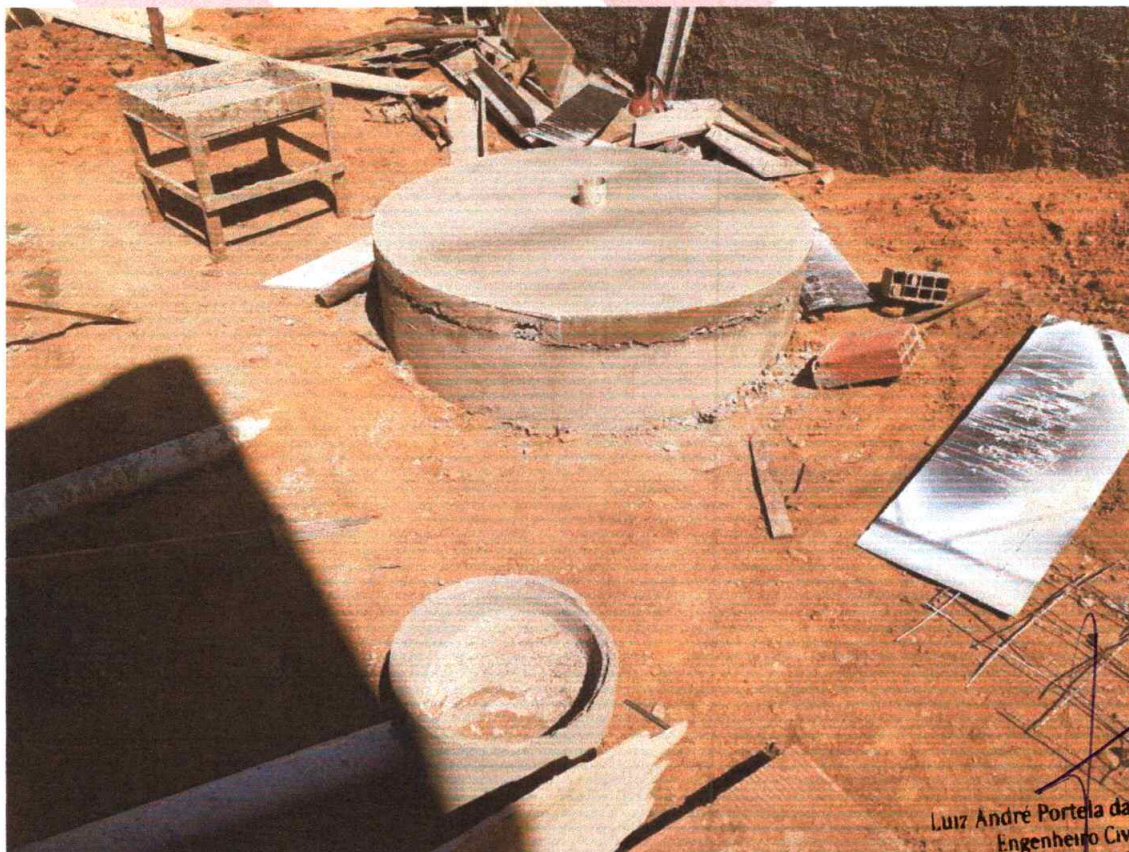


Luiz André Portela da S. Filho
Engenheiro Civil
CREA AL 02118578 40



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

Praça Vereador Benício Alves de Oliveira, 15 - CENTRO
 Lagoa da Canoa - AL
 C.N.P.J.: 31.651.645/0001-18

Nota de Empenho
ABRIL/2020

Nota de Empenho 0416002

FORNECEDOR

Nome: M D M CONSTRUCAO E LOCACAO EIRELI CNPJ/CPF: 26399954000102
 Endereço: PRACA VEREADOR JOSE FERREIRA BARBOSA, 22 Compl:
 Bairro: BRASILIA Cidade: Arapiraca UF: AL
 E-mail: Telefone: (82)9642-9930
 PIS/PASEP: RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta: Folhas

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0881 FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
 Função: 12 Educação
 SubFunção: 361 Ensino Fundamental
 Programa: 0002 EDUCAÇÃO IDEAL BUSCANDO DIVERSIDADE E INCLUSÃO
 Ação: 2023 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%
 Natureza Despesa: 449051000000 Obras e Instalações
 SubElemento: 449051910000 Obras Em Andamento
 F: 025100000 FUNDEF/PRECATÓRIOS
 Centro Custo:

Licitação: Nº 008/2019 - Tomada Preços, Art.22 Inciso II Lei 8.666/93

Processo: Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Ordinário	95.657,54	95.657,54	0,00

HISTÓRICO

SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO MULTISCIPLINAR DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO, NA CIDADE DE LAGOA DA CANOA - AL. (3ª MEDIÇÃO).

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	1 - Outras Despesas Gerais	UND	1,0000	95.657,5400	95.657,5400

NOVENTA E CINCO MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS


95.657,54

Data: 16/04/2020

Autorizo o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio


 JOANA DARQUE BEZERRA LIMA ROSENDO
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO Mat.500


 PUSKIN VEIGA LAVINIAS CORREA DE SA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.3683



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA
Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento

Folhas **ABRIL/2020**

Nota de Liquidação: **0416002** Fonte: **025100000 - FUNDEF/PRECATÓRIOS**

FORNECEDOR			
Nome:	M D M CONSTRUCAO E LOCACAO EIRELI	CNPJ/CPF:	26399954000102
Endereço:	PRACA VEREADOR JOSE FERREIRA BARBOSA	Compl:	
Bairro:	BRASILIA	Cidade:	Arapiraca UF: AL
E-mail:		Telefone:	(82)9642-9930 RG:
DADOS BANCÁRIOS			
Banco:	Agência:	Operação:	Conta:

CLASSIFICAÇÃO	
Unidade Orçamentária:	0881 FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
Função:	12 Educação
SubFunção:	361 Ensino Fundamental
Programa:	0002 EDUCAÇÃO IDEAL BUSCANDO DIVERSIDADE E INCLUSÃO
Ação:	2023 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%
Natureza Despesa:	449051000000 Obras e Instalações
SubElemento:	449051910000 Obras Em Andamento
Fonte:	025100000 FUNDEF/PRECATÓRIOS
Custo:	

EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0416002	16/04/2020	95.657,54	95.657,54	0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO
 SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO MULTISCIPLINAR DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO, NA CIDADE DE LAGOA DA CANOA - AL. (3ª MEDIÇÃO).

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO
 SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO MULTISCIPLINAR DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO, NA CIDADE DE LAGOA DA CANOA - AL. (3ª MEDIÇÃO).

Documento	Valor
Nota Fiscal (110 / Série: 0 / UF: AL / Emissão: 16/04/2020)	95.657,54

SUBEVENTO
 15 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Conta Débito	Conta Crédito	Valor
12 601000000000 - Obras Em Andamento	21311010000000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	95.657,54
Retenção		Valor
21881010900000001-ISS - EDUCAÇÃO		1.434,83

NOVENTA E CINCO MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS

Total Retido:	1.434,83
Total Líquido:	94.222,71

Data: 16/04/2020

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento de acordo com o Artigo 64 da Lei 4.320/64.

JOANA DARQUE BEZERRA LIMA ROSENDO
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO Mat.500

PUSKIN VEIGA LAVINAS CORREA DE SA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.3683



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA
Secretaria Municipal da Fazenda



Folhas

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://www.e-nfs.com.br/arapiraca , informando o código de verificação.	Código de verificação CC44.58A0.28A0	Data/Hora da emissão 16/04/2020 - 09:40:14
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 110

Prestador de Serviços

	M D M CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP VEREADOR JOSE FERREIRA BARBOSA, 22, BRASILIA, Telefone: . CEP 57313260 - ARAPIRACA - AL - BRASIL CPF/CNPJ 26.399.954/0001-02 Email mdm.contrucao@hotmail.com	Inscrição Municipal 151422	Inscrição Estadual
--	--	--------------------------------------	--------------------

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA		
CPF/CNPJ	12.207.551/0001-00		
Endereço	PRAÇA VEREADOR BENÍCIO ALVES DE OLIVEIRA, S/N,		
Bairro	CENTRO, Telefone: .		
Cep	57330-000		
Cidade	LAGOA DA CANOA - AL - BRASIL	Inscrição Municipal	
Email	eng.canoa@hotmail.com	Inscrição Estadual	

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

Execução dos Serviços de Reforma e Ampliação da Construção do Centro Multidisciplinar de Atendimento Especializado, na Cidade de Lagoa da Canoa/AL. Material Mão de Obra Tomada de Preço 08/2019 Contrato Nº: 001-TP 008/2019 3ª Medição	<p>ATESTO QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS:</p> <p>NOME <i>Luiz André Portela da S. Filho</i></p> <p>CPF <i>079877474-45</i></p> <p>CARGO <i>Eng. Civil</i></p> <p>DATA <i>16/04/2020</i></p>
---	--

Serviço: 7.02-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO E POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS)

Valor do Serviço (R\$)	Qtd	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
95.657,54	1,00	0,00	66.961,00	28.696,54	5,00	1.434,83	95.657,54

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 95.657,54

Retenções

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN(R\$)	Outras Retenções(R\$)		Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)
1.434,83	0,00		1.434,83	94.222,71

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço- Tomador de serviço sem cadastro no NFSE, responsável pelo recolhimento do ISSQN acesse o Portal da Fazenda para emitir a guia.- ISSQN devido pelo Tomador em LAGOA DA CANOA - AL- NFSE é emitida com respaldo da Lei Municipal nº 2.342/2013, alterada por Lei Municipal nº 2.995/2014 e Decreto Municipal 2.217/2010. - Data do vencimento do ISS desta NFSE: 05/05/20- Retenções ISSQN (Retido): 1434,83.

Luiz André Portela da S. Filho
Engenheiro Civil
CREA AL 02118578-40





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Folhas

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: **M D M CONSTRUCAO E LOCACAO EIRELI**
CNPJ: **26.399.954/0001-02**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:32:31 do dia 27/01/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/07/2020.

Código de controle da certidão: **0704.0F2F.1C39.9C92**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS COM
EFEITOS DE NEGATIVA**

Certidão fornecida para o CNPJ: 26.399.954/0001-02

Nome/Contribuinte M D M CONSTRUCAO E LOCACAO EIRELI - EPP

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos existir, na presente data, pendências cadastradas em nome do contribuinte acima identificado, as quais estão com a exigibilidade suspensa nos termos dos incisos II, III e/ou IV, do art. 151, do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966).

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos do contribuinte e refere-se a débitos de natureza tributária e descumprimento de obrigações acessórias.

Certidão emitida gratuitamente com base na Instrução Normativa SEF nº. 27 de 15 de maio de 2017.

Certidão emitida nos termos do art. 79 da Lei nº 6.771/06 e do art. 258 do Decreto nº 25.370/13.

Válida até 16/05/2020

Emitida às 10:44:45 do dia 17/03/2020

Código de controle da certidão: 6778-F788-BC62-4D39



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA

FAZENDA MUNICIPAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS N.º 4220 / 2020

Folhas

Identificação do Contribuinte

Contribuinte: M D M CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP

CNPJ/CPF: 26.399.954/0001-02

Tipo do Contribuinte

Contribuinte Econômico **Situação Cadastral:** Ativo

Inscrição Municipal: 151422

Identificação: 13731

Endereço: PRAÇA - VEREADOR JOSE FERREIRA BARBOSA, N.º: 22,
57513260,

Bairro: BRASILIA

Cidade:

Complemento do Loteamento:

Certificamos, com fundamento nas informações constantes em nosso Sistema de Cadastro e Controle de Arrecadação, e ressalvado o direito da Fazenda Municipal de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, conforme art. 332 do CTM, com referência ao presente instrumento, que em relação ao contribuinte/imóvel acima identificado **INEXISTE DÉBITO** impeditivo a expedição desta certidão.

De Autenticidade: 88C.BD7.808.BB9

A autenticidade desta certidão DEVE ser confirmada na pagina da Secretaria de fazenda, no endereço:

<http://arapiraca.abaco.com.br/eagata/portal/>

Certidão emitida as 12:17:21 hs, do dia 03/03/2020 **Validade:02/05/2020**

Observação:

Voltar

Imprimir

Folhas



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.399.954/0001-02

Razão Social: M D M CONSTRUCAOE LOCACAO EIRELI EPP

Endereço: PC VEREADOR JOSE FERREIRA BARBOSA 22 / BRASILIA / ARAPIRACA / AL
/ 57313-260

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 06/03/2020 a 03/07/2020

Certificação Número: 2020030604274934308630

Informação obtida em 31/03/2020 19:28:38

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M D M CONSTRUCAO E LOCACAO EIRELI

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 26.399.954/0001-02

Certidão nº: 7190276/2020

Expedição: 25/03/2020, às 08:53:17

Validade: 20/09/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M D M CONSTRUCAO E LOCACAO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.399.954/0001-02**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

CERTIDÃO ESTADUAL

FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL E CONCORDATA

CERTIDÃO Nº: 002740163

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Certifico que, pesquisando os registros de distribuição de feitos do Estado de Alagoas, no período de 10 anos, verifiquei NÃO CONSTAR distribuições em nome de:

M D M CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI, residente na PÇ VEREADOR JOSE FERREIRA BARBOSA, Nº 22, Brasília, CEP: 57313-260, Arapiraca - AL, vinculado ao CNPJ: 26.399.954/0001-02 *****

Certifico ainda que a pesquisa acima refere-se a AÇÕES DE FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL E CONCORDATA em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado de Alagoas, com as ressalvas abaixo:

Observações:

- 1 - A presente certidão foi emitida de acordo com a Resolução nº. 121/2010 do CNJ;
- 2 - A presente certidão não abrange eventuais ações de FALÊNCIA em que a pessoa a respeito da qual é expedida figure no pólo ativo;
- 3 - Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ;
- 4 - Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, que deverão ser objeto de certidões específicas;
- 5 - A exatidão dos dados pessoais fornecidos para pesquisa é de inteira responsabilidade da parte interessada.
- 6 - A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas (www.tjal.jus.br).

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias.

Maceió, quarta-feira, 25 de março de 2020 às 17h11min.

PEDIDO Nº: 002740163



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

56600005

0056/006/00071011-8

PM DE LAGOA DA CANOA PREC FUNDEF

de: 01/04/2020 até: 30/04/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2020	-	SALDO ANTERIOR		6.008,18C
01/04/2020	507188	RESGATE	800.000,00C	806.008,18C
01/04/2020	187132	DEVOL TED	159.000,00C	965.008,18C
01/04/2020	010807	ENVIO TEV	60.848,51D	904.159,67C
01/04/2020	104318	ENVIO TED	159.000,00D	745.159,67C
01/04/2020	187132	ENVIO TED	159.000,00D	586.159,67C
01/04/2020	104318	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	586.150,17C
01/04/2020	187132	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	586.140,67C
01/04/2020	990001	APL AUTOM	580.132,49D	6.008,18C
01/04/2020	-	SALDO DO DIA		6.008,18C
02/04/2020	-	SALDO DO DIA		6.008,18C
03/04/2020	-	SALDO DO DIA		6.008,18C
06/04/2020	-	SALDO DO DIA		6.008,18C
07/04/2020	142802	ENVIO TED	101.334,72D	95.326,54D
07/04/2020	142802	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	95.336,04D
07/04/2020	727220	RESG AUTOM	101.344,22C	6.008,18C
07/04/2020	-	SALDO DO DIA		6.008,18C
08/04/2020	-	SALDO DO DIA		6.008,18C
09/04/2020	091202	ENVIO TEV	65.534,22D	59.526,04D
09/04/2020	091210	ENVIO TEV	42.447,73D	101.973,77D
09/04/2020	727220	RESG AUTOM	107.981,95C	6.008,18C
09/04/2020	-	SALDO DO DIA		6.008,18C
13/04/2020	123079	ENVIO TED	2.111,14D	3.897,04C
13/04/2020	123079	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.887,54C
13/04/2020	727220	RESG AUTOM	2.120,64C	6.008,18C
13/04/2020	-	SALDO DO DIA		6.008,18C
14/04/2020	-	SALDO DO DIA		6.008,18C
15/04/2020	-	SALDO DO DIA		6.008,18C
16/04/2020	-	SALDO DO DIA		6.008,18C
17/04/2020	-	SALDO DO DIA		6.008,18C
20/04/2020	-	SALDO DO DIA		6.008,18C
22/04/2020	152952	ENVIO TED	57.898,95D	51.890,77D
22/04/2020	152952	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	51.900,77D
22/04/2020	727220	RESG AUTOM	57.908,95C	6.008,18C
22/04/2020	-	SALDO DO DIA		6.008,18C
23/04/2020	-	SALDO DO DIA		6.008,18C
24/04/2020	-	SALDO DO DIA		6.008,18C
27/04/2020	270819	ENVIO TEV	44.296,44D	38.288,26D
27/04/2020	270901	ENVIO TEV	94.222,71D	132.510,97D
27/04/2020	000000	MANUT CTA	42,00D	132.552,97D
27/04/2020	727220	RESG AUTOM	138.561,15C	6.008,18C
27/04/2020	-	SALDO DO DIA		6.008,18C
28/04/2020	-	SALDO DO DIA		6.008,18C
29/04/2020	108157	ENVIO TED	1.055,57D	4.952,61C
